



**NİĞDE ÖMER
HALİSDEMİR
ÜNİVERSİTESİ**



2020 YILI



**YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

NİĞDE, Mart 2021

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME	KALAN ÖDENEK
HAZİNE	14.010.000	14.010.000	10.174.237	3.835.763
ÖZGELİR	0	0	0	0
NET FİNANSMAN	0	7.700.000	7.500.000	200.000
ŞARTLI BAĞIŞ	0	328,633	200.000	128.633
GENEL TOPLAM	14.010.000	22.038.633	17.874.237	4.164.396

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2020 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- ✘ Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- ✘ Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 45 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Kampüs Alt Yapı Tesislerinin 5.kısım inşaatının %50 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesinin yapılması,
- ✘ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımların alınması,
- ✘ Kütüphane Daire Başkanlığınca basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması,

Gerçekleşen;


- ✘ Merkezi Araştırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıştır.
- ✘ Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 45 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek hizmete açılmıştır.
- ✘ Kampüs Altyapı Tesisleri 5. Kısım inşaatında yüklenicinin fesih talebi üzerine idaremizce iş feshedilmiştir.
- ✘ Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerin tadilat ve onarım işleri tamamlanmıştır.
- ✘ Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır.
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımlar alınmıştır.
- ✘ Basılı ve elektronik yayınlar satın alınmıştır. Elektronik yayın veri tabanlarına abone olarak Üniversitemizin bilgiye erişim kapasitesi arttırılmıştır.

1.4 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2020 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 14.010.000.TL iken, 5018 sayılı kanununun 40. maddesi uyarınca sağlık merkezi yapılmak üzere 2019 yılında ödenek kaydedilen 449.597.TL şartlı bağıştan kalan 128.632.TL ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 200.000.TL şartlı bağış, 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 7.700.000.TL likit karşılığı ödenek eklenmesiyle yılsonu sermaye ödeneği toplamı 22.038.632.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 17.874.236. TL'si harcanmıştır.

EKONOMİ K KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.760.000,00	8.960.000,00	8.840.922,39	98,67
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	250.000,00	450.000,00	82.407,50	18,31
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.550.000,00	5.678.632,59	2.567.328,58	45,21
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.450.000,00	6.950.000,00	6.383.578,09	91,85
	GENEL TOPLAM	14.010.000,00	22.038.632,59	17.874.236,56	81,10

HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) *

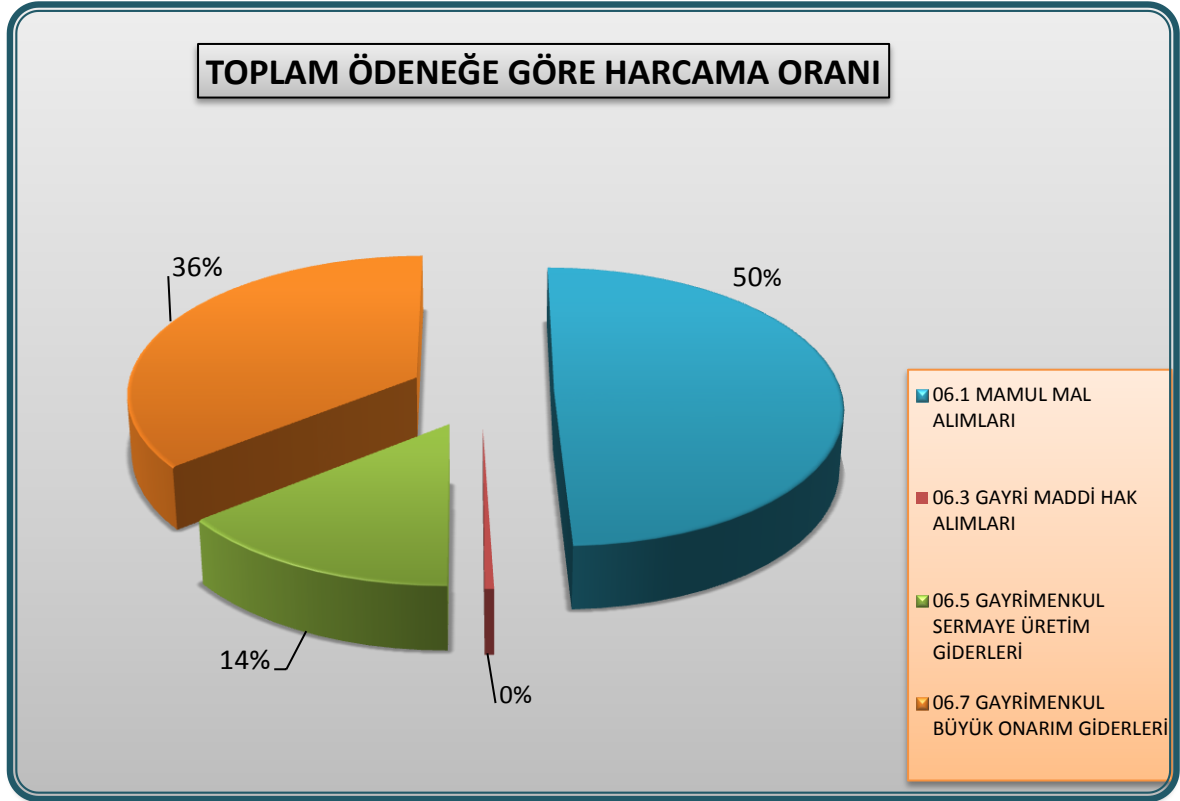

2- 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2020H03-152046-152047 Proje Adı: Muhtelif İşler

2020 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 7.200.000.TL'dir. 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/5 maddesi uyarınca 7.700.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 5018 sayılı kanununun 40. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 200.000.TL şartlı bağış eklenmesiyle yılsonu ödeneği 15.100.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 14.047.111.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Makine-Teçhizat Alımları

2020 yılında makine-teçhizat alımları için 2.500.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 5.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 5018 sayılı kanununun 40. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 200.000.TL şartlı bağış eklenmesiyle yılsonu ödeneği 7.700.000. TL olmuştur. Ödeneğin 7.581.126,09 TL'si harcanmış, 118.873,91.TL ödenek harcanmamıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI (KDV Dahil)
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Bilişim Altyapısı ve Uzaktan Eğitim İçin Donanım Alımı	11 adet	2.150.078,00
	Uzaktan Eğitim Ekipman Alımı	100 adet	105.964,00
	Grafik Tablet Alımı	200 adet	128.384,00
	Dizüstü Bilgisayar Alımı	20 adet	232.658,95
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	61.603,23
	Tarayıcı ve Yazıcı Alımı	13 adet	34.587,77
	Yazıcı Alımı	15 adet	30.571,09
	E-Sertifika ve Mini Kart Okuyucu	159 adet	25.293,30
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	183.115,09
	Dizüstü Bilgisayar Alımı	1 adet	5.475,20
	Grafik Tablet Alımı	70 adet	50.799,00
	Kartlı Geçiş Sistemi ve Ekipmanları	Muhtelif	22.962,80
	Büro Mefruşatı ve Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	33.204,60
	Makine Teçhizat Alımı	3 adet	2.750,00
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	6.490,00
	Makine Teçhizat Alımı	5 adet	5.221,50
	Switch Alımı	6 adet	24.072,00
	Dizüstü Bilgisayar Alımı	1 adet	37.760,00
	Web Kamera ve Ekipmanları	13 adet	37.760,00
	Kart Okuyucu Alımı	3 adet	3.009,00
	Kablosuz Yaka Mikrofonu	20 adet	8.260,00
	Web Kamera ve Ekipmanları	90 adet	37.170,00
	Dış Hatlı Sayısal Telefon Santrali	1 adet	28.910,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	4.752,00
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	8.039,53
	Büro İşyeri Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	10.673,10
	Dizüstü Bilgisayar Alımı	3 adet	32.360,32
	Sinema IMB Kartı Alımı	1 adet	35.400,00
	Çim Havalandırma Makinesi Alımı	1 adet	26.255,00
Tıp Fakültesi			
	Perde Alımı	Muhtelif	79.335,06
	Büro Mefruşatı Alımı	25 adet	18.873,27
	Amfi Sıra	530 adet	438.266,26
	Büro Mefruşatı Alımı	132 adet	47.041,95

	Büro Mefruşatı Alımı	100 adet	34.020,00
	Büro Mefruşatı Alımı	32 adet	10.886,40
	Okul Mefruşatı Alımı	Muhtelif	16.000,19
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	9.194,34
	Diseksiyon Masası	3 adet	44.840,00
	Kadavra Saklama Havuzu	1 adet	37.996,00
	Laboratuvar Tezgahı Alımı	46 adet	333.012,60
Diş Hekimliği Fakültesi			
	Merkezi Kuru Hava ve Dezenfeksiyonlu Vakum Sistemi	1 adet	813.020,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	5.478,24
	Fantom Öğrenci Ünit Simülasyon Sistemi	1 adet	35.105,00
	Diş Ünitesi	10 adet	1.322.375,52
	Panoramik Röntgen Cihazı	2 adet	453.086,26
Mühendislik Fakültesi			
	Laboratuvar Tezgahı Alımı	2 adet	15.068,60
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi			
	Dolum Makinesi Alımı	1 adet	37.760,00
	Kurutma Fırını Alımı	1 adet	23.600,00
Fen Edebiyat Fakültesi			
	İş İstasyonu ve Monitör Alımı	1 adet	20.225,20
Eğitim Fakültesi			
	Lazer Yazıcı	1 adet	1.722,03
İletişim Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	6.108,26
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	8.641,94
	Büro Mefruşatı Alımı	3 adet	2.235,60
	Projeksiyon Perdesi Alımı	1 adet	4.991,40
	Taşınabilir Harddisk	1 adet	2.065,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			
	Yazı Tahtası Alımı	1 adet	5.369,00
Bor Meslek Yüksekokulu			
	Makine Teçhizat Alımı	12 adet	11.033,00
Spor Bilimleri Fakültesi			
	Spor Malzemesi Alımı	2 adet	58.292,00
	Lazer Yazıcı	2 adet	3.444,06
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu			
	Lazer Yazıcı	1 adet	10.286,28
Güzel Sanatlar Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	8.654,25
	Prova Mankeni Alımı	10 adet	10.030,00

Sağlık Bilimleri Fakültesi			
	Lazer Yazıcı	2 adet	3.444,06
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	3.716,06
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	8.641,94
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Lazer Yazıcı	2 adet	3.444,06
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	17.283,89
Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	17.283,89
	Laboratuvar Malzemesi ve Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	17.995,00
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Kompost Makinesi*	1 adet	207.680,00
GENEL TOPLAM			7.581.126,09

Yazılım Alımları

2020 yılında yazılım alımları için 250.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 200.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 450.000.TL olmuştur. Ödeneğin 82.407,50.TL'si harcanmış, 367.592,50.TL ödenek harcanmamıştır.

ALIMI YAPAN BİRİM	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV Dahil)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	iSpring Suite Edu License Life Time	5.900,00
	Ekran Görüntüsü Kaydedici+ Editör	3.510,50
	Çevrimiçi Toplantı Lisans Alımı	14.396,00
	Güvenli Sınav Modülü + Senkron Eğitim Kurulumu Entegrasyonu	26.000,00
	Envlision Doküman Süreç Yönetim Sistemi Ek Süreç	10.500,00
	Envlision Doküman Süreç Yönetim Sistemi E-Devlet Entegrasyonu	8.000,00
	Logsing Focus Lisans Alımı (1 Yıllık)	14.101,00
GENEL TOPLAM		82.407,50

Büyük Onarım

2020 yılında büyük onarımlar için 4.450.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 2.500.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 6.950.000.TL olmuştur. Ödeneğin 6.383.578,09.TL'si harcanmış, 566.421,91.TL ödenek harcanamamıştır.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir;

TARİHİ BİNA RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ: 413.440,91,00 TL sözleşme bedelli işimizin sözleşmesi 06.07.2020 tarihinde imzalanmış olup, 10.07.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.



MERKEZİ KAFETERYA BAKIM ONARIM: 13.07.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, 23.11.2020 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.



DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONARIM VE TADİLATI: 16.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, binamız geçici kabul aşamasındadır.



NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ YAPIM İŞİ: 13.01.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, binamız geçici kabul aşamasına gelmiş, süreç devam etmektedir.



Büyük Onarım Kapsamında Yapılan İşler

HARCAMANIN ADI	TUTARI
Rektörlük ve bağlı birimlerin klima bakım, montaj ve onarım işi	24.190,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi WC'lerinin lavabo ve tuvalet taşlarının yenilenmesi işi	31.933,16
Bor Meslek Yüksekokulu, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu ve Zübeyde Hanım Sağlık Meslek Yüksekokulunun kazan, kombi bakım ve onarım işi	24.302,10
Fen Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Bor Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Binası ve Merkez yerleşke bazı birimlerin mekanik tesisat işi	9.086,00
Merkez yerleşke ve bağlı birimlerin kombi, hidrofor ve sirkülasyon pompaları arıza bakım ve onarım işi	27.676,90
Merkez yerleşke ve Bor Meslek Yüksekokulu su tesisatı, arıza bakım ve onarım işi	6.175,94
	6.372,00
Deney hayvanları laboratuvarı havalandırma tesisatı onarım işi	
Rektörlük ve bağlı birimler klima ve soğuk hava depoları montaj, bakım ve onarım işi	14.903,40
Merkez, Bor ve Ulukışla Yerleşkesi kazan, hidrofor, sirkülasyon pompaları arıza, bakım, onarım işi	15.517,00
Fen Edebiyat Fakültesi kombi bakım ve onarım işi	1.770,00
Merkez yerleşke bazı birimler mekanik tesisat işi	7.050,50
Ana nizamiye ve 6.kabin arası fiber hattı çekim işi	3.105,76
Derbent yerleşkesi kartlı boy turnikesi yapım işi	25.281,50
Merkez yerleşke yol aydınlatma armatürlerinin bakım onarım işi	35.651,34
Rektörlük ve bağlı birimler güvenlik kamerası ve ekipmanları bakım onarım işi	10.061,86
Rektörlük ve bağlı birimler otomatik kapı (fotoselli) bakım onarım işi	3.227,30
Anıt binasında bulunan 170kVA dizel jeneratör grubunun merkezi kafeterya binasına taşınarak kurulumunun yapılması işi	12.390,00
Rektörlük ve bağlı birimler elektrik bakım onarım işi	26.004,84
Rektörlük ve bağlı birimlerin TSE eksikleri kapsamında asansör mavi etiket alımı ve asansör bakım onarım işi	20.227,56
Güvenlik kamera sistemleri bakım onarım işi	5.020,90
Mimarlık Fakültesi asansör periyodik bakım işi	1.274,40
Merkez yerleşke yeraltı galeri hatları aydınlatma sistemi bakım onarım işi	37.418,39
Rektörlük binası asansör periyodik bakım işi	3.398,40
Sabiha Şahenk Kütüphanesi asansör periyodik bakım işi	2.548,80
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu B ve C Blok elektrik hatları bakım onarım işi	33.153,28
Ulukışla Meslek Yüksekokulu asansör mavi etiket alım işi	4.684,60

Mimarlık Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi asansör TSE mavi etiket alım işi	6.183,20
Rektörlük ve bağlı birimler elektrik bakım onarım işi	37.152,30
Güvenlik kamera sistemleri bakım onarım işi	15.865,69
Rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılan jeneratörlerin bakım ve onarım işi	25.499,80
Rektörlük ve bağlı birimlerin TSE eksikleri kapsamında mavi etiket alımı ve asansör bakım onarım işi	19.906,60
Rektörlük ve bağlı birimler kesintisiz güç kaynakları bakım ve onarım işi	19.776,80
Sabiha Şahenk Kütüphanesi asansör periyodik bakım işi	2.548,80
Eğitim Fakültesi asansör periyodik bakım işi	4.672,80
Rektörlük binası asansör periyodik bakım işi	3.398,40
Mimarlık Fakültesi asansör periyodik bakım işi	955,80
Mimarlık Fakültesi asansör periyodik bakım işi	955,40
Rektörlük ve bağlı birimler otomatik kapı (fotoselli, kollu) bakım onarım işi	2.631,40
Mimarlık Fakültesi asansör periyodik bakım işi	637,20
Fen Edebiyat Fakültesi asansör periyodik bakım işi	885,00
Merkez Yerleşke ve Spor Bilimleri Fakültesi kilitli parke tadilatı yapım işi	35.246,60
Spor Bilimleri Fakültesi olimpik salon çatı tadilatı yapım işi	37.053,18
Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi çatı tadilatı yapım işi	18.775,00
Futbol Sahası, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi bakım onarım ve anıt alanı andezit döşeme imalatları yapım işi	35.366,37
Spor Bilimleri Fakültesi ile Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi bakım ve onarım işleri	35.824,80
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mutfak onarım ve tadilatı	35.896,78
İletişim Fakültesi dış cephe mantolama ve sıva boya işleri	30.632,80
Ulukışla Meslek Yüksekokulu çatı onarımı ile dış cephe bakım ve tadilat işleri	35.931,00
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi sahneleri ahşap parke vernik ve cila işleri	4.248,00
Merkez yerleşke tüm peyzaj alanları kamelya ve bank ahşap boyama imalatları	23.363,57
Kampüs bünyesinde bulunan fakültelerin yaklaşık 110.000 m2 çatılarının oluk temizliği ve küçük su kaçaklarının tamir işi	37.288,00
Merkez yerleşke muhtelif tadilat, onarım, boya işleri ve güvenlik kulübesi alüminyum bölme yapılması işi	36.568,20
Bor yerleşkesi güvenlik çiti yapım işi	25.945,37
Rektörlük ve bağlı birimlerde yapılan tadilat ve onarım işleri	13.204,20
Rektörlük ve bağlı birimlerde yapılan tadilat ve onarım yapım işleri	25.794,80
Klima alımı ve bakım-onarım işi	7.375,00
Merkez yerleşke park ve bahçe alanlarında kullanılmak üzere kepçe kiralama işi	1.770,00

Kampüs çevre duvarının etrafındaki kameraların görüş alanının açılması nedeniyle, enerji evi arkasındaki su patlağının giderilmesi, Fen Edebiyat Fakültesi arkasında çim alan çalışması için tesviye yapılması taşların kaldırılması toprak serilmesi gibi işler için iş makinası kiralama işi	4.277,50
Merkez yerleşkedeki orman alanlarının sürülmesi ve çapalanması öncesi ilgili alanlarda mevcut taş ve kayaların toplanması için taş toplama makinası kiralama işi	6.040,00
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kesintisiz güç kaynağı akü ve soğutma fanı alım işi	14.495,24
Hizmet Binalarında kullanılan kesintisiz güç kaynaklarına akü alım işi	28.676,48
Dekoratif led aydınlatma armatürü ve 3m direk alım işi	35.931,00
Spor Bilimleri Fakültesi telefon santral konsolu alım işi	1.003,00
Dekoratif led aydınlatma armatürü ve 3m direk alım işi	34.810,00
150W-250W E-40 yüksek basınçlı sodyum buharlı ampul alım işi	7.965,00
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi	6.796,80
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi	6.796,80
İletişim Fakültesi Asansör TSE periyodik muayene ücreti	742,45
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi	6.796,80
Sabiha Şahenk Kütüphanesi TSE asansör periyodik muayene ücreti	1.113,68
Eğitim Fakültesi asansör TSE periyodik muayene ücreti	1.113,68
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi	6.796,80
Dalgıç pompa ve sistemlerinin bakım onarım işi	7.434,00
Rektörlüğe bağlı birimlerin kombi, hidrofor ve sirkülasyon pompaları bakım onarım işi	30.562,00
Mühendislik Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çatı onarım işi	31.100,00
Rektörlük Binası ve Yabancı Diller Yüksekokulu çatı onarım işleri ile kamelya üstü yapım işi	9.530,00
Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü çatı tadilat ve onarım işi	32.937,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bakım onarım işi (Kesin Hesap Hakedişi)	61.837,18
Niğde İli Cullaz Sok 24 parselde bulunan tarihi evin restorasyon yapım işi hakediş ödemesi	540.565,80
Niğde İli Cullaz Sok. 9 Ve 25 parsellerde bulunan tarihi evlerin restorasyon işi ikmal inşaatı hakediş ödemesi	663.826,88
Merkezi kafeterya bakım onarım işi hakediş ödemesi	776.440,00
Nanoteknoloji Araştırma Uygulama Merkezi yapım işi hakediş ödemesi	2.137.053,32
Niğde İli Cullaz Sok. 9 Ve 25 Parsellerde bulunan tarihi evlerin restorasyon yapım işi hakediş ödemesi	955.157,89
GENEL TOPLAM	6.383.578,09

Proje No: 2020H03-152566 Proje Adı: Yayın Alımı

2020 yılında yayın alımları için 1.250.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 1.249.796,30.TL'si harcanmıştır. 2020 yılı içerisinde aboneliği yenilenenler ve Ulakbim EKUAL projesi kapsamında serbest olarak sağlanan veri tabanları ile birlikte toplam 57 adet veri tabanına aboneliğimiz devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde kütüphanemize 476 adet Türkçe ve Yabancı basılı kitap satın alınmış, bağış olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar tarafından gönderilen 712 kitap ile birlikte toplam 1.188 adet basılı, 550 adet e-kitap yayının veri girişi yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 2020 yılı içerisinde 259.330 e-kitaba, 31.352 e-dergiye ve 4.500.000 e-teze erişimimiz bulunmaktadır. Yayın alımı kapsamında yapılan harcamalar aşağıda listelenmiştir.

S.No	Harcamanın Adı	Tutar (TL) Kdv Dahil
1	Clinical key	113.227,22
2	Hukuk Türk	3.304,00
3	İdeal Online	32.780,40
4	UpToDate	55.671,09
5	Oxford Journals	44.300,92
6	ACS	89.340,95
7	Pnas	9.761,05
8	EDS	42.083,54
9	Sobiad	9.900,00
10	AYEUM	35.000,00
11	APS	45.113,56
12	RSC Journals	98.617,83
13	SAGE	94.470,66
14	ProQuest E-Book Central	35.999,86
15	IOP	68.691,34
16	Turcademy	28.168,83
17	ProQuest Cetral	169.297,77
18	Education Source	73.819,08
19	Hiperkitap Online	88.416,36
20	ECS Digital Library	20.329,37
21	SPRINGER E Kitap	24.520,32
22	JSTOR E Kitap	2.790,59
23	Türkçe ve Yabancı Basılı Kitap	32.097,09
24	Yabancı Basılı Kitap	32.094,47
	GENEL TOPLAM	1.249.796,30

Proje No:2010K12-1315-39036 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2020 yılı bütçe ödeneği 10.000.TL olup, Ödeneğin tamamı “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba aktarılmıştır.

2020 yılından yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

S.NO	HARCAMANIN ADI	TUTARI
1	Rejeneratif Gaz	334,33
2	Laboratuvar Gereçleri 13 kalem	29.500,00
3	MOS2 Suputter Target, MOSE2 Sputter Target, WS2 Sputter Target, WSE2 Sputter Target, MOTE2 Sputter Target, WTE3 Sputter Target	31.817,52
4	Laboratuvar Gereçleri 21 kalem	44.056,69
5	S-cube Sistemi AK 1000 PECUD için Servis Hizmeti(Bozulan s-cube sisteminin çıkarılması, Yeni sistemin takılması, Vakum Sistemi Kontrolü, Transport Sistemi kontrolü, Zehirli ve yanıcı gazların güvenlik önlemleri kontrolü, Hidrolik sistem kontrolü, Alarm Sistem kontrolü, Sistemin çalışır hale gelmesi, garanti vb.)	585.280,00
6	Yüksek saflıkta Argon, Yüksek saflıkta azot, saf azot, Yüksek saflıkta Hidrojen Gazı	2.409,45
	TOPLAM	693.397,99

Proje No: 2020H03-150383-150384 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2020H03-150383-150384								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2020								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje ve Müşavirlik								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2019 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2020				50		15		62.855	98
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

2020 yılı ödeneği 50.000.TL olup, Altyapı projesinden 15.000.TL aktarma yapılarak yılsonu ödeneği 65.000.TL olmuştur. Ödeneğin 62.855,87 TL. 'si harcanmış olup 2.144,13 TL ödenek harcanmamıştır.

Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi avam projesi hazırlanması için 37.978,30 TL harcanmıştır.

357 Ada 24 Parselde bulunan tarihi yapının restorasyon projelerinin hazırlanması için 20.000,00 TL harcanmıştır.

276 Ada 6 Parsel Aplikasyon Krokisi hazırlanması için 4.877,57 TL harcanmıştır.

Proje No: 1994H03-450 Proje Adı: Derslik ve Merkezi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR		EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN;									
ADI		DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI							
NUMARASI		1994H032370							
YERİ		NİĞDE							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		1994-2021							
KARAKTERİSTİĞİ		Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası 6.500 m2+ Morfoloji Binası 17.500 m2							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2019 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI	Revize								
1994	66.648	54.650		3.000		3.000		2.505	83,50

(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı ile Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı devam etmektedir. 2020 yılında 3.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 2.504.472,71. TL.'si harcanmış olup, 495.527,29 TL ödenek harcanmamıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Canber Müh.İnş.Tic.A.Ş.	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Bşk. b) Arıkan İnş. & Ak-Koç İnş. İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı	Tıp Fakültesi Morfoloji Derslik Binası 1. Etap İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	13.922.436,12 TL	27.029.496,37 TL
5-İHALE BEDELİ	10.440.000,00 TL	21.365.000,00TL
6- İHALE TARİHİ	13.05.2020	28.07.2017
7- MUKAVELE TARİHİ	07.07.2020	25.09.2017
8-YER TESLİM TARİHİ	10.07.2020	27.09.2017
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.07.2020	27.09.2017
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	09.06.2022	13.12.2019
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	6.264,00 TL	% 0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ		
14-SÖZLEŞME ARTIŞI		% 5.2
15-SÖZLEŞME BEDELİ	10.440.000,00 TL	22.496.414,51 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	6.500 m2	17.500 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 45	% 100
18- İNŞAATIN DURUMU		Tamamlandı.

Proje No: 1994H03-450-14455 Proje Adı: KONSERVATUVAR İNŞAATI

2020 yılı ödeneği 2.000.000,00 TL olup, bu ödeneğin 1.998.561,62 TL.'si yıl içerisinde imalat yapılarak KDV ve fiyat farkı dahil harcanmıştır. C blok son kat betonarme tabliyesi, bims blok duvar imatları, iç bölme duvarlardaki alçıpan kaplamaların galvanizli profil taşıyıcı imatları, dış cephe sıvası, dış cephe ısı mantolama imatları, bütün bloklardaki ahşap oturtma çatı, çatı kaplaması, çatı ısı yalıtım imatları tamamlanmıştır. Dış cephe alüminyum profil imatları belli bir kısmı yapılmış olup, fizik gerçekleşmesi % 45'dir.



Konservatuvar binası inşaatı

Proje No: 1994H03-450-14453 Proje Adı: TIP FAKÜLTESİ DERSLİK BİNASI

2020 yılı ödeneği 1.000.000.TL olup ödeneğin 505.911,09.TL.'si harcanmış, 494.088,91.TL.'si harcanamamıştır. Binamızın geçici kabulü yapılarak kesin kabul aşamasına gelinmiştir.



Tıp Fakültesi Morfoloji Derslik Binası inşaatı

Proje No: 2020H03-152567-152568 Proje Adı: Kampüs Altyapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	KAMPÜS ALTYAPI 5. KISIM İNŞAATI								
NUMARASI	2020H03-152567-152568								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2022								
KARAKTERİSTİĞİ	BESYO, Bor, Derbent, Aşağı kayabaşı ve Merkez Yerleşkede Mevcut Yol Yapımı, Alanda Peyzaj ve Çevre düzenleme, İlave içme suyu, Kanalizasyon ve Otopark.								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2018 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
1994	9.000	-		2.500				0	0
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Bşk. b) MVC İnşaat Taahhüt Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	BESYO, Bor, Derbent, Aşağı kayabaşı ve Merkez Yerleşkede Altyapı
4-YAKLAŞIK MALİYET	12.711.603,71 TL
5-İHALE BEDELİ	10.331.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	02.05.2018
7- MUKAVELE TARİHİ	12.06.2018
8-YER TESLİM TARİHİ	19.06.2018
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 05.06.2018
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.06.2018
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	26.08.2020
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	
16- TOPLAM KAPALI ALANI	
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 18,43
18- İNŞAATIN DURUMU	Tasfiye edildi.

KAMPÜS ALTYAPI TESİSİSLERİ 5. KISIM İŞLERİ

2020 yılı ödeneği 2.500.000.TL olup, 15.000.TL ödenek Çeşitli Üniteler Etüt Projesine aktırılmış olup kalan ödenek harcanamamıştır.

7161 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 4 üncü madde gereğince yüklenici idaremize işin tasfiyesi talebinde bulunmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile tasfiye çalışmaları tamamlanarak hesap kesme hakedişi yapılmıştır.



Altyapı 5.kısım işleri

1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1 Proje Tamamlama Raporu

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK

- ✦ Ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,
- ✦ Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- ✦ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzamakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.
- ✦ Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması, yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2020

PROJE BAZINDA HARCAMALAR						
Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama - Bitiş Yılı	2020 Yılı Toplam Ödenek	2020 Yılı Harcama
					Toplam	Toplam
NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ					21.710.000	17.874.235
DKH-SOSYAL					10.000	10.000
Teknolojik Araştırma					10.000	10.000
2010K12-1315	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Niğde	İnşaat (3.100 m ²), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2010-2020	10000	10000
2010K12-1315-39032	İnşaat	Niğde	İnşaat (3.100 m ²)	2010-2014	0	-
2010K12-1315-39036	Diğer	Niğde	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2010-2020	10000	10000
EĞİTİM					21.700.000	17.864.235
Yükseköğretim					21.700.000	17.864.235
1994H03-450	Derslik ve Merkezi Birimler	Niğde	Eğitim (24.000 m ²)	1994-2021	3.000.000	2.504.472
1994H03-450-14453	Tıp Fakültesi Derslik Binası	Niğde	Eğitim (17.500 m ²)	2017-2020	1.000.000	505.911
1994H03-450-14455	Konservatuvar	Niğde	Eğitim (6.500 m ²)	2017-2021	2.000.000	1.998.561
2020H03-150383	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2020-2020	65.000	62.856
2020H03-150383-150384	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2020-2020	65.000	62.856
2020H03-152046	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-18 (2 adet)	2020-2020	14.900.000	14.047.111
2020H03-152046-152047	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-18 (2 adet)	2020-2020	14.900.000	14.047.111
2020H03-152566	Yayın Alımı	Niğde	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2020-2020	1.250.000	1.249.796
2020H03-152567	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	2.485.000	-
2020H03-152567-152568	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	2.485.000	-
