



*Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı*

**NİĞDE, Mart 2020**

## 1- GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME	KALAN ÖDENEK
HAZİNE	21.002.000	25.902.000	20.127.569	5.774.431
ÖZGELİR	0	0	0	0
NET FİNANSMAN	0	10.775.000	10.215.000	560.000
ŞARTLI BAĞIŞ	0	449.597	320.965	128.633
GENEL TOPLAM	21.002.000	37.126.597	30.663.534	6.463.064

### 1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

### 1.3 2019 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

#### Hedeflenen;

- ✘ Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- ✘ İİBF Derslik ve A Blok Amfi Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilerek hizmete açılması,
- ✘ Türk Musikisi ve Konservatuvar binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 60 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi,

- ✘ Süheyla- Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Kampüs Alt yapı tesislerinin 5.kısım inşaatının %50 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesinin yapılması,
- ✘ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımların alınması,
- ✘ Kütüphane Daire Başkanlığınca basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması,

### **Gerçekleşen;**


- ✘ Merkezi Araştırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıştır.
- ✘ Türk Musikisi ve Konservatuvar binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 30 seviyesine getirilmiş ancak ihale feshedilmiştir.
- ✘ İİBF Derslik ve A Blok Amfi Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek hizmete açılmıştır.
- ✘ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Süheyla- Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek hizmete açılmıştır.
- ✘ Kampüs Alt Yapı Tesisleri 5.kısım inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 20 seviyesine getirilmiş ancak ihale yüklenicinin talebi ile tasfiye süreci başlatılmıştır.
- ✘ Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerin tadilat ve onarım işleri tamamlanmıştır.
- ✘ Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır.
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımlar alınmıştır.
- ✘ Basılı ve elektronik yayınlar satın alınmıştır. Elektronik yayın veri tabanlarına abone olarak Üniversitemizin bilgiye erişim kapasitesi artırılmıştır.
- ✘ İhalesi ve kontrolörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ödeneği Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü bütçesinden karşılanan Satış Ofisi inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 20 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ İhalesi ve kontrolörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ödeneği Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Unikop Enerji Evi inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.

### 1.4 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2019 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 21.002.000.TL iken, 5018 sayılı kanunun 40. maddesi uyarınca sağlık merkezi yapılmak üzere 449.597.TL şartlı bağış, 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 10.775.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 4.900.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu sermaye ödeneği toplamı 37.126.597.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 30.663.534. TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.000.000	9.500.000	9.441.232	%99,38
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	250.000	525.000	464.994	%88,57
6.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	2.000	0	%0,00
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.750.000	24.099.597	18.221.767	%75,61
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.000.000	3.000.000	2.535.541	%84,52
	GENEL TOPLAM	21.002.000	37.126.597	30.663.534	%82,59

\* HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) \*

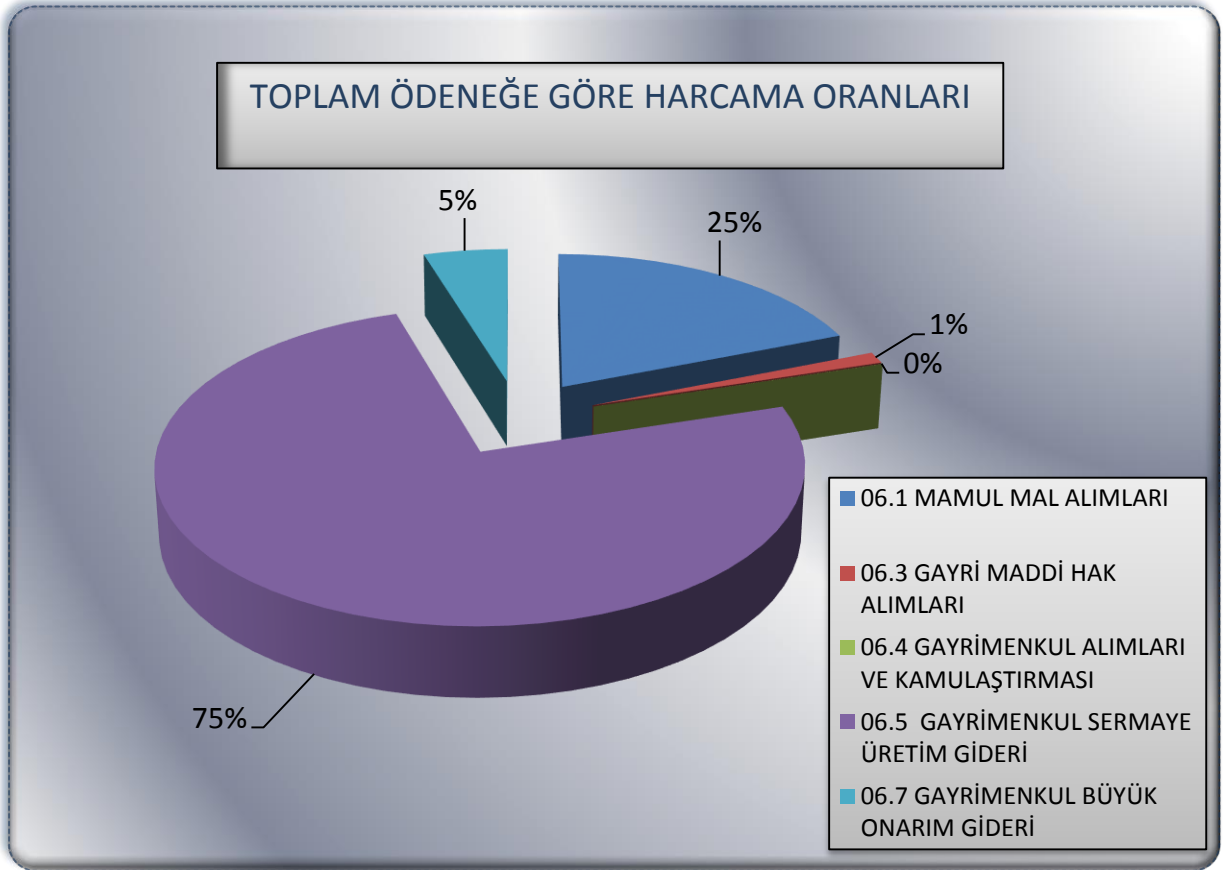

**2- 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI****2.1 Devam Eden Projeler****2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri****Proje No: 2014H030270 Proje Adı: Muhtelif İşler**

2019 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 3.250.000.TL'dir. 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/5 maddesi uyarınca 5.275.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yılsonu ödeneği 8.525.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 7.941.786.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

**Makine-Teçhizat Alımları**

2019 yılında makine-teçhizat alımları için 2.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7166 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 3.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 5.000.000.TL olmuştur. Ödeneğin 4.941.251,61.TL'si harcanmış, 58.748,39.TL ödenek harcanmamıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI (KDV Dahil)
<b>Rektörlük ve Bağlı Birimler</b>			
	İstif Makinesi Alımı	1 adet	5.310,00
	Balya Pres Makinesi Alımı	1 adet	27.730,00
	Plaka Tanıma Sistemi ve Ekipmanları	Muhtelif	34.574,00
	Switch Alımı	4 adet	21.806,40
	Kartlı Kapı Geçiş Sistemi ve Ekipmanları	Muhtelif	35.402,36
	E-Sertifika ve Mini Kart Okuyucu	624 adet	92.040,00
	Kablosuz Ağ Sistemi	12 adet	35.329,20
	Ses Sistemi	Muhtelif	19.116,00
	Kompozit Numune Alma Cihazı	1 adet	11.800,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	2.600,64
	Fotokopi Makinesi Alımı	1 adet	22.500,00
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	4.591,38
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	3.068,00
	Dizüstü Bilgisayar Alımı	7 adet	72.349,27
	Bakiye Görüntüleme Cihazı	1 adet	5.428,00
	Kamera ve Ekipman Alımı	Muhtelif	34.798,00

	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	8.555,00
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	182 adet	1.180.285,56
	Projeksiyon Cihazı Alımı	20 adet	96.569,08
	Evrak İmha Makinesi Alımı	2 adet	2.469,15
	Tarayıcı Alımı	14 adet	32.466,92
	Yazıcı Alımı	24 adet	50.446,27
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	115.745,99
	Güvenlik Duvarı Alımı	1 adet	312.700,00
	Yemekhane Otomasyon Sistemi Alımı	1 adet	145.140,00
<b>Tıp Fakültesi</b>			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	430.043,78
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	35.282,00
	Büro Mefruşatı Alımı	25 adet	19.554,08
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	35.400,00
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	9 adet	56.598,86
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	2.766,97
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	88.235,25
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	39.870,27
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	3.039,68
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	5.828,02
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	5.689,96
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	3 adet	12.032,46
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	4.600,82
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	4.600,82
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	3.304,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	11.210,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	1.722,80
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	3.127,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	3.127,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	12.956,40
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	7.599,20
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	45.135,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	3 adet	15.745,92

	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	41.800,32
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	5.248,64
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	66.960,00
<b>Mühendislik Fakültesi</b>			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	9.385,20
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	7 adet	49.750,81
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	33.594,30
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	21.664,80
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	5.451,60
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	6.844,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	45.890,20
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	33.040,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	70.800,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	16.343,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	23.600,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	5.451,60
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	27.140,00
<b>Fen Edebiyat Fakültesi</b>			
	Büro Mefruşatı Alımı	45 adet	10.089,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	23.525,75
<b>Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi</b>			
	Dal Parçalama Makinesi	1 adet	21.830,00
	Römork Alımı	1 adet	22.725,00
	Süt Sağım Makinesi	1 adet	2.399,76
	Etilen Ölçüm Cihazı	1 adet	11.274,90
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	13.643,16
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	5.310,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	48.380,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	68.440,00
<b>İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi</b>			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	164.040,41
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	1 adet	6.288,76

<b>Merkezi Araştırma Laboratuvarı</b>			
	Laboratuvar Tezgahı ve Mefruşat Alımı	Muhtelif	25.381,80
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	25.960,00
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	1 adet	6.288,76
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	49.942,32
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	12.390,00
<b>İletişim Fakültesi</b>			
	Fotoğraf Makinesi ve Ekipmanları	Muhtelif	4.820,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	5.900,00
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	2 adet	12.577,52
<b>Mimarlık Fakültesi</b>			
	Büro Mefruşatı Alımı	50 adet	14.750,00
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	3 adet	18.866,29
<b>Sağlık Bilimleri Enstitüsü</b>			
	Lazer Yazıcı	1 adet	6.990,12
<b>Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu</b>			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	22.864,35
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	2 adet	14.214,52
<b>Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu</b>			
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	6 adet	26.792,04
<b>Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu</b>			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	39.728,70
<b>Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı</b>			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	8.079,84
<b>Güzel Sanatlar Fakültesi</b>			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	34.113,60
<b>Sağlık Bilimleri Fakültesi</b>			
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	2 adet	12.577,53
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	19.939,59
<b>İslami İlimler Fakültesi</b>			
	Büro Mefruşatı Alımı	1 adet	3.304,00
<b>Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu</b>			
	Turnike Geçiş Sistemi	1 adet	4.602,00
	Büro Mefruşatı Alımı	1 adet	5.605,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	29.494,98
	Amfi Sıra Alımı	Muhtelif	29.001,89
	Mutfak Ekipman ve Malzemeleri Alımı	Muhtelif	290.377,94
	Masaüstü Bilgisayar Alımı	6 adet	37.732,58
<b>Yabancı Diller Yüksekokulu</b>			
	Makine-Teçhizat Alımı	4 adet	5.192,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	3.115,80



<b>Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu</b>			
	Turnike Geçiş Sistemi	1 adet	4.602,00
<b>Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu</b>			
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	19.210,40
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	4.899,50
	Amfi Sıra Alımı	Muhtelif	30.520,70
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	30.213,51
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>4.941.251,61</b>

### Yazılım Alımları

2019 yılında yazılım alımları için 250.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7166 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 275.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 525.000.TL olmuştur. Ödeneğin 464.993,62.TL'si harcanmış, 60.006,38.TL ödenek harcanamamıştır.

ALIMI YAPAN BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV Dahil)
<b>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</b>	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Alımı	190.000,00
<b>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</b>	E-kamu İşçi Yazılım Programı Alımı	15.000,00
<b>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</b>	Talep Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı	10.000,00
<b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b>	Microsoft Yazılım Lisansı Alımı (600 Kullanıcılı)	229.971,38
<b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b>	Logsign Focus Lisans Alımı (1 yıllık)	7.929,60
<b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b>	Wildcard SSL Sertifikası	12.092,64
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>464.993,62</b>

### Kamulaştırma

7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000. TL ödenek tahsis edilmiş olup herhangi bir kamulaştırma yapılmadığından ödenek harcanamamıştır.

## **Büyük Onarım**

2019 yılında büyük onarımlar için 1.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 2.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 3.000.000.TL olmuştur. Ödeneğin 2.535.541,01.TL'si harcanmış, 464.458,99.TL ödenek harcanmamıştır.

*Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir;*

**TARİHİ BİNA RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ:** 884.400,00 TL sözleşme bedelli işimizin sözleşmesi 29.11.2019 tarihinde imzalanarak, 03.12.2019 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.



**ATIK DEPOLAMA TESİSİ YAPIM İŞİ:** 2019 yılı içerisinde sözleşme bedeli 661.000,00 TL olup, 12.822,48 TL sözleşme bedeli artışı ile toplam sözleşme bedeli (KDV hariç) 673.822,48

TL dir. Atık Depolama tesisi binası 795.110,52 TL harcama yapılarak 09.11.2019 tarihi itibari ile Geçici Kabulü yapılmış olup hizmete alınmıştır.



**TEL VE DEKORATİF ÇİT YAPIMI:** Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelerde huzur ve güvenin artırılması ile ilgili yazısına istinaden kampüs çevresine tel ve dekoratif çit yapımı için 12.07.2019 tarihinde ihale yapılarak 20.08.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %100 oranında tamamlanmış olup hizmete alınmıştır.



**SOSYAL BİLİMLER MYO BAKIM VE ONARIM İŞİ:** 04.11.2019 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, Boya işleri, kapılar ve mutfak kısmı, seramik işleri tamamlanmak üzere fiziki gerçekleşmesi %98 olup, Geçici Kabul aşamasına gelmiştir.





**Büyük Onarım Kapsamında Yapılan Diğer İşler**

HARCAMANIN ADI	TUTARI
Bor Yerleşkesinin giriş nizamiye turnike çevresi boşluklarının kapatılması ve delinatör ile yolun on beş metre mesafe ile ikiye bölünmesi işi	6.369,05
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin klima ve soğuk hava depoları ile Mimarlık Fakültesi klima bakım onarım işi	31.211,00
Halı saha soyunma ve idari odaları onarım işi	34.999,98
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Basketbol ve Voleybol Sahaları) onarım işi	35.211,20
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi	6.018,00
Merkez Yerleşke ve Bağlı Birimlerin mekanik tesisat bakım, onarım ve klima takım işi	5.369,00
Merkez Yerleşke ve Bağlı Birimlerde yapılan bakım onarım işi	3.483,36
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu asansör(170475792-1 kimlik numaralı) mavi etiket alım işi	35.400,00
Rektörlük binası A ve B blok yangın algılama sistemleri değişim işi	31.976,82
Fen Edebiyat Fakültesi ve Yemekhane Binalarının çatı tadilatı işi	4.129,53
Cullaz Sok. 22. parselde yıkılan bölümün duvarı ve çatı tadilatı yapım işi	11.800,00
Mühendislik Fakültesi çatı tadilat işi	4.749,50
İş Makinesi kiralama işi	16.691,10
Merkez Yerleşke doğu cephesi sınırında bulunan eğik tip betonarme direk kafes teli himaye çiti tadilat ve onarım işi	8.283,60
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatı tadilatı ve onarım işi	5.310,00
Rektörlük ve Bağlı Birimler elektrik bakım onarım işi.	16.518,82
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu ve Bor Hayvancılık Uygulama Merkezi mekanik tesisat bakım onarım işi	15.340,00
Merkez Yerleşke otobüs durakları üzeri logar açılması ve yenilenmesi işi	1.416,00
Merkez Yerleşke 276 Ada 35 Parselde sulama amaçlı sondaj açma ve pompa kurulumu işi	29.500,00
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu mekanik tesisat bakım onarım işi	31.742,00
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi seralarındaki mevcut kazanların bakım ve parça değişim işi	3.188,36
Eğitim Fakültesi asansör revizyon işi	1.416,00
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi	12.036,00
Asansör malzemesi alım işi	7.209,80
Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 698497849-1 kimlik numaralı Asansör TSE mavi etiket alım işi	2.997,20
Bor Meslek Yüksekokulu binasında çatı ve iç cephelerde boya dış cephede merdiven basamak tadilat ve onarım yapım işi	9.440,00
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi binasında iç cephelerde boya seramik tadilat ve onarım yapım işi	21.240,00

Besyo A Ve B Spor Salonlarının dış cephe boya ve tadilat onarım işi	35.019,80
1600 KVA Trafo Sekonder A.A. koruma rölesi alım işi	6.490,00
İş Makinesi Kiralama İş	11.127,40
Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi mekanik tesisat bakım onarım işi	21.240,00
Kütüphane Binası tadilat yapım işi	32.072,40
Tıp Fakültesi Binası tadilat yapım işi	34.759,26
15 Temmuz Milli İrade Meydanı Tören Alanı tadilat ve onarım yapım işi	18.172,00
Kültür ve Sanat Evi dış cephe duvar onarım işi	8.260,00
Rektörlük Hizmet Binası asansör periyodik bakım işi.	3.398,40
İletişim Fakültesi tadilat ve onarım işi	35.103,23
Fen Edebiyat Fakültesi güvenlik kamerası ve ekipmanları alım işi	34.857,20
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi klima ve soğuk hava depolarının bakım onarım işi	10.148,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi hizmet binalarında kullanılan 475579645-1,475579645-2,748031051-1,748031051-2 kimlik numaralı asansörlere mavi etiket alım işi.	8.750,88
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yangın algılama sistemleri periyodik bakım işi	3.776,00
TR-2(1600kva 31,5kv) bakım onarım işi.	35.400,00
Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi sığırcılık ahırlarının onarımı yapım işi	16.520,00
Bor Meslek Yüksekokulu otomatik kapı bariyeri yapım işi.	10.620,00
Süheyla Hürrem Kübalı Aile Sağlık Merkezi bahçe merdiveni yapım işi	5.848,08
Rektörlük ve Bağlı Birimlerde kullanılan kesintisiz güç kaynaklarının bakım onarım işi	7.670,00
İletişim Fakültesi peyzaj aydınlatma armatürü alım işi	26.845,00
Eğitim Fakültesi asansör periyodik bakım işi	960,42
Boya-Alüminyum tadilat yapım işi	11.830,04
Mühendislik Fakültesi asansör periyodik bakım işi	5.097,60
Mimarlık Fakültesi hizmet binası asansör periyodik bakım işi	2.548,80
İletişim Fakültesi ve Merkez Yerleşke Spor Tesisleri kazan, kombi bakım ve onarım işi	21.122,00
Merkez Yerleşke ve Bağlı Birimlerin kombi, hidrofor ve sirkülasyon pompaları arızası bakım ve onarım işi	19.649,36
Merkezi Yerleşke park ve bahçeleri için iş makinelerinin kiralanması	6.749,60
Fen Edebiyat Fakültesi asansör periyodik bakım işi	2.802,50
Rektörlük Hizmet Binası asansör periyodik bakım işi	3.398,00
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yangın algılama sistemleri periyodik bakım işi	3.776,00
Fen Edebiyat Fakültesi kombi bakım ve onarım işi	19.057,00
Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kablosuz internet sistemi yapım işi	5.310,00

Bor Yerleşkesi kontrol kartlı giriş-çıkış turnikesi yapım işi	35.400,00
Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci kantini aydınlatma çatısı ve biyoloji laboratuvarlarının boya ve tadilatı işi	15.323,42
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin T.S.E. eksikleri kapsamında asansör mavi etiket alımı ve asansör bakım onarım işi	29.715,94
Rektörlük Binası ve Bağlı Birimlerde mekanik tesisat bakım onarım işi	5.894,10
Mühendislik Fakültesi yan tarafı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ön tarafına esnek yapılı altı kıvrıkcık paspas yapım işi	4.318,80
Bor Meslek Yüksekokuluna fiber hattı çekimi ve Merkez Yerleşkeye ilave güvenlik kamerası takımı işi	20.537,90
Mimarlık Fakültesi hizmet binası asansör periyodik bakım işi	2.442,60
Fidan dikim etkinliği için dikim yapılacak alanlarda tesviye ve hazırlıkların yapılabilmesi için iş makinesi kiralanması işi	4.560,70
Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında pvc ve boya yapım işi	8.301,30
Akıllı adresli yangın alarm santrali ve algılama sistemleri bakım onarımı	11.267,82
Rektörlük ve Bağlı Birimlerde kullanılan jeneratörlerin yağlı bakım onarım işi	20.537,90
Rektörlük ve Bağlı Birimler elektrik bakım onarım işi.	33.675,02
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık binası boya ve seramik yapım işi	10.620,00
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi.	6.018,00
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının öğretim görevlisi odaları ile derslik ve idari odaların iç cepheleerde boya ve tadilat yapım işi	16.771,93
Sabiha Şahenk Kütüphanesi güvenlik kamera sistemi yapım işi.	35.191,14
Merkez Yerleşke ve Bağlı Birimler elektrik motorları, mekanik tesisat bakım - onarım işi	34.102,00
Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Laboratuvarında seramik onarım işi	8.850,00
Merkez Yerleşke Ana Nizamiye giriş bariyer kolu ve emniyet kiti değişim işi	1.239,00
Fen Edebiyat Fakültesi güvenlik kamerası ve ekipmanları alım işi.	23.210,60
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bakım onarım işi hakediş ödemesi	326.992,99
Niğde İli Cullaz Sokak 17-18 ve 21 No' lu parsellerde bulunan Üniversitemize ait tarihi evlerin restorasyonu yapım işi hakediş ödemesi	34.041,29
Merkez Yerleşke tel ve dekoratif çit yapım işi hakediş ödemesi	189.992,75
Atık Depolama Tesisi yapım işi hakediş ödemesi	795.110,52
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.535.541,01</b>

**Proje No: 2018H035470 Proje Adı: Yayın Alımı**

2019 yılında yayın alımları için 1.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 999.980,75.TL'si harcanmıştır. 2019 yılı içerisinde aboneliği yenilenenler ve Ulakbim EKUAL projesi kapsamında serbest olarak sağlanan veri tabanları ile birlikte toplam 58 adet veri tabanına aboneliğimiz devam etmektedir. Yine 2019 yılı içerisinde kütüphanemize 943 adet Türkçe ve Yabancı basılı kitap satın alınmış, bağış olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar tarafından gönderilen 737 kitap ile birlikte toplam 1.680 adet yayının veri girişi yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 2019 yılı içerisinde 249.944 e-Kitaba, 29.622 e-Dergiye ve 2.100.000 e-Teze erişimimiz bulunmaktadır. Yayın alımı kapsamında yapılan harcamalar aşağıda listelenmiştir.

HARCAMANIN ADI	TARİH	TUTAR
Clinicalkey	26.03.2019	104.855,85
Hukuk Türk	14.03.2019	1.722,80
UpToDate	11.04.2019	43.124,94
Oxford Journals	11.04.2019	36.596,20
ACS	11.04.2019	72.487,11
Pnas	11.04.2019	8.173,22
MatSciNet	18.04.2019	19.690,13
EDS	18.04.2019	35.918,35
Sobiad	15.05.2019	8.250,00
İdeal Online	15.05.2019	16.940,60
APS	04.07.2019	36.294,48
ASTM	04.07.2019	69.665,92
RSC Journals	04.07.2019	75.692,07
SAGE	04.07.2019	71.408,29
Türkçe Basılı Kitap	09.07.2019	30.000,00
Turcademy	02.07.2019	23.600,00
ProQuest E-Book Central	11.07.2019	28.776,89
IOP	11.07.2019	50.358,95
ProQuest Cetral	16.10.2019	123.702,62
ECS Digital Library	16.10.2019	14.279,23
Education Source	16.10.2019	54.650,14
Hiperkitap Online	26.11.2019	63.392,96
Türkçe Basılı Kitap	05.12.2019	10.400,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>999.980,75</b>



**Proje No:2010 K121260 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı**

2019 yılı bütçe ödeneği 1.000.000.TL olup, 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 2.500.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yılsonu ödeneği 3.500.000.TL olmuştur. Ödeneğin tamamı “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba aktarılmıştır. Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

HARCAMANIN ADI	TUTARI
Meteroloji Gözlem İstasyonu	45.607,00
GlaveBox Eldiveni	6.844,00
Yüksek Saflıkta Hidrojen Gazı	1.829,00
27 Kalem Laboratuvar Malzemesi	59.001,09
Kompresör	1.943,46
Argon Gazı ve Hidrojen Gazı	2.153,50
Y.S. Azot Gazı	1.416,00
LG Arum 100 LTS Multi Vs Isı Pompası	136.408,00
Argon Gazı ve Hidrojen Gazı	2.655,00
<b>TOPLAM</b>	<b>257.857,05</b>

**Proje No: 2019H035460 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2019H035460								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2019-2019								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje ve Müşavirlik								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2019 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2019	100			100		100		35	35

(\*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)\*100 olarak verilecektir.

2019 yılı ödeneği 100.000,00 TL olup, Nanoteknoloji Araştırma Uygulama Merkezi Yapım İşi Projesi için (35.164,00 TL KDV Dahil) harcanmıştır.

**Proje No: 1994H032370 Proje Adı: Derslik ve Merkezi**

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI								
NUMARASI	1994H032370								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2020								
KARAKTERİSTİĞİ	Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası 6.500 m2+ İİBF Binası 9.000 m2 + Morfoloji Binası 17.500 m2+ Süheyla-Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi 1.150 m2								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2018 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI	Revize								
1994	67.650	24.750		13.650		21.999		18.186	83
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası İnşaatı, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı ve Süheyla-Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi (Şartlı Bağış) İnşaatı devam etmektedir. 2019 yılında 13.650.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 3.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 4.900.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneği ve 449.597,31 TL şartlı bağışın devri ile yılsonu ödenek toplamı 21.999.597.31.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 18.186.602,65. TL.' si harcanmış olup, 3.812.994,66.TL ödenek harcanmamıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Canber Müh.İnş.Tic.A.Ş.	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Seler Taah. Yapı İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	11.276.169,71 TL	11.869.362,40 TL
5-İHALE BEDELİ	8.833.000,00TL	11.452.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	06.04.2017	04.10.2017
7- MUKAVELE TARİHİ	15.05.2017	10.11.2017
8-YER TESLİM TARİHİ	17.05.2017	14.11.2017
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 05.05.2017	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 01.11.2018

<b>10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ</b>	17.05.2017	14.11.2017
<b>11- İŞİN BİTİM TARİHİ</b>	13.09.2019	14.10.2019
<b>12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI</b>	% 0.06	% 0,06
<b>13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ</b>	---	-
<b>14-SÖZLEŞME ARTIŞI</b>	---	-
<b>15-SÖZLEŞME BEDELİ</b>	8.833.000,00TL	11.452.000,00 TL
<b>16- TOPLAM KAPALI ALANI</b>	6.500 m2	9.000 m2
<b>17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 30	% 100
<b>18- İNŞAATIN DURUMU</b>	23.09.2019 tarih ve E.23647 sayılı olur ile fesh edilmiştir.	Tamamlandı

## **TÜRK MUSİKİSİ VE KONSERVATUVAR BİNASI İNŞAATI**

2019 yılı ödeneği 4.400.000.TL olup, ödeneğin 86.724,42 TL'si harcanmış olup 1.650.000,00 TL'si Morfoloji Binasına aktarılmıştır. A-B-D blokların betonarme karkas imalatları ve kaba inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. C-E blok zemin ve 1. kat betonarme karkas imalatları seviyesindedir. 7161 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 4 üncü madde gereğince yüklenici idaremize işin tasfiyesi talebinde bulunmuş ancak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tasfiyesi uygun görülmemiştir. Yüklenici sözleşme hükümlerine uymadığından 23.09.2019 tarih ve E.23647 sayılı olur ile sözleşmesi feshedilmiştir. Fiziki gerçekleşme % 30 olarak gerçekleşmiştir.



***Konservatuvar binası  
inşaatı***

## **İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EK DERSLİK İNŞAATI**

2019 yılı ödeneği 250.000.TL olup, ödenek harcanmamıştır. 9.000 m2 lik Ek Blok Yapım İşi tamamlanarak 13.02.2019 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100 olarak gerçekleşmiştir.



*IİBF ek derslik  
inşaatı*

**TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI İNŞAATI**

2019 yılı ödeneği 9.000.000.TL olup, 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 3.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 4.900.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneği ve 1.650.0000.TL. Konservatuvar İnşaatı ödeneğinden aktarma ile yılsonu ödenek toplamı 18.550.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 17.778.913,51.TL'si harcanmış olup 771.086,49.TL'si harcanamamıştır. Binamız Geçici Kabul aşamasında olup, imalatlar tamamlanmıştır.

<b>1-İLGİLİ DAİRE</b>	<b>Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi</b>
<b>2-SÖZLEŞME TARAFLARI</b>	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı b) Arıkan İnş. & Ak-Koç İnş. İş Ortaklığı
<b>3-SÖZLEŞMENİN KONUSU</b>	Tıp Fakültesi Morfoloji Derslik Binası 1. Etap İnşaatı
<b>4-YAKLAŞIK MALİYET</b>	27.029.496,37 TL
<b>5-İHALE BEDELİ</b>	21.365.000,00TL
<b>6- İHALE TARİHİ</b>	28.07.2017
<b>7- MUKAVELE TARİHİ</b>	25.09.2017
<b>8-YER TESLİM TARİHİ</b>	27.09.2017
<b>9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ</b>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 12.09.2017
<b>10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ</b>	27.09.2017
<b>11- İŞİN BİTİM TARİHİ</b>	05.11.2019
<b>12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI</b>	% 0.06
<b>13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ</b>	---
<b>14-SÖZLEŞME ARTIŞI</b>	---
<b>15-SÖZLEŞME BEDELİ</b>	22.496.414,51 TL
<b>16- TOPLAM KAPALI ALANI</b>	17.500 m2
<b>17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>18- İNŞAATIN DURUMU</b>	Tamamlandı.





***Tıp Fakültesi Morfoloji Derslik Binası inşaatı***

### **SÜHEYLA-HÜRREM KUBALI AİLE SAĞLIK MERKEZİ İNŞAATI (ŞARTLI BAĞIŞ)**

05.02.2018 tarihinde Hayırsever Hürrem Kubalı ile Aile Sağlık Merkezi yapılmak üzere Şartlı Bağış Protokolü imzalanmış ve 2.000.000. TL hayırsever tarafından Üniversitemiz hesaplarına yatırılmıştır. Projenin hayata geçirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığında onay alınarak Yatırım Programımıza dahil edilmiştir. 25.960,00 TL' ye Mühendislik Uygulama projeleri hazırlanmış ve 31.07.2018 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. 05.09.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2018 yılı içerisinde 1.550.402,69 TL harcama yapılmış olup 2019 yılından kalan 449.597,31 TL ödenek devir olarak işimize kaydedilmiş olup, 320.964,72 TL harcanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %100 olup Geçici Kabulü yapılarak hizmete açılmıştır.

	<b>Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi</b>
<b>2-SÖZLEŞME TARAFLARI</b>	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Seler Taah. Yapı İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti.
<b>3-SÖZLEŞMENİN KONUSU</b>	Süheyla-Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi (Şartlı bağış)
<b>4-YAKLAŞIK MALİYET</b>	1.665.187,18 TL
<b>5-İHALE BEDELİ</b>	1.633.000,00 TL
<b>6- İHALE TARİHİ</b>	31.07.2018
<b>7- MUKAVELE TARİHİ</b>	05.09.2018
<b>8-YER TESLİM TARİHİ</b>	05.09.2018
<b>9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ</b>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 28.08.2018
<b>10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ</b>	05.09.2018
<b>11- İŞİN BİTİM TARİHİ</b>	01.07.2019
<b>12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI</b>	---
<b>13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR</b>	---
<b>14-SÖZLEŞME ARTIŞI</b>	---
<b>15-SÖZLEŞME BEDELİ</b>	1.633.000,00 TL
<b>16- TOPLAM KAPALI ALANI</b>	1.150 m2
<b>17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 100
<b>18 İNŞAATIN DURUMU</b>	Tamamlandı.



**Süheyla-Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi**

**Proje No: 1994H032350 Proje Adı: Kampüs Altyapı**

<b>YATIRIM PROJE BİLGİLERİ</b>									
<b>SEKTÖR</b>	EĞİTİM								
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
<b>PROJENİN;</b>									
<b>ADI</b>	KAMPÜS ALTYAPI 5. KISIM İNŞAATI								
<b>NUMARASI</b>	1994H032350								
<b>YERİ</b>	NİĞDE								
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	1994-2020								
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	BESYO, Bor, Derbent, Aşağı kayabaşı ve Merkez Yerleşkede Mevcut Yol Yapımı, Alanda Peyzaj ve Çevre düzenleme, İlave içme suyu, Kanalizasyon ve Otopark.								
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>								<b>(Cari Fiyatlarla, Bin TL)</b>	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2018 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
1994	11.000	5.000		2.000				0	0
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

<b>1-İLGİLİ DAİRE</b>	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
<b>2-SÖZLEŞME TARAFLARI</b>	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Bşk. b) MVC İnşaat Taahhüt Ltd.Şti.
<b>3-SÖZLEŞMENİN KONUSU</b>	BESYO, Bor, Derbent, Aşağı kayabaşı ve Merkez Yerleşkede Altyapı
<b>4-YAKLAŞIK MALİYET</b>	12.711.603,71 TL
<b>5-İHALE BEDELİ</b>	10.331.000,00 TL
<b>6- İHALE TARİHİ</b>	02.05.2018
<b>7- MUKAVELE TARİHİ</b>	12.06.2018
<b>8-YER TESLİM TARİHİ</b>	19.06.2018
<b>9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ</b>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 05.06.2018
<b>10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ</b>	19.06.2018
<b>11- İŞİN BİTİM TARİHİ</b>	26.08.2020
<b>12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI</b>	% 0,06
<b>13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ</b>	
<b>14-SÖZLEŞME ARTIŞI</b>	
<b>16- TOPLAM KAPALI ALANI</b>	
<b>17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	% 20
<b>18- İNŞAATIN DURUMU</b>	Devam ediyor.



### **KAMPÜS ALTYAPI TESİSİLERİ 5. KISIM İŞLERİ**

2019 yılı ödeneği 2.000.000.TL olup, ödenek harcanamamıştır.

7161 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 4 üncü madde gereğince yüklenici idaremize işin tasfiyesi talebinde bulunmuştur. İdaremizce Hazine ve Maliye Bakanlığında bu konuda görüş talep edilmiş olup tasfiye çalışmaları devam etmektedir.



*Altyapı 5.kısım işleri*

**İhalesi ve Kontrolörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Bütçe Dışı İşler**

**SATIŞ OFİSİ YAPIM İŞİ:** Ödeneği Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.02.10.2019 tarihinde ihalesi yapılarak, 04.11.2019 tarihinde yer teslimi yapılmış, fiziki gerçekleşmesi %20 olup, çalışmalar devam etmektedir.



**UNİKOP ENERJİ EVİ İNŞAATI YAPIM İŞİ (BAP):** Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen işin ihalesi 22.05.2019 tarihinde yapılarak, 09.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 100 tamamlanmış olup, hizmete alınmıştır.



## **1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler**

### **2.2 Tamamlanan Projeler**

#### **2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi**

##### **2.2.1 Proje Tamamlama Raporu**

### **3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK**

- ✦ Ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,
- ✦ Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- ✦ Üniversitelerin eğitim-öğretim fiziki alanları kompleks bir yapıdadır. Büyük onarım çalışmalarında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde uygulamada sıkıntılar yaşanmakta olup, büyük onarım ihalelerinde “Teklif Birim Fiyat Sözleşmesinin” hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması,
- ✦ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzamakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.
- ✦ Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması, yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,

## YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2018

### SEKTÖR ADI EĞİTİM

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2018 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	+ / - (14)	Harcama Toplam
1994H032350	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Niğde	11.000	5.000	2.000		0
1994H032370	Derslik ve Merkezi Birimler(KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Niğde	67.650 (2.000)	24.750	13.650	+8.350	18,187
2014H030270	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Niğde	30.000	15.550	3.250	+5.275	7.941
2019H035460	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Niğde	100		100		35
2018H035470	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Niğde	3.000	3.000	1.000		1.000
<b>TOPLAM</b>					<b>157.120</b>	<b>62.021</b>	<b>20.000</b>	<b>+13.625</b>	<b>27.163</b>

\*tabloda 2.TL' lik kamulaştırma ödeneği işlenmemiştir

\*2.000.TL.' lik şartlı bağış tabloda işlenmiştir.

### SEKTÖR ADI DKH

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2018 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	+ / - (14)	Harcama Toplam
2010K121260	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2020	Niğde	24.225	20.725	1.000	2.500	3.500
<b>TOPLAM</b>					<b>24.225</b>	<b>20.750</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
