



**NİĞDE ÖMER
HALİSDEMİR
ÜNİVERSİTESİ**



2018 YILI



**YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve
DEĞERLENDİRME RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

NİĞDE, Mart 2019

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME	KALAN ÖDENEK
HAZİNE	33.000.000	35.000.000	27.370.559	7.629.441
ÖZGELİR	0	0	0	0
NET FİNANSMAN	0	19.423.000	18.135.566	1.287.434
ŞARTLI BAĞIŞ	0	2.000.000	1.550.403	449.597
GENEL TOPLAM	33.000.000	56.423.000	47.056.528	9.366.472

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2018Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- ✘ Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- ✘ İİBF Derslik ve A Blok Amfi Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Türk Musikisi ve Konservatuvar binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 30 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 30 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Kampüs Alt yapı tesislerinin 5.kısım inşaatının ihalesinin yapılması,

- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesinin yapılması,
- ✘ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımların alınması,
- ✘ Kütüphane Daire Başkanlığınca basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması,

Gerçekleşen;


- ✘ Merkezi Araştırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıştır.
- ✘ Türk Musikisi ve Konservatuvar binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 30 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ İİBF Derslik ve A Blok Amfi Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 99 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 50 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Süheyla- Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 80 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Kampüs Alt Yapı Tesisleri 5.kısım inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 20 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerin tadilat ve onarım işleri tamamlanmıştır.
- ✘ Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır.
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımları alınmıştır.
- ✘ Basılı ve elektronik yayınlar satın alındı. Elektronik yayın veri tabanlarına abone olunarak Üniversitemizin bilgiye erişim kapasitesi artırıldı.

1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2018 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 33.000.000.TL iken, 5018 sayılı kanunun 40. maddesi uyarınca sağlık merkezi yapılmak üzere 2.000.000.TL şartlı bağış, 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 19.423.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 2.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu sermaye ödeneği toplamı 56.423.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 47.056.528. TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	8.148.000	10.148.000	10.125.971	%99,78
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	250.000	250.000	29.731	%11,89
6.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	2.000	0	%0,00
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.600.000	43.023.000	35.297.700	%82,04
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.000.000	3.000.000	1.603.126	%53,44
	GENEL TOPLAM	33.000.000	56.423.000	47.056.528	%83,40

* HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) *

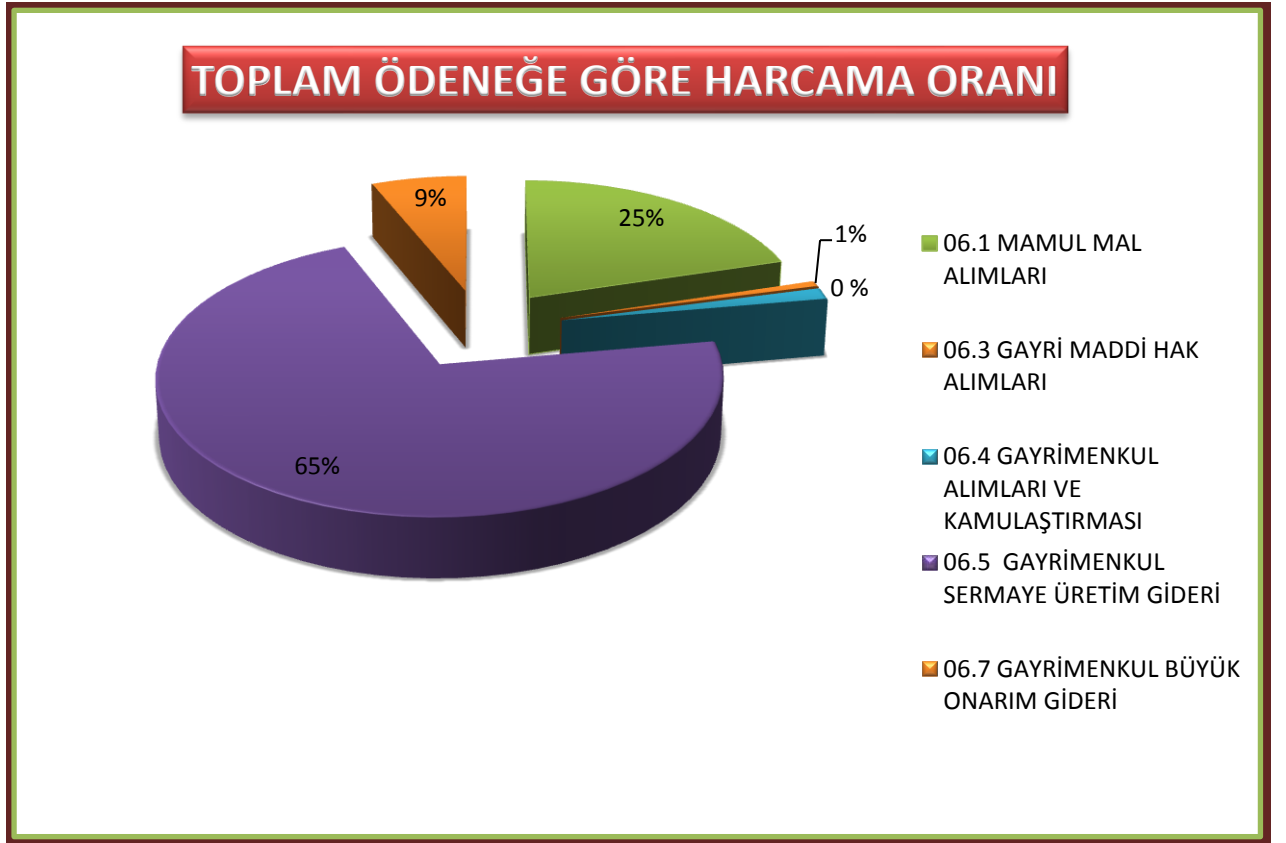

2- 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2014H030270 Proje Adı: Muhtelif İşler

2018 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 8.398.000.TL'dir. 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/5 maddesi uyarınca 2.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yılsonu ödeneği 10.398.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 8.758.839.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Makine-Teçhizat Alımları

2018 yılında makine-teçhizat alımları için 5.148.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 2.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 7.148.000.TL olmuştur. Ödeneğin 7.125.983.TL'si harcanmış, 22.017.TL ödenek harcanamamıştır. Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI (KDV Dahil)
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	8.732,00
	Arşiv Dolap Sistemi	7 adet	21.684,78
	Arşiv Dolap Sistemi	13 adet	38.277,13
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	41.985,26
	Projeksiyon cihazı	1 adet	41.066,27
	Projeksiyon cihazı	5 adet	22.180,00
	Yazıcı	25 adet	47.522,20
	Tarayıcı	28 adet	73.717,28
	Bilgisayar	128 adet	742.758,76
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	11.017,00
	Disk Tabanlı Yedekleme Sistemi	1 adet	162.604,00
	Optik Okuyucu	1 adet	51.920,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	28.585,50

Tıp Fakültesi			
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif		26.550,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet		22.783,68
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif		20.196,00
Büro Mefruşatı Alımı	20 adet		12.647,71
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif		27.333,56
Yazıcı	3 adet		4.878,33
Bilgisayar	11 adet		48.562,36
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet		5.451,60
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	9 adet		523.140,02
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet		12.980,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet		114.460,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet		6.195,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet		7.009,20
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	34 adet		532.494,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	191 adet		433.585,10
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet		111.038,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet		6.844,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet		4.248,00
Mühendislik Fakültesi			
Laboratuvar Tezgahı ve Mefruşat Alımı	Muhtelif		26.148,80
Laboratuvar Tezgahı ve Mefruşat Alımı	Muhtelif		12.980,00
Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif		5.009,34
Bilgisayar	8 adet		47.091,28
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif		18.944,12
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet		1.115.100,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet		24.780,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	3 adet		111.864,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet		22.656,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet		241.487,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet		43.542,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	3 adet		21.712,00
Fen Edebiyat Fakültesi			
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif		15.292,80
Projeksiyon cihazı	3 adet		13.308,00
Tarayıcı	1 adet		2.632,76
Bilgisayar	3 adet		13.244,28
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif		12.373,87
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	3 adet		313.072,88
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi			
Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif		18.508,00
Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif		3.557,94

Projeksiyon cihazı	3 adet	13.308,00
Yazıcı	2 adet	3.252,22
Bilgisayar	2 adet	10.301,17
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	42.480,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	17.582,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	47.182,30
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	17.192,60
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	8.118,40
Projeksiyon cihazı	3 adet	13.308,00
Tarayıcı	4 adet	10.531,04
Bilgisayar	2 adet	8.829,52
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	16.588,49
Merkezi Araştırma Laboratuvarı		
Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	22.462,15
Bilgisayar	1 adet	5.886,41
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	45.902,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	17.139,50
İletişim Fakültesi		
Projeksiyon cihazı	3 adet	13.308,00
Bilgisayar	3 adet	13.244,28
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	5.000,25
Mimarlık Fakültesi		
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	7 adet	35.164,00
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	4.366,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü		
Yazıcı	1 adet	1.626,11
Bilgisayar	1 adet	4.414,76
Eğitim Bilimleri Enstitüsü		
Bilgisayar	2 adet	11.772,82
Fen Bilimleri Enstitüsü		
Projeksiyon cihazı	1 adet	4.436,00
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	5.110,80
Sosyal Bilimler Enstitüsü		
Büro Mefruşatı Alımı	20 adet	2.592,00
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu		
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	21.600,00
Projeksiyon cihazı	4 adet	17.744,00
Bilgisayar	5 adet	22.073,80
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	18.696,20
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	1.463,20
Bor Meslek Yüksekokulu		

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2018

Tarayıcı	1 adet	2.632,76
Bilgisayar	3 adet	17.659,23
Güzel Sanatlar Fakültesi		
Bilgisayar	2 adet	11.772,82
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	15.461,51
Eğitim Fakültesi		
Projeksiyon cihazı	2 adet	8.872,00
Bilgisayar	4 adet	23.545,64
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	5.036,45
İslami İlimler Fakültesi		
Büro Mefruşatı Alımı	60 adet	14.160,00
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	31.211,00
Perde alımı	1744 m2	79.239,36
Amfi Sıra Alımı	Muhtelif	340.790,70
Amfi Sıra Alımı	Muhtelif	115.533,01
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	159.925,50
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	116.237,73
Bilgisayar	33 adet	145.687,08
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		
Projeksiyon cihazı	3 adet	13.308,00
Bilgisayar	3 adet	17.659,23
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	8.652,83
Yabancı Diller Yüksekokulu		
Bilgisayar	2 adet	11.772,82
Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu		
Projeksiyon cihazı	3 adet	13.308,00
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	11.405,54
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	4 adet	8.722,56
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	5 adet	16.154,20
Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		
Projeksiyon cihazı	2 adet	8.872,00
Bilgisayar	4 adet	17.659,04
Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	17.611,58
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	5 adet	110.490,48
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	3.607,20
Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	566,40
GENEL TOPLAM		7.125.983,00

Yazılım Alımları

2018 yılında yazılım alımları için 250.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 29,731.TL'si harcanmış, 220.269.TL ödenek harcanamamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV dahil)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	dbForge Studio for SQL Server Standard Renewall Yazılımı Alımı(4 adet)	5.664,00
	dbForge Studio for SQL Server Standard to Professional Edition Upgrade Yazılımı Alımı(4 adet)	
	Antivirüs Programı Alımı(2.000 kullanıcı, 3 Yıllık)	14.627,28
	Logsign Focus Lisans Alımı (1 yıllık)	9.440,00
GENEL TOPLAM		29.731,28

Kamulaştırma

7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000. TL ödenek tahsis edilmiş olup herhangi bir kamulaştırma yapılmadığından ödenek harcanamamıştır.

Büyük Onarım

2018 yılında büyük onarımlar için 3.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, Ödeneğin 1.603.125.TL'si harcanmış, 1.396.874.TL ödenek harcanamamıştır.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir;

TARİHİ BİNA RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ: 2016 yılı içerisinde ihalesi yapılan 17-18-21 nolu parsellerdeki restorasyon işleri tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır



Büyük Onarım Kapsamında Yapılan Diğer İşler

HARCAMANIN ADI	TUTARI
Kabin binaları bakımsız akü redresör grubu alım işi	21.334,40
Ulukışla Meslek Yüksekokulu güvenlik kamerası sistemleri bakım onarım işi	22.644,20
Niğde İli Cullaz Sok. 17-18 Parsellerde Bulunan Üniversiteye ait tarihi evlerin restorasyon yapım işi 6 nolu hakediş ödemesi	747.306,56
Tıp Fakültesi laboratuvarının zemin döşeme yapım işi	6.754,32
Rektörlük ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi asansör bakım ve onarım işi	6.307,10
Rektörlük ve bağlı birimlerde yapılan çatı tadilat onarım işi	11.387,00
Rektörlük ve bağlı Birimlerin sıhhi tesisat bakım ve onarım işi	15.036,15
Öğrenci çalışma salonu yapım işi	11.211,48
Eğitim Fakültesi derslik laminant parke kaplama işi	4.354,20
BESYO ve Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu otomatik kapı motoru alım işi	10.728,56
Rektörlük ve bağlı Birimlerin ısıtma sistemleri bakım ve onarım işi	12.702,70
Eğitim Fakültesi A1 Blok çatı tadilat yapım işi	25.807,78
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi merdiven bakımları ve koridorla led aydınlatma yapım işi	25.170,58
Kabin (K.Ö.K.) binaları bakım ve onarım işi	22.420,00
Rektörlük ve bağlı Birimlere ilave güvenlik kamerası takımı ve görüntüleme ekipmanları bakım onarım işi.	22.207,60
Rektörlüğe bağlı Birimlere ilave güvenlik kamerası takımı ve bakım onarım işi	23.952,82
Rektörlük ve bağlı birimlerin elektrik motorları bakım ve onarım işi	25.139,90
Rektörlük ve bağlı birimlerin elektrik bakım ve onarım işi	26.256,77
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki boş alana mdf üzeri laminant kaplama işi	15.340,00
Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bilge Kağan Seminer Salonunun laminant parke yapım işi	1.646,10
Nakliye ve iş makinası kiralama işi	22.302,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci okuma salonuna PVC yer döşeme ve iskeletli alçıpen yapım işi	16.517,05
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans Laboratuvarı yapım işi	21.241,89
Eğitim Fakültesi (Eğitim Binası) asansörlerinin TSE eksiklikleri kapsamında mavi etiket alım işi	12.867,90
Rektörlük ve bağlı birimlerin elektrik motorları bakım ve onarım işi	24.592,38
Yemekhane binası arkasında bulunan pompa odasındaki kum filtrelerinin değiştirilmesi ve pompaların bakım ve onarımı işi	25.960,00
Muhtelif tadilat ve onarım yapım işi	19.765,11
Muhtelif bakım ve onarım işi	3.781,90
Asansör revizyon ve asansör halat değişim işi	22.467,20
Elektrik malzemesi alım işi	8.248,20
Kum filtresi otomasyon yapım işi	12.390,00

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2018

Elektrik motorlarının bakım ve onarım işi	24.673,80
Rektörlük ve bağlı birimlerin ısıtma sistemleri bakım ve onarım işi	5.829,20
Muhtelif bina bakım ve onarım işi	3.687,50
Rektörlük ve bağlı birimlerin klima sistemleri ve soğuk hava deposu bakım ve onarım işi	19.623,40
Eğitim Fakültesi (Dekanlık Binası) hidrolik asansörün TSE eksiklikleri kapsamında mavi etiket alım işi	7.080,00
Rektörlük ve bağlı birimlerde bulunan UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) bakım işi	4.720,00
Rektörlük ve bağlı birimler yangın algılama sistemleri bakım işi	23.600,00
Rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılan jeneratörlerin bakımında kullanılmak üzere malzeme alım işi	13.216,00
Elektrik tesisatları bakım ve onarım işleri	24.746,96
Mühendislik Fakültesi B Blok dış cephe boyası tadilat ve onarım işi	26.194,82
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tadilat ve onarım yapım işi	21.221,95
Rektörlük binası (C Blok) yangın algılama sistemleri değişim işi	26.255,00
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi binasında bulunan kesintisiz güç kaynağında kullanılmak üzere akü alım işi	15.859,20
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yangın algılama sistemlerinde kullanılmak üzere malzeme alım işi.	3.399,34
Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılan jeneratörlerin bakım onarım işi.	6.894,74
Muhtelif sıhhi tesisat bakım ve onarım işi	7.705,40
Fen Edebiyat Fakültesi yangın algılama sistemleri bakım ve onarım işi	21.529,10
Esnek yapılı altı açık kıvrıkcık paspas yapım işi	4.270,42
Rektörlük boya ve badana yapım işi	2.137,73
Bariyer arızası yapım işi	568,76
Kazan dairesi bakım ve onarım işi	22.756,30
Merkez Yerleşke ve bağlı birimlerin mekanik tesisatları bakım ve onarım işi	9.475,40
Mühendislik Fakültesi E-blok asansör (158610865-1) bakım ve onarım işi	9.640,60
Merkez yerleşkedeki çevre aydınlatma arızalarının giderilmesi amacıyla iş makinesi kiralama işi	1.770,00
Rektörlük ve bağlı birimler güvenlik kamerası ve ekipmanları bakım onarım işi.	15.045,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi asansör halat değişim işi ve Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu asansör kapısı bakım ve onarım işi	8.071,20
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda kullanılmak üzere elektrik malzemesi alım işi.	1.358,18
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu (C-Salonu) jeneratör transfer panosu 400 A otomatik şalter alım işi	11.210,00
Rektörlük Binası, Fen Edebiyat Fakültesi, BESYO ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kazan bakım ve onarım işi	2.714,00
İslami İlimler Fakültesine bayrak - flama direkleri yapım işi	10.030,00
GENEL TOPLAM	1.603.125,85

Proje No: 2018H035470 Proje Adı: Yayın Alımı

2018 yılında yayın alımları için 1.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 999.988,91.TL'si harcanmıştır. 2018 yılı içerisinde aboneliği yenilenenler ve Ulakbim EKUAL projesi kapsamında serbest olarak sağlanan veri tabanları ile birlikte toplam 64 adet veri tabanına aboneliğimiz devam etmektedir. Yine 2018 yılı içerisinde kütüphanemize 996 adet Türkçe ve Yabancı basılı kitap satın alınmış, bağış olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar tarafından gönderilen 882 kitap ile birlikte toplam 1.878 adet yayının veri girişi yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 2018 yılı içerisinde 354.168 e-kitaba, 30.822 e-dergiye ve 2.100.000 e-teze erişimimiz bulunmaktadır. Yayın alımı kapsamında yapılan harcamalar aşağıda listelenmiştir.

Harcamanın Adı	Tutar (TL)
Clinicalkey	61.113,27
UpToDate	28.781,43
IOP	34.774,65
Oxford Journals	21.754,31
MatSciNet	12.469,95
Ebsco E-Books AC.	29.577,05
EDS	27.030,20
BioOne	10.405,79
ACS	44.535,70
APS	19.999,97
ASTM	44.145,07
RSC Journals	56.533,38
Pnas	5.733,90
Cambridge Journals	26.820,22
AIP	30.140,37
ASCE	42.330,95
SAGE	53.469,24
ProQuest Agr.&Envi.	10.967,35
ProQuest E-Book Central	21.418,08
World E-Book Library	41.613,15
ProQuest Cetral	102.527,44
ECS	12.521,72
Education Source	43.432,22
Springer E-Books	60.663,33
CAB	18.884,45
Ebsco GOBI E-Books	10.625,22
Hiperkitap Online	53.819,06
Hukuk Türk	1.722,00
MyNet Vidobu	10.287,66
Türkçe Basılı Kitap	24.294,61
Sobiad	8.250,00
İdeal Online	14.500,00
Türkçe Basılı Kitap	14.847,17
TOPLAM	999.988,91

Proje No:2010 K121260 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2018 yılı bütçe ödeneği 2.000.000.TL olup ödeneğin tamamı “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba aktarılmıştır. Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

HARCAMANIN ADI	TUTARI
Güneş Simülatör Sistemi	595.964,90
SaO ₂ Wafer	7.979,16
Elektrolüminesans ve Fotolüminesans Sistemi	470.820,00
Paslanmaz Çelik Diyaframlı NM ₃ Regülatörü	3.603,72
Yüksek Saflıkta Azot	2.820,20
Vakum Pompası Giriş Filtresi, Vakum Pompası Çıkış Filtresi	5.248,64
Laboratuvar Malzemesi	19.549,65
Sp8+AP1770556 Yıllık Bakım, GA18 AP 1467776 Yıllık Bakım, PD50+1” 8102 2601 33 Hat Filtresi	11.734,94
Laboratuvar Malzemesi	55.861,64
AK100 Heteroeklem Güneş Hücresi Sistemi için bakım onarım	332.332,80
TOPLAM	1.505.915,65

Proje No: 2018H035460 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2018H035460								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2018-2018								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje ve Müşavirlik								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2017 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2018	100			100		100		0	0
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

2018 yılı ödeneği 100.000.TL olup, Üniversitemiz İhtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal, kültürel ve fiziki mekanların proje hizmetleri amacıyla tahsis edilmiş ancak kullanılamamıştır.

Proje No: 1994H032370 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR		EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN;									
ADI		DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI							
NUMARASI		1994H032370							
YERİ		NİĞDE							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		1994-2020							
KARAKTERİSTİĞİ		Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası 6.500 m2+ İİBF Binası 9.000 m2 + Morfoloji Binası 17.500 m2+ Süheyla-Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi 1.150 m2							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2017 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI	Revize								
1994	62.374	16.124		14.000		38.423		32.772	76

(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası İnşaatı, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı ve Süheyla-Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi (Şartlı Bağış) İnşaatı devam etmektedir. 2018 yılında 16.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 20.423.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 2.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu ödenek toplamı 38.423.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 32.771.669. TL.' si harcanmış olup, 5.651.330.TL ödenek harcanmamıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Canber Müh.İnş.Tic.A.Ş.	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Seler Taah. Yapı İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	11.276.169,71 TL	11.869.362,40 TL
5-İHALE BEDELİ	8.833.000,00TL	11.452.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	06.04.2017	04.10.2017
7- MUKAVELE TARİHİ	15.05.2017	10.11.2017
8-YER TESLİM TARİHİ	17.05.2017	14.11.2017
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 05.05.2017	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 01.11.2018
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	17.05.2017	14.11.2017
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	13.09.2019	14.10.2019
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06	% 0,06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM	---	-

TARİHİ		
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	---	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	8.833.000,00TL	11.452.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	6.500 m2	9.000 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 30	%99
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.	Devam ediyor.

TÜRK MUSİKİSİ VE KONSERVATUVAR BİNASI İNŞAATI

2018 yılı ödeneği 5.750.000.TL olup, ödeneğin 1.835.701.TL'si harcanmıştır. 2018 yılı içerisinde A-B-D blokları betonarme karkas imalatları tamamlanmış, kaba inşaat çalışmaları devam etmektedir. C-E blok su basman seviyesinde olup betonarme karkas imalatları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme % 30 olarak gerçekleşmiştir.



Konservatuvar binası inşaatı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EK DERSLİK İNŞAATI

2018 yılı ödeneği 3.000.000.TL olup, 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 11.238.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 2.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu ödenek toplamı 16.238.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 16.015.448.TL'si harcanmış olup, 222.552.TL ödenek harcanmamıştır. Betonarme karkas ve kaba inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, ince imalatlar devam etmektedir. Bina tamamlanma aşamasında olup, sonlandırma imalatları devam etmektedir. Geçici Kabul çalışmaları başlamıştır. Fiziki gerçekleşme % 99 olarak gerçekleşmiştir.



*İİBF ek derslik
inşaatı*



TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI İNŞAATI

2018 yılı ödeneği 5.250.000.TL olup, 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 9.185.000.TL likit karşılığı ödenek kaydıyla yılsonu ödenek toplamı 14.435.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 13.370.117.TL'si harcanmış olup, ödeneğin 1.064.882.TL'si harcanmamıştır. Binamız 4 dilatasyondan oluşmaktadır. Tüm bölümlerin kaba inşaatı ve duvar imalatı tamamlanmıştır. Dil-1, Dil-2 kısmının ince imalatları % 90 seviyesindedir. Dil-3, Dil-4 sıva imalatları ile elektrik ve makina tesisat imalatları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme % 50 olarak gerçekleşmiştir.

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı b) Arıkan İnş. & Ak-Koç İnş. İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Tıp Fakültesi Morfoloji Derslik Binası 1. Etap İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	27.029.496,37 TL
5-İHALE BEDELİ	21.365.000,00TL
6- İHALE TARİHİ	28.07.2017
7- MUKAVELE TARİHİ	25.09.2017
8-YER TESLİM TARİHİ	27.09.2017
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 12.09.2017
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	27.09.2017
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	05.11.2019
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	---
15-SÖZLEŞME BEDELİ	21.365.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	17.500 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 50
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.



Tıp Fakültesi inşaatı



SÜHEYLA-HÜRREM KUBALI AİLE SAĞLIK MERKEZİ İNŞAATI(ŞARTLI BAĞIŞ)

05.02.2018 tarihinde Hayırsever Hürrem Kubalı ile Aile Sağlık Merkezi Şartlı Bağış Protokolü imzalanmış ve 2.000.000. TL hayırsever tarafından Üniversitemiz hesaplarına yatırılmıştır. Projenin hayata geçirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığında onay alınarak Yatırım Programımıza dahil edilmiştir. 25.960,00 TL' ye Mühendislik Uygulama projeleri hazırlanmış ve 31.07.2018 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. 05.09.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2018 yılı içerisinde 1.550.402,69 TL harcama yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 80'dir.

	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Seler Taah. Yapı İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Süheyla-Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi (Şartlı bağış)
4-YAKLAŞIK MALİYET	1.665.187,18 TL
5-İHALE BEDELİ	1.633.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	31.07.2018
7- MUKAVELE TARİHİ	05.09.2018
8-YER TESLİM TARİHİ	05.09.2018
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 28.08.2018
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	05.09.2018
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	01.07.2019
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	---
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	---
15-SÖZLEŞME BEDELİ	1.633.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	1.150 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 80
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.



Süheyla-Hürrem Kubalı Aile Sağlık Merkezi inşaatı



Proje No: 1994H032350 Proje Adı: Kampüs Altyapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	KAMPÜS ALTYAPI 5. KISIM İNŞAATI								
NUMARASI	1994H032350								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2020								
KARAKTERİSTİĞİ	BESYO, Bor, Derbent, Aşağı kayabaşı ve Merkez Yerleşkede Mevcut Yol Yapımı, Alanda Peyzaj ve Çevre düzenleme, İlave içme suyu, Kanalizasyon ve Otopark.								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2017 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
1994	15.900	4.300		4.500				2.526	20
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Bşk. b) MVC İnşaat Taahhüt Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	BESYO, Bor, Derbent, Aşağı kayabaşı ve Merkez Yerleşkede Altyapı
4-YAKLAŞIK MALİYET	12.711.603,71 TL
5-İHALE BEDELİ	10.331.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	02.05.2018
7- MUKAVELE TARİHİ	12.06.2018
8-YER TESLİM TARİHİ	19.06.2018
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 05.06.2018
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.06.2018
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	26.08.2020
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	
16- TOPLAM KAPALI ALANI	
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 20
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.

KAMPÜS ALTYAPI TESİSİLERİ 5. KISIM İŞLERİ

2018 yılı ödeneği 4.500.000.TL olup, ödeneğin 2.526.029.TL.'si harcanmış olup 1.973.970.TL'si harcanamamıştır.

Proje kapsamında; Besyo, Bor, Aşağı Kayabaşı ve Merkez Yerleşkemizde ihtiyaç olan mevcut yolların yapılması, alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi, ilave içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark yapılacaktır. 02.05.2018 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 12.06.2018 tarihinde sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanmıştır.

Merkez Yerleşkede İletişim Fakültesi yapı peyzaj imalatları devam etmektedir. Bor Yerleşkesi araç yolu ve peyzaj imalatları devam etmektedir. BESYO yerleşkesinde yol kazısı (tesviye vb.) başlamıştır. Yağmur suyu imalatları % 80 tamamlanmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 20'dir.



Altyapı 5.kısım işleri



Proje No: 2014H050190 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	SPOR								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (KOP)								
NUMARASI	2014H050190								
YERİ	NİĞDE Merkez								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2014-2020								
KARAKTERİSTİĞİ	Spor Kompleksi (10.589 m2)								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2017 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2014	18.433	12.433		3.000		0,00		0,00	0
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı b) Müteahhit AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.& Şenel DOĞAN İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi.
4-YAKLAŞIK MALİYET	14.750.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	13.325.000,00 TL
6-İHALE TARİHİ	12.08.2016
7-SÖZLEŞME TARİHİ	08.09.2016
8-YER TESLİM TARİHİ	14.09.2016
9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	14.09.2016
10-İŞİN BİTİM TARİHİ	12.09.2017
11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	--
13-SÖZLEŞME ARTIŞI	--
14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	13.325.000,00 TL
15-TOPLAM ALANI	10.589 m2
16-FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
17-İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı

2018 yılı ödeneği 3.000.000.TL olup inşaat 2017 yılında tamamlandığından ödenek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Amfi ve Derslik İnşaatı işimize aktarılmıştır.

1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1 Proje Tamamlama Raporu

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK

- ✘ Ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,
- ✘ Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- ✘ Üniversitelerin eğitim-öğretim fiziki alanları kompleks bir yapıdadır. Büyük onarım çalışmalarında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde uygulamada sıkıntılar yaşanmakta olup, büyük onarım ihalelerinde “Teklif Birim Fiyat Sözleşmesinin” hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması,
- ✘ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzatmakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.
- ✘ Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2018

SEKTÖR ADI EĞİTİM

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	+ / - (14)	Harcama Toplam
1994H032350	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Niğde	15.900	4.300	4.500		2.526
1994H032370	Derslik ve Merkezi Birimler(KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Niğde	64.374 (2.000)	16.124	16.000	+22.423	32.771
2014H030270	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Niğde	52.082	29.164	8.398	+2.000	8.759
2014H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Niğde	18.164	12.433	3.000	-3.000	0
2018H035460	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Niğde	100		100		0
2018H035470	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Niğde	4.500		1.000		1.000
TOPLAM					157.120	62.021	32.998	21.423	45.056

**tabloda 2.TL' lik kamulaştırma ödeneği yoktur.*

**2.000.TL. lik şartlı bağış tabloda işlenmiştir.*

SEKTÖR ADI DKH

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	+ / - (14)	Harcama Toplam
2010K121260	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2020	Niğde	15.820	15.820	2.000		2.000
TOPLAM					15.820	15.820	2.000		2.000
