



**NİĞDE ÖMER
HALİSDEMİR
ÜNİVERSİTESİ**

**2022
YILI**

**YATIRIM
PROGRAMI
İZLEME ve
DEĞERLENDİRME
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

NİĞDE, Mart 2023

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	EK BÜTÇE	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME	KALAN ÖDENEK
HAZİNE	26.702.000	15.400.000	47.502.000	41.442.885	6.059.115
ÖZGELİR	0		0	0	0
NET FİNANSMAN	0		0	0	0
ŞARTLI BAĞIŞ	0		128.633	0	128.633
GENEL TOPLAM	26.702.000	15.400.000	47.630.633	41.442.885	6.187.748

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2022 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- ✘ Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- ✘ Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Kampüs Alt Yapı Tesislerinin 6.kısım ihalesinin yapılması,
- ✘ Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri yapım ihalesinin yapılması,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesinin yapılması,
- ✘ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımların alınması,
- ✘ Kütüphane Daire Başkanlığınca basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması,
- ✘ Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekanların proje hizmetlerinin yaptırılması,

Gerçekleşen;


- ✘ Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerin tadilat ve onarım işleri tamamlanmıştır.
- ✘ Dış Hekimliği Fakültesinin, eğitim-öğretim faaliyetleri ile klinik çalışmaları için gerekli olan tıbbi cihaz ve ekipmanlar alınmıştır.
- ✘ Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri yapım ihalesinin yapılmış ancak ihaleye teklif veren istekli olmadığından dolayı ihale iptal edilmiştir.
- ✘ Kampüs Alt Yapı Tesislerinin 6.kısım ihalesi fiyat artışları nedeniyle ödenek yetersiz kaldığından yapılamamıştır.
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesi yapılarak alımlar gerçekleşmiştir.
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımlar alınmıştır.
- ✘ Basılı ve elektronik yayınlar satın alınmıştır. Elektronik yayın veri tabanlarına abone olunarak Üniversitemizin bilgiye erişim kapasitesi artırılmıştır.

1.4 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2022 yılı yatırımlarıyla ilgili başlangıç ödeneği toplam 26.502.000.TL iken, 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 15.400.000.TL, 7344 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca 5.400.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneği ve 5018 sayılı kanunun 40. maddesi uyarınca sağlık merkezi yapılmak üzere 2019 yılında ödenek kaydedilen 449.597.TL şartlı bağıştan kalan 128.632,59.TL.nin eklenmesiyle yılsonu ödeneği 47.630.632,59.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 41.442.884.95 TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EK BÜTÇE	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	7.402.000,00	12.400.000,00	19.802.000,00	19.616.851,02	99,06
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	600,00	0,00	600.000,00	578.518,64	96,42
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.700.000,00	0,00	22.228.632,59	16.431.175,11	73,92
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	4.816.340,18	96,33
	GENEL TOPLAM	26.702.000,00	15.400.000,00	47.630.632,59	41.442.884,95	87,01

HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) *

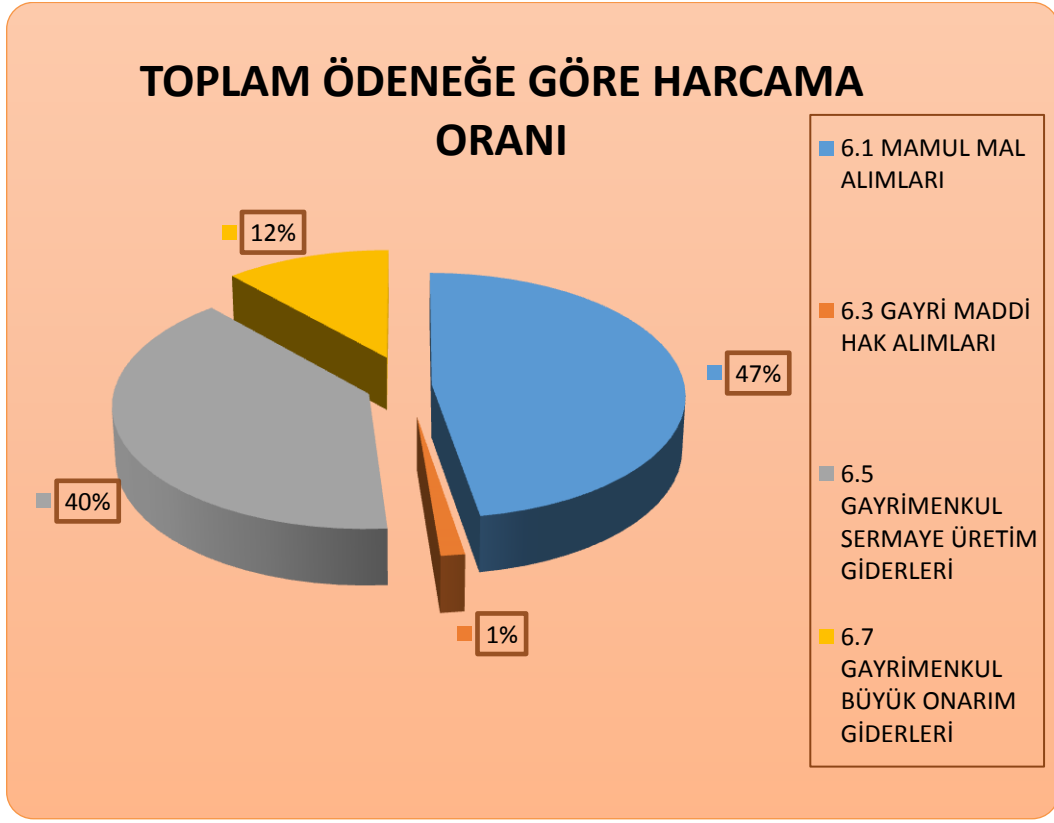

2- 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2022H03-187028 Proje Adı: Muhtelif İşler

2022 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 8.000.000.TL'dir. 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 6.400.000.TL ödeneğin eklenmesiyle yılsonu ödeneği 14.400.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 14.168.528.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Makine-Teçhizat Alımları

2022 yılında makine-teçhizat alımları için 5.400.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 3.400.000. TL. ödeneğin eklenmesiyle yılsonu ödeneği 8.800.000. TL olmuştur. Ödeneğin 8.773.669,37 TL'si harcanmış, 26.330,63.TL ödenek harcanamamıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Bilgisayar Alımı	10 adet	65.490,00
	Ağ Güvenlik Duvarı	1 adet	755.200,00
	Büro Mefruşatı Alımı	70 adet	133.134,41
	Büro İşyeri Makine Teçhizat Malzemeleri Alımı	6 adet	7.260,00
	Yazı Tahtası Alımı	5 adet	12.980,00
	Bilgisayar Alımı	43 adet	702.086,28
	Yazıcı Alımı	20 adet	80.227,49
	Tarayıcı Alımı	20 adet	172.632,11
	Projeksiyon Cihazı Alımı	20 adet	183.849,66
	Büro Mefruşatı Alımı	70 adet	148.004,17
	Büro İşyeri Makine Teçhizat Malzemeleri Alımı	38 adet	26.308,10
	Lazer Yazıcı	1 adet	13.892,69
	Kimlik Kart Baskı Makinesi	1 adet	52.038,00
	Bilişim Malzemeleri Alımı	12 adet	23.900,90
	Hızlı Geçiş Turnike Sistemi Alımı	1 adet	84.709,84
	Büro Mefruşatı Alımı	1 adet	1.770,00
	Makine Teçhizat Alımı	2 adet	27.953,02
	Kanal Tipi Klima Alımı	1 adet	50.740,00
	Televizyon Alımı	6 adet	39.964,12
	Telsiz ve Ekipman Alımı	6 adet	7.186,20
	Havuz Temizleme Robotu Alımı	1 adet	61.537,00
	Spor Salonu Turnike Sistemi	1 adet	24.485,00
	Çelik Raf Sistemi Alımı	20 adet	17.818,00
	Diğer Mal Alımları	4 adet	109.557,80
Tıp Fakültesi			

	Bilgisayar Alımı	30 adet	460.953,48
	Bilgisayar Alımı	40 adet	589.410,00
Diş Hekimliği Fakültesi			
	Hasta Simülasyon Sistemi Alımı	17 adet	1.228.919,39
	Renk Alma Cihazı Alımı	1 adet	38.880,00
	Fotoselli Kapı ve Bariyerli Otopark Kapısı Alımı	2 adet	46.020,00
	Fotokopi Makinası Alımı	1 adet	37.201,87
	Nokta Vuruşlu Yazıcı Alımı	2 adet	16.520,00
	Lazer Yazıcı Alımı	5 adet	44.250,00
	Cerrahi Aspiratör Cihazı	4 adet	32.133,11
	Fotoğraf Makinesi ve Ekipman Alımı	5 adet	72.500,00
	Kan Alma Koltuğu Alımı	1 adet	16.585,14
	Veri Depolama Sistemi Alımı	1 adet	16.830,76
	Klima Alımı	4 adet	51.465,70
	Tıbbi Atık Konteyneri Alımı	1 adet	103.415,20
Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi			
	Amfi Sıra ve Kürsü Alımı	30 adet	84.275,25
İslami İlimler Fakültesi			
	Amfi Sıra ve Kürsü Alımı	86 adet	321.713,16
Fen Edebiyat Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	3 adet	11.831,15
	Amfi Sıra ve Kürsü Alımı	22 adet	69.963,20
Eğitim Fakültesi			
	Geçiş Kontrol Terminali Alımı	1 adet	15.872,50
	Amfi Sıra ve Kürsü Alımı	90 adet	293.242,72
İletişim Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	50 adet	203.105,07
Spor Bilimleri Fakültesi			
	Büro İşyeri Makine Teçhizat Malzemeleri Alımı	10 adet	1.949,90
Güzel Sanatlar Fakültesi			
	Dikiş Makinesi,Overlok Makinesi ve Ütü Alımı	5 adet	84.682,70
	Şövale ve Tabure Alımı	80 adet	191.120,00
Mühendislik Fakültesi			
	Bilgisayar Masası Alımı	15 adet	17.544,60
	Bilgisayar Alımı	90 adet	1.146.439,45
	Bilgisayar Çalışma Koltuğu	60 adet	55.080,00

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Büro İşyeri Makine Teçhizat Malzemeleri Alımı	77 adet	15.014,45
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Büro İşyeri Makine Teçhizat Malzemeleri Alımı	50 adet	10.749,99
Yabancı Diller Yüksekokulu			
	Okul Sırası Alımı	60 adet	49.436,57
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi			
	Lazer Yazıcı	1 adet	13.892,68
Ulukışla Meslek Yüksekokulu			
	Kablosuz Ağ Erişim Sistemi	1 adet	6.726,00
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı			
	Büro Mefruşatı Alımı	36 adet	71.220,00
	Büro Mefruşatı Alımı	86 adet	128.985,19
	Büro Mefruşatı Alımı	139 adet	423.015,35
GENEL TOPLAM			8.773.669,37

Yazılım Alımları

2022 yılında yazılım alımları için 600.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 578.518,64.TL'si harcanmış, 21.481,36.TL ödenek harcanamamıştır.

Alımın Yapıldığı Birim	Alınan Yazılımlar	Tutarı (KDV Dahil)
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	Diş Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı	70.000,00
	Logsign Lisansı Hizmet Alımı	34.574,00
	Çevrimiçi Toplantı Lisansı Hizmet Alımı	24.544,00
	Wildcard SSL Sertifika Lisansı Hizmet Alımı	24.636,04
	Microsoft Yazılım Lisansı Hizmet Alımı (Açık İhale Usulü)	424.764,60
Genel Toplam		578.518,64

Büyük Onarım

2022 yılında büyük onarımlar için 2.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 3.000.000. TL. ödeneğin eklenmesiyle yılsonu ödeneği 5.000.000. TL olmuştur. Ödeneğin 4.816.340,18.TL'si harcanmış, 183.659,82.TL ödenek harcanamamıştır.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir;

ULUKIŞLA MESLEK YUKSEKOKULU KAZAN DAİRESİ ONARIM VE TADİLATI YAPIM İŞİ: 19.04.2022 tarihinde ihalesi yapılarak 09.05.2022 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 359.000,00 TL olup, 22.07.2022 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ VE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAZAN DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ: 05.07.2022 tarihinde ihalesi yapılarak 28.07.2022 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 1.546.000,00 TL olup, 26.09.2022 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



Büyük Onarım Kapsamında Yapılan İşler

HARCAMANIN ADI	TUTARI
1- Binaların bakım ve tamiratları için malzeme alım işi	22.678,04
2-Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi hizmet binası ups cihazına(kesintisiz güç kaynağı) akü alım işi.	50.976,00
3-Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi sahne aydınlatma ampulü alım işi.	21.953,90
4-Binaların bakım ve tamiratları için malzeme alım işi	2.585,17
5-Dış Hekimliği ve Konservatuvar çevresinde tesviye ve kazı çalışmaları için kullanılmak üzere iş makinesi kiralama işi	4.602,00
6-Rektörlük hizmet binası ups (kesintisiz güç kaynağı) yapım işi 1 nolu hakediş ödemesi	194.700,00
7-Dış Hekimliği Fakültesi klinik ünitler arası alüminyum-cam bölme yapım işi	76.989,10
8-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi binasında tadilat ve onarım yapım işi	17.700,00
9-Dış Hekimliği Fakültesi bakım onarım işi	60.590,88
10- Birimlerde yapılan alüminyum ve pvc doğrama yapım işi	57.820,00
11-Sabiha Şahenk Kütüphanesi periyodik asansör (01.07.2022-31.12.2022 dönemi) bakım işi.	2.761,20
12-Niğde İli Cullaz Sok. 9 Ve 25 parsellerde bulunan Üniversitemize ait tarihi evlerin restorasyon yapım işi ikmal inşaatı 6 nolu hakediş ödemesi	127.648,86
13-Ulukışla Meslek Yüksekokulu kazan dairesi onarım ve tadilatı yapım işi 1 (kesin) hakediş ödemesi	423.620,00
14-Fen Edebiyat Fakültesi ve Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi kazan değişimi yapım işi 1 nolu hakediş ödemesi	1.442.193,65
15-Fen Edebiyat Fakültesi ve Zübeyde Hanım Sağlık Bilimler Fakültesi kazan değişimi 2 nolu kesin hakediş ödemesi	320.493,17
16-Deney hayvanları laboratuvarı havalandırma tesisatı bakım onarım işi	13.570,00
17-Spor Bilimleri Fakültesi jeneratör grubu bakım ve onarım işi.	18.644,00
18-Rektörlük ve bağlı birimler fotoselli kapı bakım ve onarım işi.	3.186,12
19- Fakültelerde yer ve duvar seramiklerinin tadilat ve onarım yapım işi	12.507,29
20-Eğitim Fakültesi engelli rampası ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına yapılan çeşitli demir işleri yapım işi	22.547,44
21- İletişim Fakültesi binasında kırılan camların değişim ve onarım işi	10.915,15
22-Rektörlük ve Bağlı Birimler yangın algılama sistemleri bakım onarım işi.	43.612,80
23-Rektörlük ve Bağlı Birimler güvenlik kamera sistemleri bakım onarım işi.	10.985,80
24-Ulukışla Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Merkezi Yemekhane binası kazan daireleri onarım ve tadilatı ile Fen Edebiyat Fakültesi tuvaletlerin onarım ve tadilat işi.	34.751,00
25-Rektörlük ve Bağlı Birimler otomatik kapı bakım onarım işi.	3.327,60
26-Eğitim Fakültesi ve Rektörlük Hizmet binası klima santrallerinin onarımı ve dolmuş son durağı merkezindeki klimanın yenilenmesi işi.	27.883,40

27-Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının sundurması, garaj binasına ait sekiyonel kapı üzeri koruma imalatı ve Spor Bilimleri Fakültesi çim saha koltuklarının tadilat ve onarım işi.	14.547,04
28-İletişim Fakültesi binasında yapılan tadilat ve onarım işleri	82.128,00
29-İletişim Fakültesi duvar tipi yoğunmalı kazan alımı ve montajı işi.	42.503,60
30-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi hizmet binası 04/01/2022-31/03/2022 dönemi asansör periyodik bakım işi.	9.345,60
31-Merkez yerleşke çevre aydınlatma direği onarım işi.	9.817,60
32-Rektörlük ve Bağlı Birimler kazan, klima, fan ve sirkülasyon pompaları bakım onarım işi.	41.300,00
33- Birimlerde Yapılan Çatı Tadilat Onarım İşi.	23.600,00
34-Rektörlük ve bağlı birimler elektrik bakım onarım işi.	42.686,50
35-Rektörlük ve Bağlı Birimlere Ait Mekanik Tesizat Bakım Onarımı İş	41.854,60
36-Dış Hekimliği Fakültesi klinik ünitler arası alüminyum - cam bölme yapılması işi ve tıp fakültesi kompozit yapım işi	41.005,07
37-Merkez Yerleşke elektrik kompanzasyon tesisleri bakım ve onarım işi.	43.300,10
38-Rektörlük ve Bağlı Birimler otomatik kapı bakım onarım işi	6.608,00
39-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım ödemesi (01/04/2022-30/06/2022)	9.345,60
40-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı hizmet binası asansör periyodik (03/01/2022-30/06/2022) bakım işi.	2.761,20
41-Rektörlük hizmet binası asansör periyodik bakım işi.	3.681,60
42-Rektörlük Konutu ve Üniversitemize bağlı birimlere ait mekanik tesizat bakım onarımı işi	38.326,40
43-Bahar şenlikleri organizasyonu kapsamında yapılan tadilat ve onarım işi	33.146,79
44-Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi uhdesinde bulunan Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu'na ait atölyeye kapı yapılması işi	10.006,40
45-Kültür ve Kongre Merkezi Tadilat ve Onarım Yapım İş	42.480,00
46-Spor Bilimleri Fakültesi hizmet binası güvenlik kamera sistemleri yapım işi.	49.816,06
47-Muhtelif Birimler (Mühendislik Fakültesi, İktisat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi) çatı tadilatı ve onarımı	47.577,60
48-Rektörlük Mobese ve bağlı birimler güvenlik kamera sistemleri bakım onarım işi	25.464,40
49-İletişim Fakültesi alüminyum doğrama yapım işi	50.740,77
50-Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvar ve yemekhane binası tadilat yapım işi	83.778,99
51-Rektörlük ve bağlı birimler elektrik bakım onarım işi.	84.967,08
52-Birimlerde yapılan çatı tadilat ve onarım yapım işi	47.205,90
53-Rektörlük ve bağlı birimler otomatik kapı bakım onarım işi	9.900,20
54-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yüzme havuzu kompleksi çatı tadilat ve onarım yapım işleri	76.696,64
55-Spor Bilimleri Fakültesi tadilat ve onarım yapım işi	59.060,76
56-Rektörlük Binası kazan onarım ve tadilat işi	2.360,00

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2022

57-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi hizmet binası (01/07/2022-30/09/2022) dönemi asansör periyodik bakım işi.	9.345,60
58-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi hizmet binası yangın algılama sistemleri periyodik(ilk altı aylık dönem) bakım işi.	2.950,00
59-Muhtelif binaların ve yeşil alanların sulama sistemlerine ait pompa ve hidroforların bakım ve onarım işi	77.773,80
60- Birimlerde yapılan çatı tadilat ve onarım işleri	56.050,00
61-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Araştırma ve Uygulama bahçesinde bulunan tam otomasyonlu sera (1000 m2) ile polikarbonlu tül seranın (120 m2) bakım ve onarım işi	82.836,00
62- Birimlerde yapılan tadilat ve onarım yapım işi	70.806,49
63-Tarım Bilimleri Fakültesine ait bitki büyütme kabininin bakım ve onarımı yapım işi	18.366,70
64-Rektörlük ve bağlı birimler elektrik bakım onarım işi	70.800,00
65-Rektörlük ve bağlı birimler asansör bakım onarım işi	67.260,00
66-Rektörlük ve bağlı birimler güvenlik kamera sistemleri bakım onarım işi	22.887,28
67-Muhtelif binaların ısıtma sistemi, sıhhi tesisat ve havalandırma tesisatı onarım ve tadilat işi	48.363,48
68-İletişim Fakültesi asansör periyodik muayene ücreti (08/11/2022 tarih ve AB492581 sayılı fatura)	1.103,30
69-Fen-Edebiyat Fakültesi asansör periyodik (nisan-aralık dönemi) bakım ücreti	3.610,80
70-Mimarlık Fakültesi asansör bakım onarım ve periyodik(2022 ocak-aralık dönemi)bakım ücreti	8.038,16
71-Rektörlük ve bağlı birimler otomatik kapı bakım onarım işi	18.101,20
72-Eğitim Fakültesi asansör periyodik (ocak-aralık dönemi) bakım ücreti	11.044,80
73-Dış Hekimliği Fakültesi asansör periyodik (ocak-aralık dönemi) bakım ücreti	1.840,80
74-Spor Bilimleri Fakültesi kontest muayene ve belgelendirme hizm.ltd.şti asansör periyodik muayene ücreti (01/12/2022 tarih ve ktt2022000009346 sayılı fatura)	501,50
75-Mühendislik Fakültesi asansör periyodik (temmuz-aralık dönemi) bakım işi	5.522,40
76-Rektörlük hizmet binası asansör periyodik (temmuz-aralık dönemi) bakım işi	3.681,60
77- Rektörlük binası çatı ve yağmur iniş boruları yapım işleri	4.165,40
78-Ulukişla Meslek Yüksekokulu hizmet binası tse eksikleri kapsamında asansör mavi etiket alım işi.	14.938,80
79-Rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılan jeneratör gruplarının bakım ve onarım işi.	82.847,80
80-Kesintisiz güç kaynakları bakım ve onarım işi.	18.903,60
81-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik muayene ücreti (19/12/2022 tarih ve arv2022000033764 sayılı fatura)	9.345,60
GENEL TOPLAM	4.816.340,18

Proje No: 2022H03-187034 Proje Adı: Yayın Alımı

2022 yılında yayın alımları için 2.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 1.997.295,61.TL'si harcanmış 2.704,39.TL ödenek harcanmamıştır. 2022 yılı içerisinde aboneliği yenilenenler ve Ulakbim EKUAL projesi kapsamında serbest olarak sağlanan veri tabanları ile birlikte toplam 52 adet veri tabanına aboneliğimiz devam etmektedir. Yine 2022 yılı içerisinde Kütüphanemize 218 adet Türkçe ve Yabancı basılı kitap satın alınmış, bağış olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar tarafından gönderilen 379 kitap ile birlikte toplam 597 adet yayının veri girişi yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 2022 yılı içerisinde 286.803 e-kitaba, 30.264 e-dergiye ve 2.700.000 e-teze erişimimiz bulunmaktadır.

Yayın alımı kapsamında yapılan harcamalar aşağıda listelenmiştir.

HARCAMANIN ADI	TARİH	TUTAR (TL) KDV DAHİL
Yaklaşım e-dergi	10.02.2022	660,00
Vergi Sorunları e-dergi	10.02.2022	600,00
Vergi Dünyası e-dergi	10.02.2022	784,00
Vetis	10.02.2022	67.260,00
Ebsco	09.03.2022	87.699,37
Hukuktürk	17.03.2022	4.295,20
Sobiad	17.03.2022	13.551,00
İdealonline Sür.Yay.ve Tıp	06.04.2022	44.065,73
Elsevier	11.05.2022	290.968,12
Proquest	08.06.2022	90.409,50
Lehçediz	14.06.2022	5.900,00
Nat.Acd.Sci.	21.06.2022	36.678,75
Sage	04.07.2022	235.984,51
Iop	10.08.2022	175.912,41
Rove Yayıncılık	20.09.2022	69.163,92
Ebsco	13.10.2022	276.080,24
Proquest	03.11.2022	371.967,86
Göktuğ Yayıncılık	05.12.2022	71.123,00
Vetis (2023)	16.12.2022	129.800,00
Sobiad(2023)	16.12.2022	24.392,00
TOPLAM		1.997.295,61

Proje No:2010K12-1315-39036 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2022 yılı bütçe ödeneği 2.000.TL olup, Ödeneğin tamamı “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba aktarılmıştır.

Proje No: 2022I00-188366 Proje Adı: Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi

7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 9.000.000.TL ödenek eklenmiş olup, ödeneğin 8.843.886,04.TL. si harcanmış olup 156.113,96.TL. ödenek harcanmamıştır.

Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesi kapsamında yapılan harcamalar aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
Dış Hekimliği Fakültesi			
	Hasta Simülasyon Sistemi Alımı	29 adet	2.257.140,11
	Cerrahi Piyasemen Alımı	6 adet	71.280,00
	Elektrokoter Cihazı Alımı	1 adet	26.769,20
	Santrifüj Alımı	1 adet	83.573,50
	Yük Raf Modül Sistemi Alımı	6 adet	74.606,92
	Barkod-Etiket Yazıcı Alımı	6 adet	19.175,12
	Barkod Okuyucu	6 adet	19.956,33
	Piezo Cerrahi Ultrasonik Cerrahi Cihaz (Led Işıklı)	1 adet	113.400,00
	Hava Su Tabancası	2 adet	9.440,00
	Workstation Çalışma Masası (Sterilizasyon İçin)	1 adet	28.320,00
	Amalgamatör (Otomatik Kapsül Amalgam Karıştırıcı)	1 adet	2.436,48
	Işıklı Baz Plak Polimerizasyon Cihazı	1 adet	2.662,08
	Vitalometre	2 adet	21.928,32
	Çalışma Masası Dolaplı (Sterilizasyon İçin)	1 adet	10.856,00
	İki Evyeli Malzeme Kabul ve Ön Yıkama Bankosu	1 adet	25.606,00
	Kirli Malzeme Taşıma Arabası (Kapalı)	1 adet	11.387,00
	Paslanmaz Altı Açık Alçı Tezgahı (200 Cmx60 Cm)	5 adet	53.100,00
	Paslanmaz Altı Açık Alçı Tezgahı (150 Cmx60 Cm)	2 adet	17.346,00
	Paslanmaz Çift Lavabolu Atık ve Alçı Tanklı Dolap	2 adet	56.168,00

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2022

	Paslanmaz Çöp Arabalı Pres Masası (200 Cmx60 Cm)	2 adet	32.992,80
	Paslanmaz Vibratör Cihazı Tezgahı (100 Cmx60 Cm)	3 adet	19.045,20
	Steril Malzeme Taşıma Arabası	1 adet	11.387,00
	Raf Sistemleri (Sterilizasyon için)	1 adet	8.496,00
	Poşet Kapatma Cihazı	1 adet	63.938,30
	Ağız Cerrahisi ve İmplantoloji Mikromotoru (Led Işıklı)	1 adet	58.860,00
	Üç Boyutlu Diş-Çene-Yüz Görüntüleme Cihazı	1 adet	3.483.000,00
	Apeks Bulucu	4 adet	18.489,60
	Döner Alet Motoru	4 adet	55.296,00
	Guta Kesici	3 adet	19.699,20
	Işık Cihazı	1 adet	3.996,00
	İrrigasyon Cihazı	1 adet	847,80
	Loop	1 adet	20.514,30
	Sonic İrrigasyon Aktivasyonu Kavatron Cihazı	1 adet	6.750,00
	Akril Tepim Ünitesi 120'lik	2 adet	46.020,00
	Alçı Kesme Cihazı	4 adet	37.760,00
	Eğitmen Masası için PC Dolabı ve Kapalı Devre Görüntü Ses Sis.	1 adet	112.100,00
	Fantom Eğitmen Üniti Ses Görüntü Sistemi	1 adet	82.010,00
	Mekanik Pres	20 adet	25.960,00
	Mufla Kaynatma Ünitesi	2 adet	17.700,00
	Mum Eritme Ünitesi	2 adet	69.620,00
	Özel İmalat Preklinik Masası	8 adet	165.200,00
	Paslanmaz Çöp Arabalı Pres Masası	2 adet	17.700,00
	Paslanmaz Davlumbaz Sistemi	1 adet	13.570,00
	Paslanmaz Mufla Kaynatma Cihazı Tezgahı	1 adet	2.950,00
	Vakumlu Cila Masası	2 adet	21.240,00
	Vibratör	4 adet	17.700,00
	Cerrahi Piyasemen	15 adet	132.354,00
	Fizyodispenser	3 adet	182.412,00
	Transport Ünit	1 adet	359.640,00
	Operasyon Mikroskopu	1 adet	630.720,00
	Sıcak Dolum Cihazı	1 adet	77.509,44
	Sub ve Supragingival Profilaksi Airflow Cih. ve Piezo Sistem	1 adet	123.258,24
TOPLAM			8.843.886,04

Proje No: 2022H03-187031 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR		EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN ADI		Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi							
NUMARASI		2022H03-187031							
YERİ		NİĞDE							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2022-2022							
KARAKTERİSTİĞİ		Etüt-Proje ve Müşavirlik							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2020 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2022	200	-		200		-		42	21
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

2022 yılı ödeneği 200.000.TL olup, kazan daireleri projelerinin hazırlanması işi için 42.480,00. TL harcanmış olup 157.520,00.TL ödenek harcanamamıştır.

Proje No: 1994H03-450 Proje Adı: Derslik ve Merkezi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR		EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN;									
ADI		DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI							
NUMARASI		1994H032370							
YERİ		NİĞDE							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		1994-2023							
KARAKTERİSTİĞİ		Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası 6.500 m2+Zübeyde Hanım Sağlık YO ve Sağlık Hizmetleri MYO 14.481 m2							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2020 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2022

PROGRAMA GİRİŞ YILI	Revize								
1994	78.900	18.000		12.000		16.400		16.389	100

(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası inşaatı devam etmekte olup Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu projesi için ihaleye çıkılması ve harcama yapılması için Strateji Bütçe Başkanlığından izin istenmiş olup izin onayı henüz verilmediğinden yapım ihalesine çıkılamamıştır. 2022 yılında 12.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7344 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca 5.400.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu ödeneği 17.400.000. TL olmuştur. ödeneğin 16.388.695,11. TL'si harcanmış olup, 11.304,89. TL ödenek harcanamamıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Konservatuvar Binası b) Müteahhit: Erdiñ YANIK - NG Ulaş İnşaat Müh. Hiz.San. ve Tiç.Ltd.Şti. İş Ortaklığı.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	13.922.436,12 TL
5-İHALE BEDELİ	10.440.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	13.05.2021
7- MUKAVELE TARİHİ	07.07.2021
8-YER TESLİM TARİHİ	10.07.2021
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.07.2021
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	09.06.2022
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	6.264,00 TL
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	
15-SÖZLEŞME BEDELİ	10.440.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	6.500 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
18- İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı.

Proje No: 1994H03-450-14455 Proje Adı: KONSERVATUVAR İNŞAATI

2022 yılı ödeneği 11.00.000,00 TL olup, 7344 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca 5.400.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu ödeneği 16.400.000.TL olmuştur. Bu ödeneğin 16.388.695,11.TL'si yıl içerisinde harcanmış olup 11.304,89.TL ödenek harcanamamıştır. 17.10.2022 tarihinde de geçici kabulü onaylanarak hizmete alınmıştır.



ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU ve SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU: Yatırım ödeneği 44.500.000 TL'dir. 2022 yılı ödeneği 1.000.000.TL. olup ödeneğin tamamı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine aktarılmıştır. Uygulama Projeleri ve yaklaşık maliyet hazırlanmış olup, söz konusu proje için ihaleye çıkılması ve harcama yapılması için Strateji Bütçe Başkanlığından izin istenmiştir. İzin onayı henüz verilmediğinden yapım ihalesine çıkılamamıştır.

Proje No: 2020H03-152567 Proje Adı: Kampüs Altyapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	KAMPÜS ALTYAPI								
NUMARASI	2020H03-152567-152568								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2023								
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, telefon hattı.								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2021 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
1994	11.500	6.500		3.000				-	0

(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.

ALTYAPI TESİSLERİ İŞLERİ

2022 yılı ödeneği 3.000.000.TL olup, inşaat maliyetlerindeki artıştan dolayı ödenek yetersizliğinden ihaleye çıkılamamıştır.

Proje No: 2021H05-168601 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	<u>Açık ve Kapalı Spor Tesisler (KOP)</u>								
NUMARASI	2021H05-168601								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2024								
KARAKTERİSTİĞİ	Kapalı Tenis Kortu (2 Adet), Spor Kompleksi, (2.650 m2)								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2020 HARCAMA A	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2021	17.380	-		1.000		3.500		-	-

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

2022 yılı ödeneği 1.500.000. TL. olup Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu projesinden 1.000.000.TL aktarma yapılarak yılsonu ödeneği 2.500.000.TL olmuştur.

Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri 2.650 m2: Yapım ihalesi yapılmış ancak ihaleye teklif veren istekli olmadığından dolayı ihale iptal edilmiştir.

Kapalı Tenis Kortu (2 Adet): Uygulama projeleri hazırlanmış olup, yapım ihalesine henüz çıkılamamıştır.

Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu 1.810 m2(Şartlı Bağış): Uygulama projeleri hazırlanmış olup, ödenek yetersizliğinden dolayı ihaleye çıkılamamıştır.

1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1 Proje Tamamlama Raporu

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK

- ✘ Ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,
- ✘ Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- ✘ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzamakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.
- ✘ Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması, yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama - Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2021 Kümülatif Harcama	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama
NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ					172.199.000	53.815.000	26.702.000	47.502.000	41.442.885
EĞİTİM					133.882.000	24.500.000	26.700.000	38.500.000	32.596.999
Yükseköğretim					107.002.000	24.500.000	25.200.000	36.000.000	32.596.999
1994H03-450	Derslik ve Merkezi Birimler	Niğde	Eğitim (20.981 m ²)	1994-2024	78.900.000	18.000.000	12.000.000	16.400.000	16.388.695
1994H03-450-14455	Konservatuvar	Niğde	Eğitim (6.500 m ²)	2020-2022	34.400.000	18.000.000	11.000.000	16.400.000	16.388.695
1994H03-450-168399	Zübeyde Hanım Sağlık YO ve Sağlık Hizmetleri MYO	Niğde	Eğitim (14.481 m ²)	2021-2024	44.500.000	0	1.000.000	0	0
2020H03-152567	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2023	11.500.000	6.500.000	3.000.000	3.000.000	0
2020H03-152567-152568	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2023	11.500.000	6.500.000	3.000.000	3.000.000	0
2022H03-187028	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-2 (1 adet)	2022-2022	14.402.000	0	8.000.000	14.400.000	14.168.528
2022H03-187028-187029	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-2 (1 adet)	2022-2022	14.402.000	0	8.000.000	14.400.000	0
2022H03-187031	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2022-2022	200.000	0	200.000	200.000	42.480
2022H03-187031-187032	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2022-2022	200.000	0	200.000	200.000	0
2022H03-187034	Yayın Alımı	Niğde	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2022-2022	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.997.296
Beden Eğitimi Ve Spor					26.880.000	0	1.500.000	2.500.000	0
2021H05-168601	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Niğde	Kapalı Tenis Kortu (2 adet), Spor Kompleksi (2.650 m ²), Spor Salonu (1.810 m ²)	2021-2024	26.880.000	0	1.500.000	2.500.000	0
2021H05-168601-168602	Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri	Niğde	Spor Kompleksi (2.650 m ²)	2021-2024	20.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0
2021H05-168601-168603	Kapalı Tenis Kortu	Niğde	Kapalı Tenis Kortu (2 adet)	2021-2024	2.750.000	0	500.000	500.000	0
2021H05-168601-175420	Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu	Niğde	Spor Salonu (1.810 m ²)	2021-2023	4.130.000	0	0	0	0
SAĞLIK					9.000.000	0	0	9.000.000	8.843.886
Sağlık					9.000.000	0	0	9.000.000	8.843.886
2022I00-188366	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Niğde	Makine-Teçhizat	2022-2022	9.000.000	0	-	9.000.000	8.843.886
DKH-SOSYAL					29.317.000	29.315.000	2.000	2.000	2.000
Teknolojik Araştırma					29.317.000	29.315.000	2.000	2.000	2.000
2010K12-1315	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Niğde	İnşaat (3.100 m ²), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2010-2022	29.317.000	29.315.000	2.000	2.000	2.000
2010K12-1315-39032	İnşaat	Niğde	İnşaat (3.100 m ²)	2010-2014	10.197.000	10.197.000	0	0	0
2010K12-1315-39036	Diğer	Niğde	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2010-2022	19.120.000	19.118.000	2.000	2.000	2.000
Genel Toplam					172.199.000	53.815.000	26.702.000	47.502.000	41.442.885

Not: Yatırım programında yer alan tüm projeler için kamulaştırma ödeneği hariç tutularak dış kredi, sermaye transferi, borç verme, döner sermaye, hibe, vb. diğer tüm ödeneklere dair harcama bilgileri listelenmektedir.
