




NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI

***YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve
DEĞERLENDİRME RAPORU***



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



NİĞDE, Mart 2016

1- GENEL DEĞERLENDİRME**1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları**

FINANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME
HAZİNE	28.000.000	31.000.000	21.789.525
ÖZGELİR	0,00	0,00	0,00
NET FİNANSMAN		14.586.000	10.214.891
TOPLAM	28.000.000	45.586.000	32.004.416

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi**1.3 2015 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme****Hedeflenen;**

- ✕ Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- ✕ Çarşı binası inşaatının tamamlanarak hizmete açılması,
- ✕ İİBF ek amfi bloğu inşaatının tamamlanarak hizmete açılması,
- ✕ Enstitü Binası inşaatının tamamlanarak hizmete açılması,
- ✕ Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.kısım inşaatının % 70 seviyesine getirilmesi,
- ✕ Eğitim Fakültesi 2.etap inşaatının ihalesinin yapılarak fiziki gerçekleşmesinin % 70 seviyesine getirilmesi,

- ✘ Mühendislik Fakültesi 4. etap ek bloklar inşaatı ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 10 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Açık ve kapalı spor tesisleri projesi kapsamında merkez yerleşke içerisinde Kapalı Spor Salonu inşaatının ihalesinin yapılarak % 10 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,

Gerçekleşen;

- ✘ Merkezi Araştırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıştır.
- ✘ Çarşı binası inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 85 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ İİBF ek amfi bloğu inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 85 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Enstitü Binası inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 85 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.kısım inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 57 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Eğitim Fakültesi 2.etap inşaatının ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 80 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Mühendislik Fakültesi 4. etap ek bloklar inşaatı ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 40 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Açık ve kapalı spor tesisleri projesi kapsamında merkez yerleşke içerisinde Kapalı Spor Salonu inşaatının ihalesi yapılarak % 10 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerin tadilat ve onarım işleri tamamlanmıştır.
- ✘ Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır.


1.4 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2015 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 28.000.000.TL iken, 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 8.533.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 3.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklemeye yapılarak, yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 45.586.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 32.004.416 TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.943.000	8.533.000	6.257.771	73%
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	160.000	160.000	153.950	96%
6.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	500.000	500.000	0	0%
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.100.000	33.096.000	23.547.407	71%
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.297.000	3.297.000	2.045.288	62%
	GENEL TOPLAM	28.000.000	45.586.000	32.004.416	70%

* HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) *

TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA ORANI

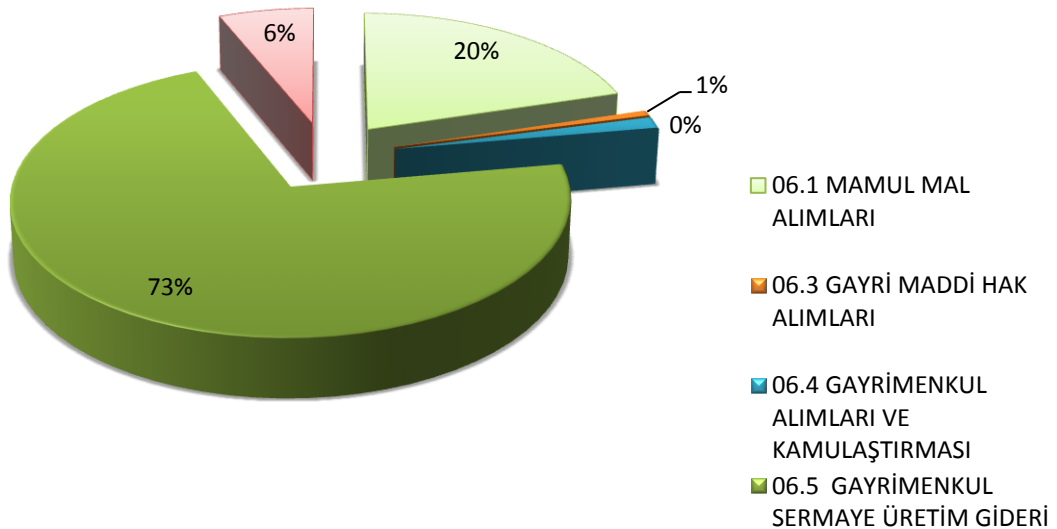

2- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2015HO31440 Muhtelif İşler

2015 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 5.000.000.TL'dir. 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/8 maddesi uyarınca 5.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği 10.000.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 6.467.057.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Makine-Teçhizat Alımları

2015 yılında makine teçhizat alımları için 2.543.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 4.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 6.543.000.TL olmuştur. Ödeneğin 4.267.818.TL'si harcanmış olup, 2.275.181.TL ödenek harcanmamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI (KDV dahil)
Rektörlük ve Bağlı Birimler	Baskı Makinesi ve Tamamlayıcı Üniteleri	1 adet	37.382,40
	Multikopter Kamera Seti	1 adet	6.915,33
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	19.352,00
	Kablosuz Ağ Sistemi	10 adet	22.066,00
	Veri Depolama Ünitesi	1 adet	157.648,00
	Bilgisayar ve Yan Donanım Malzemeleri	Muhtelif	85.076,82
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	29.529,50
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	70.717,40
	Projeksiyon Cihazı	25 adet	49.707,50
Fen-Edebiyat Fakültesi	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	3.304,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	3.658,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	10.974,00
Mühendislik Fakültesi	Fotokopi Makinesi	1 adet	4.944,20
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	345.504,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	83.072,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	325.892,40
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	65.254,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat	Muhtelif	25.572,96

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2015

Mimarlık Fakültesi	alımı		
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	2.112,20
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	80.712,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	16.520,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	63.419,10
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	7.732,54
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	7.080,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	25.222,50
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	81.302,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	105.397,20
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	20.201,60
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	22.405,84
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	139.570,40
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	12.956,40
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	649
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	221.545,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	2.714,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	27.429,10
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	495,6
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	8.850,36
Merkezi Araştırma Laboratuvarı			
	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	1 adet	1.203,60
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	105.837,74
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	19.824,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	241.900,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	1.178.053,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	41.890,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	121.776,00
Eğitim Fakültesi			
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	207.763,99
Ulukışla Meslek Yüksekokulu			
	Fotokopi Makinesi	1 adet	4.944,20
Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri			

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2015

Meslek Yüksekokulu	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	4.661,00
Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu	Fotokopi Makinesi	1 adet	4.944,20
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	15.434,40
Bor Meslek Yüksekokulu	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	442,5
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	22.148,60
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Baskı Makinesi	1 adet	16.225,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	2.649,10
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	12.095,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	3.445,60
GENEL TOPLAM			4.267.818,28

Yazılım Alımları

2015 yılında yazılım alımları için hazineden 160.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 153.950.TL'si harcanmış, 6.049.TL ödenek harcanmamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM	ALINAN MALZEMELER	TUTARI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Logsign Focus Lisans alımı	4.826,20
	Dxperience ASP.NET (4 adet), db Forge Studio for SQL Server (2 adet), WinRAR (9 adet), PL/SQL Developer (1 adet) Yazılım Lisansları alımı.	11.069,58
	Antivirüs Programı Alımı (2.000 kullanıcı)	8.000,00
	200 Kredilik Yazılım Lisansı alımı	716,26
	Microsoft Yazılım Lisansları alımı (600 Kullanıcı)	112.572,00
	Vmware Sanallaştırma Sistemi Veeam Yedekleme ve Replikasyon Yazılımı alımı (4 CPU'lu)	12.266,10
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Web Sitesi Yapımı Yazılımı alımı	4.500,00
GENEL TOPLAM		153.950,14



Kamulaştırma

2015 yılında kamulaştırma için hazineden 500.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödenek harcanmamıştır.

Büyük Onarım

2015 yılında büyük onarımlar için 2.297.000.TL hazineden ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 1.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 3.297.000.TL olmuştur. ödeneğin 2.045.288.TL'si harcanmıştır.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir;

BESYO YERLEŞKESİ; Kantin ve Yemekhane Binası Yapım İşinin 29.09.2015 tarihinde ihalesi yapılarak 1.050.000.TL anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış olup, 04.11.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 1.000 m2 kapalı alana sahiptir. 2015 yılı ödeneği 309.750.TL olup, 114.521.TL (KDV dahil) harcanmıştır. 2015 yılı içerisinde subasman imalatlarına kadar tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %10 seviyesindedir.

MERKEZ YERLEŞKE: Merkezi Laboratuvar Jeneratör ve 210 KV UPS yapım işi 09.11.2015 tarihinde ihalesi yapılarak 417.200. TL anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış olup, 04.12.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2015 yılı ödeneği 295.378. TL olup 266.89.TL (KDV dahil) harcanmıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulu Dış Cephe Kaplama Yapım İş 23.12.2015 tarihinde ihalesi yapılarak 573.000. TL anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış olup, 06.04.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2015 yılı ödeneği 692.503.TL.dir. Ödeneğin tamamı harcanmış olup 2015 yılında geçici kabulü yapılmıştır.



GÖNCÜ KONAĞI RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ: 17.03.2014 tarihinde ihalesi yapılarak birim fiyat usulü sözleşmesi imzalanarak restorasyon işleri yapılmış olup, geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır. 2015 yılında ödeneği 450.000. TL.dir. 290.502. TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.



HAZİNE TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZE TAHSİS EDİLEN BOR GEBERE MAHALLESİNDE TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA SAHASI ALANANINA BETONARME DİREKLİ KAFES TELLİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ: İhalesi 06.04.2015 tarihinde yapılarak 05.05.2015 tarihinde 234.000.TL anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanarak, 07.05.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2015 yılı ödeneği 273.170.TL dir. 270.223.TL (KDV dahil) harcama yapılmış olup 2015 yılında geçici kabulü yapılmıştır.

4734 Sayılı Kanunun, 22-d-b. Maddesi Kapsamında Yapılan Doğrudan Temin İmalatları:

YAPILAN İŞ	TUTARI
NÜSEM tadilat ve onarım yapım işi	18.375,20
Personel ve Öğrenci yemekhanelerinin tadilat ve onarım yapım işi	17.912,58
BESYO, Bor MYO ve Halil Zöhre Ataman MYO Kompanzasyon bakım ve onarım işi	18.149,38
Rektörlük Binası ve İİBF için paslanmaz çelik su deposu alım işi	19.051,10
Merkezi Araştırma Laboratuvarı UPS arıza onarım ve bakım işi ödemesi	3.363,00
İ.İ.B.F. ve Merkezi Yemekhane duvar ve yer döşemelerinin tadilatı ve onarım yapım işi.	9.912,00
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında belirlenen eksikliklerin giderilmesi işi.	7.696,37
Derbent Yerleşkesi giriş güvenlik kapısına bayrak ve flama direklerinin yapım işi	2.914,60
Rektörlük ve Bağlı birimlerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı ve bakım onarımı işi	10.926,03
Rektörlük ve Bağlı birimlerin pompa tamiratları işi	17.557,22
Rektörlük katı geçiş koridorlarında bulunan odaların güvenlik özellikli mobilya kapı yapım işi	15.340,00
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sabiha Şahenk Kütüphanesine ilave güvenlik kamerası takımı ve mevcut kameraların bakım ve onarım işi	10.287,24
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin ısıtma sistemleri bakım ve onarım işi	4.898,18
Rektörlük ve Bağlı Birimlerinde kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzemesi alım işi	6.288,21
Rektörlük Anıt Binası ve Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu jeneratör bakım onarım ve yük aktarımı işi	18.880,00
Ayhan Şahenk Kütüphanesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu asansör arızası ve bakım onarım işi	7.710,12
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin itfaiye bağlantı ağzı alım işi	6.726,00
Atıksu Arıtma Tesisi bakım onarım işi	17.794,40
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik tesisatı bakım ve onarım işi	19.277,07
Bor MYO Müdürlüğü binasının dışa açılan kapılarının yapım işi	13.865,00

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2015

Sıhhi tesisat bakım onarım işi	18.882,95
Rektörlüğe Bağlı Birimlerin çatı tadilat ve onarım yapım işi	17.108,82
Rektörlük Hizmet Binası yangın santrali bakım ve onarım işi	2.655,00
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik tesisatı bakım ve onarım giderleri	12.734,68
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin pompa tamiratları işi	14.527,86
Rektörlük kampüs alanı çevre aydınlatmaları elektrik tesisatı arızaları yapım işi	1.327,91
Teknik Bilimler MYO güvenlik kulübesi yerden ısıtma sistemi yapım işi için malzeme alımı	2.003,40
Sosyal Bilimler MYO engelli öğrencilerin WC ve zemin kat giriş rampası yapım işi	10.030,00
Rektörlük Merkez Yerleşkesi milli piyango kapısı giriş-çıkış kapısı otomatik demir aksamli kayar kapı yapım işi	7.080,00
Öğrenci Yurtları mekanik tesisat bakım ve onarım işi	18.880,00
Rektörlük ve Bağlı Birimlerde kullanılan jeneratörlerin bakım ve onarımı	5.667,54
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik tesisatı bakım ve onarım işi (Göncü Konağı Çevre Aydınlatma ve Yabancı Diller Yüksekokulu elektrik data bakım-onarım işi)	17.127,41
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin ısıtma sistemleri bakım ve onarım işi	19.552,60
Yabancı Diller Yüksekokulu bilgisayar data yapım için malzeme alım işi	3.610,56
Bağlı Birimlerde yapılan çatı tadilat onarım yapım işi	7.670,00
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi uygulama sahasında bulunan su pompalarının üzerinin kapatılması yapım işi	4.867,50
TOPLAM	410.649,93

Yayın Alımı

2015 yılında yayın alımları için 900.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 899.952.TL'si harcanmıştır.

HARCAMANIN ADI	TUTAR (TL)
Annual Reviews	20.497,25
Turnitin	16.460,40
EBSCHOST: Ebsco Discovery Service (EDS)	9.975,20
American Chemical Society (ACS)	25.779,35
Royal Society of Chemistry (RSC)	14.300,84
Wiley	58.011,21
Emerald Management 120	33.914,06
Math Sci Net	7.191,88
Cambridge Journals Online	11.466,97
Sage Premier	27.616,32
American Institution of Physics (AIP)	14.996,39
SPIE E- Books	4.749,44
World E-Book Library	15.176,73
APS	8.521,70
BioOne	6.060,52
ArtStor	6.276,77
Euclid Prime Journals	6.962,34
JSTOR	14.147,30
IOP science xtra	22.089,14
EBSCO E-Book	14.133,55
ASTM Standards & Digital Library	26.229,99
American Society of Mechanical Engineers	21.084,77
IEEE/Wiley E-Books	9.250,83
SciFinder	54.706,68
Oxford Journals Online	14.006,52
ProQuest Central	104.811,00
ProQuest Agricultural Science Collection	16.452,33
İdeal Online Süreli Yayın Veri Tabanı	11.300,00
EBSCO JOURNALS (EJS)	14.732,12
ECS digital library	5.601,04
EBSCO Hiper kitap Online	27.733,38
Springer E-Books	98.002,71
Elsevier E-Book 2015 Koleksiyonu	84.234,97
Education Source Ebsco	22.092,12
JSTOR E-Book Collection	5.306,57
Palme	18.006,19
Palme	10.344,19
Çağlayan	15.829,60
Palme	1.900,00
TOPLAM	899.952,37

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat Alımı

2015 yılı bütçe ödeneği 500.000. TL olup 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 590.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 1.090.000. TL. dir.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMI YAPILAN MALZEME	TUTARI
Fotovoltaik Paneller için Özel Hazırlanmış Gümüş Pasta, PV Temizleme Solüsyonu	11.741,00
Polipropilen Azot Kontrollü Dolap	12.390,00
SiH4 Gas Cylinder	16.509,39
Çift Kademeli Özel Gaz Regülatörü Oksijen, Yüksek Safılıkta Hidrojen 5.5 Grade, Linde Çift Kademe Özel Gaz Regülatörü, Argon Tüp	4.815,86
GA18 Hava Kompresörü Yıllık Bakım, QD50 Hassas Filtre Yıllık Bakım, PD 50 Hassas Filtre, DD 50 Hassas Filtre, DD35 Hava Filtresi, QD34 Hava Filtresi, PD35 Hava Filtresi, Kompresör Bakım B Tipi	14.240,52
Hijyenik Klima Santrali ve Temiz Oda Filtreleri	9.440,00
Screen Printer için Elek	13.702,16
Midas Filtre, Çift Örgü Başlıklı Teflon Hortum	1.518,83
Plastik Kutu, Azot Kontrollü Çift Gözlü Dolap	14.868,00
NH20 Plastik Clips, NH20 Kutu, NH'0 C5 Kutu	3.304,00
DELL XPS 13 9343 50W 82B Ultrabook (Bilgisayar)	4.189,00
SF8-FF-8-400 50 Scroll Tip, yağsız kompresör, hava soğutmalı, Entegre Kurutuculu, Elektronik Kontrollü Ekranı Work Place Özel yalıtımlı 7,4 kw gücünde basınçlı hava kompresörü, basınçlı hava tankı	41.734,04
150 cm (x-Pro Otomatik) 20mm Endüstriyel Seramik Çeker ocak	17.995,00
Fiziksel Buhar Kaplama Sistemi(PVD)	252.520,00
Hava/Su Tabancası	1.770,00
Laboratuvar Malzemesi	15.426,80
7111-7110 RA İÇ DIŞ Inverter Salon Tipi Klima	17.800,00
UNAM SEM TEM XPS XRD FIB Cihazları Kullanım Hizmet Bedel	16.000,00
Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) Sistemi	328.925,00
CH4 Metan Çelik Tüpte	4.425,00
Yolluk yevmiye	1.211,00
Nakliye, fort lift hizmet gideri	295,00
Gümrük giderleri	6.091,03
Diğer hizmet alımları	2.846,32
TOPLAM	813.757,95

Proje No: 2015H034440, Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2015H034440								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2015-2015								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje ve Müşavirlik								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2014 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2015	100			100		100 (+421)		492	95

2015 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 100.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 421.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği 521.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 492.188.TL'si harcanmıştır.

Merkez Yerleşkemizde Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Proje hizmetleri ve ilgili teknik dokümanların hazırlanması alım işi için 159.300. TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

Merkez Yerleşkemizde İslami İlimler Fakültesi Proje hizmetleri ve ilgili teknik dokümanların hazırlanması alım işi için 141.600. TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

Tarihi bina restorasyonu proje hizmetleri alım işinin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme fiyatı 136.200. TL olup, projeler Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde incelemededir.

Mevcut binaların engelliler için hissedilebilir yüzey proje hizmetleri alım işleri için 18.880.TL (KDV dahil) harcama yapılmıştır.

Proje No: 1994H032370Proje, Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI								
NUMARASI	1994H032370								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2017								
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT+DON. (9.750 +7.500+2.592+1.330+11.350 m2).								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2014 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI	Revize								
2015	140.000	105.849		12.500		+8.575 (+12.500)		21.075	88
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Eğitim Fakültesi 2.Etap İnşaatı, Enstitü Binası İnşaatı, Çarşı Binası Yapım İşİ ve İİBF Amfi Bloğu İnşaatı ve Mühendislik Fakültesi 4. Etap Ek Bloklar İnşaatı devam etmektedir. 2015 yılında 12.500.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 8.575.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği 21.075.000.TL olmuştur.

1-İLGİLİ DAİRE	: Niğde Üniversitesi	: Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) N.Ü. Eğitim Fak.2.Etap İnş. b) Mütahhit: AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.	a) N.Ü. Enstitü Binası İnş. b) Ersel İnş. Müh. Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Eğitim Fak.2.Etap İnş.	: Enstitü Binası İnş.
4-YAKLAŞIK MALİYET	: 9.800.000,00 TL	: 6.500.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	: 7.338.000,00TL	:4.961. 000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	: 24.02.02014	: 17.02.2014
7- MUKAVELE TARİHİ	: 17.04.2014	: 17.04.2014
8-YER TESLİM TARİHİ	: 21.04.2014	: 21.04.2014
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 21.04.2014	:21.04.2014
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 18.08.2016	: 03.09.2015
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0.06 (4.103,4)	: %0,06 (2.976,6)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	: ---	-
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	:---	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	:7.338.000,00TL	: 4.961.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	: 9.750 m2	: 7.500 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 80	% 85
18- İNŞAATIN DURUMU	: Devam ediyor.	Devam ediyor.

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2.ETAP İNŞAATI

2015 yılı ödeneği 5.250.000.TL olup, ödeneğin tamamı harcanmıştır. Müzik ve Resim Bölümlerinin bulunduğu 9.750 m2 kapalı alana sahip 2 bloktan ve müştemilatından oluşmaktadır. Müzik Bölümü Bloğu ve 220 Kişilik Konferans Salonu (çevre düzenlemesi hariç) 2015 yılı itibariyle hizmete alınmıştır. Resim Bölümü Bloğu betonarme karkas ve kabası tamamlanmıştır.



ENSTİTÜ BİNASI İNŞAATI

2015 yılı ödeneği 5.750.000.TL dir. Bu ödeneğin 3.493.198. TL harcanmış olup, 2.256.801. TL'si harcanamamıştır. Adı geçen inşaatımız A ve B bloklardan olmak üzere 7.500 m2 kapalı alana sahiptir. 2015 yılı fiziki gerçekleşmesi betonarme karkas imalatı devam etmekte olup % 85 seviyesine getirilmiş ve çalışmalar devam etmektedir. Yüklenici firma işi zamanında bitiremediğinden, firmaya ihtar çekilmiş ve cezalı çalışmaktadır.



ÇARŞI BİNASI YAPIM İŞİ :

6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 3.750.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ödeneğin 2.669.376. TL. si harcanmıştır. İş bitim tarihi 26.08.2015 olup, çalışmalar cezalı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmesi % 85 dir.

1-İLGİLİ DAİRE	: Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) N.Ü. Çarşı Binası Yapım İş b) Ali Naci TOKER (Toker Ticaret)
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Çarşı Binası Yapım İş
4-YAKLAŞIK MALİYET	: 3.431.402,63 TL
5-İHALE BEDELİ	:2.886.560,00TL
6- İHALE TARİHİ	: 18.09.2014
7- MUKAVELE TARİHİ	: 27.10.2014
8-YER TESLİM TARİHİ	: 31.10.2014
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 31.10.2014
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 26.08.2015
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0.06 (4.103,4)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	: ---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	:---
15-SÖZLEŞME BEDELİ	:2.886.560,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	: 2.592 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 85
18- İNŞAATIN DURUMU	: Devam ediyor.



İİBF EK AMFİ BLOĞU İNŞAATI :

6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 2.750.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 1.330 m2 kapalı alana sahiptir. 2015 yılı fiziki gerçekleşmesi % 83 seviyesine getirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. 2016 yılı Şubat ayında tamamlanması hedeflenmektedir.

1-İLGİLİ DAİRE	: Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) N.Ü. İİBF Ek Amfi Bloğu İnşaatı b) Selim Tuğrul (Nokta Mim.Müh.)
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: İİBF Ek Amfi Bloğu
4-YAKLAŞIK MALİYET	: 2.101.355,56 TL
5-İHALE BEDELİ	:1.999.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	: 17.09.2014
7- MUKAVELE TARİHİ	: 14.11.2014
8-YER TESLİM TARİHİ	: 19.11.2014
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 19.11.2014
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 14.09.2015
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0,06 (1.926,00)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	-
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.999.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	: 1.330 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 85
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4. ETAP EK BLOKLAR İNŞAATI:

Derslik ve Merkezi Birimler Projemiz bünyesindeki Mühendislik Fakültesi 4. Etap Ek Bloklar(E-F1-F2-F3 Bloklar) İnşaatı-Mevcut D1-D2-E1 Blok Dış Cephe Boyası ile Altyapı ve Çevre Düzenleme işimizin 20.02.2015 tarihinde ihalesi yapılarak 25.03.2015 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış olup, 30.03.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2015 yılı ödeneği 1.500.000.TL olup, 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 2.750.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu toplam ödenek 3.575.000.TL olup ödeneğin tamamı harcanmıştır.

İnşaat; F1, F2, F3 ve E Blokları olmak üzere toplam 4 Bloktan oluşmakta olup, 11.350 m2 kapalı alana sahiptir. F1 ve F2 Bloğu (F1 ile F3 arası bağlantı bloğu) betonarme karkası tamamlanmış, F3 Bloğu (Dekanlık) betonarme imalatları zemin kat seviyesinde olup devam etmektedir.E Blok (mevcut bina ile bağlantı bloğu) betonarme karkası son tabliye seviyesinde olup çalışmalar devam etmektedir.

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) N.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit: AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	N.Ü. Mühendislik Fak. 4. Etap Ek Bloklar
4-YAKLAŞIK MALİYET	10.111.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	7.894.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	20.02.2015
7- SÖZLEŞME TARİHİ	25.03.2015
8-YER TESLİM TARİHİ	30.03.2015
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	30.03.2015
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	08.03.2017
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	%0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	----
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	----
15- TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	7.894.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	11.350 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 40
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam Ediyor.



Proje No: 1994H032350, Proje Adı: Kampüs Alt Yapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			KAMPÜS ALTYAPI 4. KISIM İNŞAATI						
NUMARASI			1994H032350						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			1994-2017						
KARAKTERİSTİĞİ			Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2014 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAM A GİRİŞ YILI									
2015	65.000	50.863		6.000				5.123	85
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi
SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Niğde Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit: Mehmet ORMAN & Temel Fen İş Ortaklığı
SÖZLEŞMENİN KONUSU	Niğde Kampus Altyapı 4. Kısım İnşaatı
YAKLAŞIK MALİYET	14.074.776,86- TL
İHALE BEDELİ	10.900.000,00-TL
İHALE TARİHİ	12.12.2013
MUKAVELE TARİHİ	03.02.2014
YER TESLİM TARİHİ	03.02.2014
FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	03.02.2014
İŞİN BİTİM TARİHİ	12.04.2016
GÜNLÜK GECİKME CEZASI	%0,06
TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	10.900.000,00-TL
TOPLAM KAMPÜS ALANI	2.335.655 m2
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%57
İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.

KAMPÜS ALTYAPI TESİSİLERİ 4. KISIM İŞLERİ; (Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon vb.)

2015 yılı ödeneği 6.000.000. TL. olup, 5.122.518. TL.'si harcanmıştır.

Kanalizasyon işlerinin % 98 seviyesine, yağmur suyu ve drenaj işleri % 98 seviyesine, 1. peyzaj bölgesi yapısal ve peyzaj olarak % 90, 2.peyzaj bölgesi yapısal ve peyzaj olarak % 98, 3.peyzaj bölgesi yapısal ve peyzaj olarak % 50 seviyesindedir. Arıtma tesislerinin betonarme imalatları tamamlanmış ince işleri devam etmektedir. Çevre ihata duvar imalatları bitirilmiş olup korkuluk imalatlarına başlanacaktır.

Kuzey asfalt yolu, güneybatı asfalt yolu ve kuzeybatı devriye yolu, diğer asfalt yolların alt temel işleri, kilitli parke olarak yapılan yaya yolları tamamlanmıştır.



Proje No: 2014H050190, Proje Adı: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			SPOR						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (KOP)						
NUMARASI			2014H050190						
YERİ			NİĞDE Merkez						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2014-2017						
KARAKTERİSTİĞİ			İnşaat 1500 Sey. Sp. Sal.						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2014 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAM A GİRİŞ YILI									
2015	15.000	-		2.500		5.500 (+3.000)		957	17
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

1-İLGİLİ DAİRE	:Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Niğde Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit: AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.& Şenel DOĞAN İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Niğde Kampus Açık Kapalı Spor Tesisleri (KOP)
4-YAKLAŞIK MALİYET	: 14.750.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	: 13.325.000,00 TL
6-İHALE TARİHİ	: 12.08.2015
7-SÖZLEŞME TARİHİ	: 08.09.2015
8-YER TESLİM TARİHİ	: 14.09.2015
9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 14.09.2015
10-İŞİN BİTİM TARİHİ	: 12.09.2017
11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0,06
12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	: --
13-SÖZLEŞME ARTIŞI	: --
14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	: 13.325.000,00 TL
15-TOPLAM ALANI	: 10.589 m2
16-FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 10
17-İNŞAATIN DURUMU	: Devam ediyor.

2015 yılı ödeneđi 2.500.000. TL olup, 6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.000.000.TL ödenek eklemesiyle yılsonu toplam ödeneđi 5.500.000.TL olup ödeneğin 956.798.TL si harcanmış olup, işimiz devam etmektedir.

Merkez Yerleşkemiz içerisine 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi yapım işimizde, spor salonu imalatlarının hafriyat işleri, temel altı izolasyonları ve betonarme temel imalatları tamamlanmış, bodrum kat kolon-perde imalatları devam etmektedir.



2.1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

1. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Üniversitemiz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı arasında 20.06.2014 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda inşaatı başlanılmış olup toplam 11.450 m2 kapalı alana sahip inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 65 seviyesindedir. 2016 yılında tamamlanarak hizmete açılması beklenilmektedir.



2. TEKNOPARK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile Merkez Yerleşke içerisinde yaklaşık 19.000 m2'lik bir alana sahip olarak yapılan bina toplam 4 katlı olup, 2.831 m2 kapalı alana sahiptir. 1.805 m2 kiralanabilir ofis alanı bulunmaktadır. Fiziki gerçekleşme %100 olup inşaat teslim aşamasına gelmiştir.



2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1 Proje Tamamlama Raporu

3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak:

- ✘ Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,
- ✘ Kurumlardan kaynaklanan hataların minimize edilebilmesi için hizmet içi eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi,
- ✘ Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması,
- ✘ Yapılan büyük onarım çalışmalarında “Anahtar Teslimi Götürü Bedel” sözleşmelerle yaşanan sıkıntıları azaltabilmek için büyük onarım ihalelerinde “Teklif Birim Fiyat Sözleşmesinin” hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması,
- ✘ Yayın alımları kapsamında ihale yöntemiyle satın alımlarında her kitabın ayrı ayrı özelliği olması sebebiyle EKAP’ a tek tek giriş yapılması yerine yeni bir yöntem getirilmesi,
- ✘ Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,
- ✘ Üniversitemizin kapalı alanları, öğrenci kapasiteleri dikkate alınarak ve eğitim mekanlarının günümüz koşullarına, teknolojilerine uygun olarak yapılması gerekliliği düşünülerek ödeneklerin verilmesi,

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2015

SEKTÖR ADI: EĞİTİM

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Toplam (18)
204111	464	1994H032350	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Niğde	65.000	50.863	6.000		5.123
211058	464	1994H032370	Derslik ve Merkezi Birimler(KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Niğde	140.000	105.849	12.500	8.575	16.976
204248	464	2014H030270	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Niğde	15.000	6.718	5.000	5.000	6.467
204251	464	2014H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Niğde	6.500	0	2.500	3.000	957
204245	464	2015H034440	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Niğde	100	0	100	421	492
204254	464	2015H034450	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Niğde	900	0	900		899
TOPLAM							227.500	163.430	27.000	16.996	30.914

**tabloda 500.TL. lik kamulaştırma ödeneği yoktur.*

SEKTÖR ADI: DKH

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Toplam (18)
207579	464	2010K121260	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2015	Niğde	11.065	10.565	500	590	1.090
TOPLAM							11.065	10.565	500	590	1.090

