

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart, 2010



2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



İÇİNDEKİLER	1
1-YÖNETİCİ ÖZETİ	2
2-GENEL DEĞERLENDİRME	3
A- VİZYON	3
B- MİSYON	3
C- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	3
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	10
E-MEV CUT ÜRETİM KAPASİTESİ	10
F- 2009 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFL ENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	11
G- 2009 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	12
a- Genel Yatırım Uygulama Durum	12
b- Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar	13
3- 2009 YILI PROJE UYGULAMALARI	
MUHTELİF İŞLER	14
a)Yayın Alımı	
b)Makine-Teçhizat Alımları	15
c) Bilgi Teknolojileri	17
d) Büyük Onarım	17
Çeşitli Üniteler Etüd Projesi	20
Derslik ve Merkezi Birimler	21
Fen-Edebiyat Fakültesi	25
Kampüs Alt Yapı	27
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	32
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	34
4- ÖNERİLER	37
5- 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3)	38
6- 2009 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK-4)	39

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı





SUNUŞ



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getirilerek; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedeflemiş olup, bu hedeflere ulaşabilmek için gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Bilim, sanat, spor alanlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiş olan Niğde Üniversitesi, bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir üniversite olmayı gaye edinmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz. Yapılan yatırımların planlama, faaliyete geçirilme, tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60'ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Rektör

2- GENEL DEĞERLENDİRME

A- VİZYON

Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır.

B- MİSYON

Niğde Üniversitesi, bilim, sanat, spor alanlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



C- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç .1. Eğitim-öğretim kalitesini iyileştirmek.

Hedef .1.1. Eğitim-öğretim programlarını güncel tutmak ve yapısal olarak güçlendirmek.

Hedef .1.2. Eğitim-öğretimi uygulama ile güçlendirmek.

Hedef .1.3. Tüm akademik birimlerin araç gereç (Projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçlarını karşılamak.

Hedef .1.4. Ders içeriklerinin tamamını web ortamına aktarmak.

Hedef .1.5. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılmasını sağlamak.

Hedef .1.6. Bilgisayar destekli eğitimi güçlendirmek, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerilerini geliştirilmek.

Hedef .1.7. Üniversitede tüm programlarda akreditasyon çalışmalarına başlamak.

Hedef .1.8. Yeni bölümler açmak için fizibilite çalışmalarını başlatmak.

Hedef .1.9. Yabancı dil eğitimini güçlendirmek.

Stratejik Amaç .2. Öğrenci Merkezli Üniversite Anlayışını Hayata Geçirmek.

Hedef .2.1. Danışmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hâle getirmek.

Hedef .2.2. Öğrencilerin motivasyon ve memnuniyet düzeyini artırmak.

Hedef .2.3. Mezunları takip sistemi oluşturmak.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Hedef .2.4. Öğrenci temsilciliğini yönetim karar mekanizmalarında daha etkin hâle getirmek.

Hedef .2.5. Öğrencilerin beslenme, ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek.

Hedef .2.6. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç .3. Araştırma Altyapısını Geliştirmek.

Hedef .3.1. Laboratuvarları geliştirmek.

Hedef .3.2. Bilgisayar donanım ve yazılım olanaklarını geliştirmek.

Stratejik Amaç .4. Bilimsel Yayınları ve Etkinlikleri Artırmak.

Hedef .4.1. Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayınlanan makale ve atıf sayısını artırmak.

Hedef .4.2. Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı artırmak.

Hedef .4.3. Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısını artırmak.

Hedef .4.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin sayısını artırmak.

Hedef .4.5. Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminden öğretim elemanlarının projelerine ayrılan desteği artırmak.

Stratejik Amaç .5. Kurumsal Projeler Yürütmek

Hedef .5.1. Ulusal ve uluslararası kurumlardan proje desteği alınmasını sağlamak.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



ALTYAPI GELİŞTİRME STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç .6. Mevcut Altyapıyı ve Kapalı Alanları Geliştirmek ve Etkin Kullanımını Sağlamak.

Hedef .6.1. Mevcut altyapıyı ve kapalı alanları iyileştirmek.

Hedef .6.2. Üniversite öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek.

Hedef .6.3. Bazı üniteleri yap-işlet-devret modeli ile yaptırmak.

Hedef .6.4. Öğrencilerin ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler yapmak.

Stratejik Amaç .7. Altyapı Projelerini Tamamlamak.

Hedef .7.1. Birimlerin sağlıklı ve kontrol edilebilir gelişimini sağlayacak altyapı ve fiziksel alan önceliklerini belirlemek ve bu önceliklere göre 2013 yılına kadar tüm birimlerin altyapı ve fiziksel alanlarını ortak standartlara getirmek.

Stratejik Amaç .8. Sivil Savunma Planını Hazırlamak ve Birimleri Bilgilendirmek.

Hedef .8.1. Sivil Savunma Planını hazırlamak konusunda birimleri bilgilendirmek.

Stratejik Amaç .9. Üniversitenin Bilişim Altyapısını İyileştirmek.

Hedef .9.1. Üniversite ağ altyapısını düşük maliyetli çözümlerle geliştirmek, kullanıcıların internet ve intranet erişim kalitesini iyileştirmek, altyapı düzeyinde servis çeşitliliğini artırmak.

Stratejik Amaç .10. Çevreyi Kirliletmeyen Bir Üniversite Kampüsü Yaratmak ve Üniversite Kaynaklarının Verimli Şekilde Kullanılmasını Sağlamak Amacıyla “Sıfır Emisyon Kampüs” Uygulamasına Geçmek.

Hedef .10.1. Üniversite kampüs alanı içerisinde bulunan baraj gölünü ıslah etmek.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Hedef .10.2. Kampüs alanını yeşillendirme çalışmalarını tamamlamak.

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç .11. İnsan Kaynaklarını Etkili Bir Şekilde Yönetmek.

Hedef .11.1. Birimlerin personel ihtiyacını belirlemek ve gidermek.

Hedef .11.2. İdari birimlerde görev yapan personelin kariyerini etkili bir şekilde yönetmek.

Hedef .11.3. Üniversite çalışanlarının mesleki gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmak.

Hedef .11.4. Nitelikli araştırma görevlisi bulmak ve yetiştirmek.

Stratejik Amaç .12. Personel Çalışma Ortamını İyileştirmek ve İşe Uyumunu Sağlamak.

Hedef .12.1. Çalışma ortamını fiziksel olarak iyileştirmek.

Hedef .12.2. Akademik ve idari birimlerde resmi oryantasyon sürecini başlatmak.

KURUMSAL GELİŞİM VE İŞLEYİŞ STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç .13. Kurumsallaşmayı Sağlamak.

Hedef .13.1. Üniversitenin işlevini yürütebilmesi için rektörlük birimleri ve akademik birimlerdeki tüm görevler için iş analizleri ve ölçümleri yapmak, bu ölçümlere göre oluşturulan görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan personel sayısını belirlemek; belirlenen görevlerin örgüt yapısında yer alan kadrolara dağıtılarak açıkta görev bırakmamak.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Hedef .13.2. Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinin işleyişine yönelik yönergeler düzenlemek.

Hedef .13.3. İş ve bilgi akışını daha hızlı ve etkili yapabilmek için yazışmalarda kullanılacak formatları belirlemek.

Hedef .13.4. Kurumsal işleyişe ilişkin ilke ve kuralların belirlenip kurum çalışanları tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

Hedef .13.5. Kurumsal işlem ve işleyişe ilişkin ayrıntılı, güncel ve güvenilir bilgi verebilecek elektronik araçlar geliştirmek ve bu bilgilere ulaşılabilirliği sağlamak.

Hedef .13.6. Yönetimde karar süreçlerine iç paydaşların katılımını sağlamak.

Stratejik Amaç .14. Toplam Kalite Kültürü Oluşturmak.

Hedef .14.1. Toplam Kalite Yönetimini (TKY) öncelikle akademik ve idari birim yöneticilerinin benimsemesini ve üst düzey yönetimin bu konuda sürekli desteğinin sağlamasını bir yaşam felsefesi hâline getirmek.

Hedef .14.2. Kuruma yeni katılan personelin TKY sürecine hızlı bir şekilde uyumunu sağlamak.

Hedef .14.3. Birim ve birey bazında performans ve kalite ölçüm kriterleri geliştirilip uygulamaya koymak.

Hedef .14.4. Tüm akademik ve idari birimlerde süreç odaklılığı bir yaşam felsefesi haline getirmek; personelin bütün işlerini en az hatayla, en kısa süre içerisinde, en az maliyetle ve en verimli bir şekilde yapmasını sağlamak.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



FINANSMAN STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç .15. Gelirleri Artırmak.

Hedef .15.1. Öz kaynakları artırmak.

Hedef .15.2. Genel bütçeden yapılan tahsisleri, stratejik amaçlar doğrultusunda ve birimlerin stratejik planlarında belirttikleri ihtiyaçlar ve performansları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmak ve bu harcamaların sürekli kontrolünü sağlamak.

HALKLA İLİŞKİLER VE TOPLUMA HİZMET STRATEJİLERİ

Stratejik Amaç .16. Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetlerine (MBA, Sertifika Programları, Yetenek Geliştirme Kursları vb.) Önem Vermek ve Atılım Yapmak.

Hedef .16.1. 2013 yılı sonuna kadar eğitim faaliyetlerinin sayısını artırmak.

Hedef .16.2. Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve topluma yönelik araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak.

Stratejik Amaç .17. Yerel/Ülusal Sorunlara Çözümler Üretmek ve Duyurmak.

Hedef .17.1. Üniversite-Sanayi iş birliğini artırmak için çalışmalar yapmak.

Hedef .17.2. 2009 yılı sonuna kadar güncel yerel sorunların tartışıldığı platformlar yaratmak.Çevreye Karşı Sosyal Sorumlulukları Yerine Getirmek.

Stratejik Amaç .18. Çevreye Karşı Sosyal Sorumlulukları Yerine Getirmek.

Hedef .18.1. 2009 yılı sonuna kadar çevre ile ilgili kulüpleri kurmak ve aktif hâle getirmek.

Hedef .18.2. Üniversite paydaşları ile ilişkileri güçlendirmek, üniversitenin bulunduğu yöre ve ülke sorunlarına çözüm üreten bir kurum olmasını sağlamak.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Hedef .18.3. Plan döneminde her yıl paydaşları bilgilendirmek.

Stratejik Amaç .19. Niğde'nin ve Niğde'de Sahip Olunan Tarihsel, Sanatsal, Sosyo-Kültürel Varlıkların, Kurumsal Yapının Tanıtımında Daha Etkin Olarak Kullanılmasını Sağlamak.

Hedef .19.1. 2010 yılı sonuna kadar sahip olunan tüm tarihsel ve sosyo-kültürel dokümanları tespit ederek belgelendirmek.

Stratejik Amaç .20. Kurumsal Tanınırlığı ve İş Birliklerini Artırmak.

Hedef .20.1. Dış paydaşlarının Niğde Üniversitesi'ni tanıma oranını artırmak.

Hedef .20.2. 2011 yılı sonuna kadar Sivil Toplum Örgütleri ile ilişkileri güçlendirmek.

Hedef .20.3. 2013 yılı sonuna kadar üniversitenin tanınırlığını ve ulusal/uluslararası kurumlarla iş birliğini artırmak.

Hedef .20.4. Niğde Üniversitesinde gerçekleştirilen halka açık sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısını artırmak.

Hedef .20.5. Bilim adamlarını tanıtmak ve bilim adamlarının katkısıyla akademik-bilimsel çevrelerde üniversitenin tanınırlığı ve olumlu kanaatleri artırmak.

Hedef .20.6. Üniversite adayları nezdinde üniversitenin tanınırlığını ve olumlu kanaatleri artırmak.

Hedef .20.7. Yurt dışındaki üniversiteler ve bu üniversitelerin öğrencilerinin nezdinde Niğde Üniversitesinin tanınırlığını artırmak.

Hedef .20.8. Türkiye ve dünya kamuoyunda üniversitenin tanınırlığının ve olumlu kanaatlerin artırılmasını sağlamak.

Hedef .20.9. Mezuniyet günü, kariyer günleri, bahar şenlikleri gibi faaliyetleri üniversitenin tanıtımında etkin olarak kullanmak.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



D- YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

FİNANSMAN KAYNAĞI	2009 YILI TAHMİN	2009 YILI GERÇEKLEŞEN
HAZİNE	13.274.000	13.238.490
ÖZ GELİR	1.226.000	1.226.000
NET FİNANSMAN		870.000
HİBE	0	0
TOPLAM	14.500.000	15.334.490

E- MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

2009 yılında yatırım inşaatlarından, Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu inşaatı 5235 m2, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatı projesinde kapalı spor salonu 4550 m2,altyapı çalışmaları kapsamında da 17.176 m2, alan tamamlanmıştır.

F- 2009 YILI YATIRIMIYLA HEDEFLLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

HEDEFLLENEN;

- 2010 yılı içerisinde yapımı planlanan Eğitim Fakültesi Binası ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası mühendislik projelerinin yaptırılması,
- Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatının 2009 yılı itibariyle tamamlanarak hizmete açılması,
- Kütüphane binasının ihalesinin yapılarak inşaatın % 20 seviyesine getirilmesi,
- Kampüs alt yapı ikmal inşaatı projesi kapsamında, çevre ve peyzaj düzenlenmesi, kampüs ana kapı yan düzenlemesinin yapılması,
- Fen- Edebiyat Fakültesi C3 blok inşaatının %60 seviyesine getirilmesi,
- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatının kapalı spor salonu tamamlanarak hizmete açılması, açık spor tesisleri inşaatına başlanması,
- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin A1,E1,E3,E4.1(Tekkol) bloklarının ihalesinin yapılarak % 20 seviyesine getirilmesi,

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



GERÇEKLEŞEN;


- ✿ Eğitim Fakültesi Binası inşaatının, ihtiyaç programına göre Mimari, Betonarme, Mekanik Tesisatı, Elektrik Tesisatı projeleri, zemin etütleri yaptırılmış ve maliyetleri hesaplatılmıştır.
- ✿ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının Mimari, Betonarme, Mekanik Tesisatı, Elektrik Tesisatı projeleri yaptırılmış ve maliyetleri hesaplatılmıştır.
- ✿ Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatı tamamlanmış olup, hizmete açılacaktır.
- ✿ Kütüphane binası inşaatının temel kazısı yapılmış ve temeli atılmıştır. İki bloktan oluşan inşaat % 20 seviyesine getirilmiştir.
- ✿ Kampüs alt yapı ikmal inşaatı %85 seviyesine getirilmiştir.
- ✿ Fen- Edebiyat Fakültesi ek blok inşaatı genel olarak %90, C3 blok ise %65 seviyesine getirilmiştir.
- ✿ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatının Kapalı Spor Salonu tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca merkez kampüs ve Ulukışla kampüsünün açık spor tesisi inşaatına başlanılmış olup % 60 seviyesine getirilmiştir.
- ✿ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin, A1,E1,E3,E4.1 (Tekkol) blokları olmak üzere 7296,13 m2 kapalı alanlı inşaat ihalesi tamamlanarak , inşaat % 27 seviyesine getirilmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**G- 2009 YILI YATIRIM UYGULAMALARI****a- Genel Yatırım Uygulama Durumu**

Üniversitemizin 2009 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 14.500.000.TL iken, 5828 sayılı kanunun 10/5 maddesi uyarınca 870.000.TL ödenek kaydedilmiş ve üniversitemizin yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 15.370.000 TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 15,334,490 TL'si harcanmış olup yıl sonunda 35.510.TL'lik ödenek iptal edilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/yıl sonu toplam ödenek)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.444.000	2.314.000	2.311.051	%100
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	86.000	86.000	53.628	%62
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	11.970.000	12.137.995	12.137.804	%100
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.	1.000.000	832.005	832.005	%100
	GENEL TOPLAM	14.500.000	15.370.000	15.334.490	%100

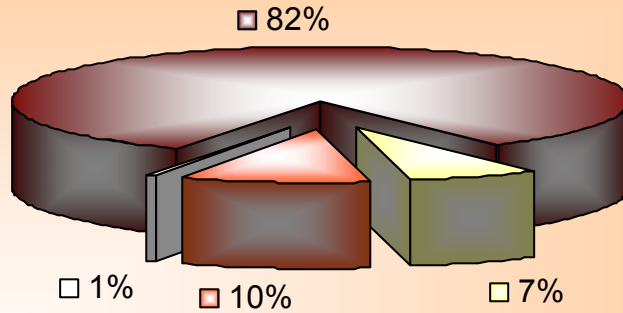HARCAMA ORANI

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ✿ Yatırım ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsimimin göz önüne alınarak yapılması daha gerçekçi bir yaklaşım sergileyecektir.
- ✿ Son yıllarda kamu yatırım ödenekleri, Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulmaktadır. Dolayısıyla 1993 yılından beri devam eden üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inşaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**3- 2009 YILI PROJE UYGULAMALARI****Proje No: 2009H032040 Proje Adı: MUHTELİF İŞLER**

2009 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 2.530.000 TL 'dir. Yıl içinde likit ödenekten eklenen ve kurum içi aktarma ile düşülmesi sonucu yıl sonu ödenek toplamı 3.232.005.TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 3.196.685. TL.si harcanmış olup yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

YAYIN ALIMI

HARCAMANIN ADI	TUTARI
- Springer Link Veri Tabanı Veri Tabanı	38.793,87
- Math-Sci Net Veri Tabanı	4.758,68
- SIAM Veri Tabanı	4.522,87
- Royal Society of Chemistry (RSC) Veri Tabanı	9.229,02
- Institution of Physics Veri Tabanı	10.063,00
- Oxford University Pres (OUP) Veri Tabanı	4.360,70
- SAGE Premier Veri Tabanı	16.063,06
- Knovel E-Kitaplar Veri Tabanı	14.546,04
- Emerald Management Xtra Veri Tabanı	22.813,62
- American Chemical Society (ACS) Veri Tabanı	8.503,93
- American Institution of Physics (AIP) Veri Tabanı	8.307,21
- JSTOR Veri Tabanı	6.361,31
- Ebrary Academic Complete E-Kitaplar Veri Tabanı	8.229,60
- ProQuest Central Veri Tabanı	66.700,91
- Serials Solutions 360 Search Veri Tabanı	8.885,29
- ProQuest Digital Dissertations & Thesis Full Text	30.697,12
- EBSCHOST (Sport Discus- Econlit Full Text- Educational Research Complete) Veri Tabanı	31.714,08
- Wiley- Blackwell Veri Tabanı	26.774,55
- Safari Elektronik Kitaplar Veri Tabanı	25.749,67
- Springer- Earth & Envinomental Science/ Math. & Stat. E-Books 2008-2009 Koleksiyonu)	37.157,07
- Ebscho Journal Services Veri Tabanı	6.693,40
- Annual Reviews Veri Tabanı	18.460,97
- Ebrary E-Books (Seçme E-Kitaplar)	26.783,66
- Türkçe Kitap	9.666,18
- Yabancı Kitap Alımı	4.977,72
- Yabancı Kitap Alımı	47.320,92
HARCAMA	498.135,14

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMLARI

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI (KDV Dahil)
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER			
Rektörlük Konutu	Mutfak dolabı ve parke döşemesi	Muhtelif	7.648,80
Rektörlük Konutu	Koltuk takımı ve masa	Muhtelif	4.250,00
Yabancı Diller	Büro Masası ve Kitaplık	30 Adet	8.910,00
Rektörlük ve Birimler	Tarayıcı	55 Adet	40.273,20
Rektörlük	Araç takip sistemi	15 adet	12.036,00
Rektörlük ve Birimler	Perde	1063 m2	12.778,83
Rektörlük ve Birimler	E kampüs otomasyon	Muhtelif	226.064,40
Rektörlük ve Birimler	Bilgisayar ve yan donanımlar	Muhtelif	381.440,90
Rektörlük ve Birimler (kültür sanat evi)	Mobilya ve aksesuarlar	Muhtelif	112.100,00
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	21.597,54
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	12.319,20
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	10.537,40
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Diğer makine teçhizat alımları	Muhtelif	35.754,00
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	1.528,10
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	6.147,80
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Diğer makine teçhizat alımları	Muhtelif	3.276,86
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	18.077,60
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Diğer makine teçhizat alımları	Muhtelif	30.563,00
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	3.422,00
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Diğer makine teçhizat alımları	Muhtelif	33.512,00
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	3.717,00
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	10.948,04
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Diğer makine teçhizat alımları	Muhtelif	8.743,80
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Diğer makine teçhizat alımları	Muhtelif	78.835,80
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Diğer makine teçhizat alımları	Muhtelif	1.888,00
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	54.870,00
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Laboratuvar malzemesi	Muhtelif	18.336,00
Rektörlük Birimleri ile Fakülte ve Yüksekokullar	Diğer makine teçhizat alımları	Muhtelif	13.284,00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ			
	Dolap, Masa, Kitaplık, Makam takımı	Muhtelif	18.809,20
	Projeksiyon cihazı	5 adet	2.745,27
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Tarayıcı,Ram,DVDRW	Muhtelif	12.329,82
	Fan tray,Data disk, cpu fan	Muhtelif	6.053,40
	Optik okuyucu sistemi ve değerlendirme yazılımı	Muhtelif	3.835,00
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Kimlik basma makinesi	1 Adet	3.519,76
	Kitaplık,sehpa,koltuk arkılığı	Muhtelif	7.599,20

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ			
	Anfi sıra	93 adet	59.098,18
	Laboratuar malzemesi	1 adet	3.032,60
	Laboratuar malzemesi	1 adet	7.021,00
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ			
	Bilgisayar Masası	15 Adet	1.620,00
	Masa, Kitaplık, Pano, Dolap	Muhtelif	14.346,80
	Masaüstü bilgisayar(10),monitör(10), dizüstü bilgisayar4).	Muhtelif	21.819,50
	Projeksiyon cihazı	12 adet	7.586,93
	Mesaj bildirimi seti	3 adet	5.310,00
	Masa, Kitaplık, Pano, Dolap	Muhtelif	14.882,16
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Arı kovanları ve tamamlayıcı malzemeler	Muhtelif	9.300,52
	Anfi tipi sıra(5 kişilik ve 4 kişilik)	36	19.245,60
	Okul mefruşat alımları	Muhtelif	10.983,34
BEDEN EĞİTİM VE SPOR MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Baskı makinesi,anfi sıra	Muhtelif	67.437,35
EĞİTİM FAKÜLTESİ			
	Çalışma koltuğu, sıra,laminat melamin	Muhtelif	209.835,20
BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Ahşap dolap	Muhtelif	7.906,00
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Anfi sıra	219 adet	86.053,86
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Manyetik bant doldurma boşaltma ve kitap arabası	1 adet	6.714,20
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Pulluk	1 Adet	3.800,52
GENEL TOPLAM			1.783.921,78

YAZILIM ALIMLARI

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI (KDV Dahil)
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI			
	e- posta sistemi yazılım güncelleme ve bakımı	Muhtelif	39.999,64
	e- kampüs otomasyon	Muhtelif	13.629,00
TOPLAM			53.628,64

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



BÜYÜK ONARIM

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	(Muhtelif İşler) Büyük Onarım								
NUMARASI	2009H032040								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2009-2009								
KARAKTERİSTİĞİ	Büyük Onarım ve tadilat								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2009	1000			1000		-168,00		832,00	100

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

ESKİ REKTÖRLÜK BİNASI: Tüm kapı ve pencereler değişip, pencereler PVC, kapılar ahşap pres kaplama olarak yeniden yapılmıştır. Bütün WC'ler kırılıp yeniden yapılmıştır. Çatı komple elden geçirilmiştir. Çatı yağmur olukları ve indirme boruları tamamen değiştirilmiştir. Koridorlar parlak granit seramik ile kaplanmıştır. Elektrik ve makine tesisatları tamamen yenilenmiştir. İç cephe komple plastik boya ile boyanmıştır. İki bina arasındaki ısıtma tesisatı ana hatları tamamen yenilenmiştir.

ZÜBEYDE HANIM MESLEK YÜKSEKOKULU: Öğrenci ve idari kat WC leri tamamen seramikle yenilenerek kapı ve iç cephe boyaları yapılmıştır. 19 adet ahşap laboratuvar tezgahı yapılmıştır. Çatı ve yağmur olukları elden geçirilip bakım onarımı yapılmıştır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ: % 50 si yeni kiremit olmak üzere çatı komple aktarılıp, yağmur olukları elden geçirilip yağmur suyu indirme boruları değiştirilmiştir.

NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU: WC' lerdeki 37 adet kapıların onarımı yapılmış olup, 51 adet kapı boyanmış ve 2 adet yeni alüminyum kapı imalatı yapılmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ: Koridor, derslik ve idari binadaki keşfi çıkarılan alanlar tamamen boyanmıştır. Çay ocağı için gösterilen alan PVC bölme ile kapatılarak ahşap tezgah altı, mutfak dolabı yapılarak üzerine mermer konulmuştur. Koridorlardaki mineral sıvada yüzeyler 1 m yüksekliğinde silikon esaslı boya ile boyanmıştır.

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU: İdari ve derslik binalarının dış cephe boyaları tamamen yenilenmiştir. Çatı alınlarındaki eksik ve kırık parapetler, kırık pencere denizlikleri mermer yapılmıştır. İdari binanın çatısı elden geçirilerek yağmur oluklarının tamiri yapılarak eksik olan baca sacı tamamlanmıştır. Ayrıca, derslik bloğundaki koridorlar ve derslikler tamamen plastik boya ile boyanmıştır.

BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU: 1000 M2 Ek Atölye binasının betonarme karkası yapılarak çelik çatı makasları yerine konulup, aşık ve rüzgar rijitlik bağlantıları yapılmıştır.

ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU : Bina önündeki mevcut basketbol sahası ve tribünleri tamamen yeniden yapılarak yağmur suyu gideri 50 m uzaklıktaki röğara kazı yapıp koruge boru ile bağlantısı yapılmıştır. Yangın merdiveni komple silikon esaslı dış cephe boyası ile boyanmıştır. Zemin kat pencerelerine demir korkuluk yapıp boyanmıştır. Yine zemin katta koridorda demir profil bölme yapıp boyanmıştır. Birinci katta bir adet oda bölünerek bilgi işlem kumanda odasına dönüştürülmüştür.



2009 YILI MEKANİK TESİSAT İMALATLARI

- ✿ K lt r ve Sanat Evinin mutfağına doęalgaz hattı  ekilmesi.
- ✿ Uygulamalı Bilimler Fak ltesi, Fen-Edebiyat Fak ltesi, Z beyde Hanım Saęlık Meslek Y ksekokulu bina tadilatlarının yaptırılması.
- ✿ Kazan Dairesi gaz emisyonlarının yaptırılması, br l r arızalarının giderilmesi.
- ✿ Sosyal Tesis binasının m nferit ısıtılması sisteminin kurulması.
- ✿  niversitemiz genel mekanik tesisat arızalarının giderilmesi.

TAŞIT ALIMI

Hizmet Aracı	1 Adet	29.000,00	B�T��E
Otob�s 27+1	1 Adet	87.000,01	H�BE
Otob�s 39+1	1 Adet	170.000,00	H�BE
TOPLAM		286.000,01	

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Proje No: 2009H032030 Proje No: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2008H034160								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2009-2009								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt –Proje ve								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ							(Cari Fiyatlarla, Bin TL)		
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2009	200			200		-96,00		104,00	100

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

2009 Yılı ödeneği 200.000.-TL olup, ödeneğin 96.000.-TL si Kampüs Altyapı İkmal İnşaatına aktarılması sonucu yıl sonu kullanılabilir ödeneği 104.000.-TL olmuştur.

2010 yılı içerisinde yapımı planlanan Eğitim Fakültesi Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası Proje Hizmetleri için ihale yapılarak;

Eğitim Fakültesi Proje Hizmetleri Alım İşi için 68.000.-TL+KDV, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Proje Hizmetleri Alım İşi için 15.000.-TL+KDV olarak sözleşmeleri imzalanmıştır.

İmzalanan sözleşme kapsamında Eğitim Fakültesi Binasının ihtiyaç programına göre Mimari, Betonarme, Mekanik Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Zemin Etütleri yaptırılmış ve maliyetleri hesaplatılmıştır.

Yine aynı şekilde Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının Mimari, Betonarme, Mekanik Tesisatı, Elektrik Tesisatı projeleri yaptırılmış ve maliyeti hesaplatılmıştır.

2009 yılı içerisindeki kullanılabilir 104.000.-TL ödenek yıl sonu itibariyle harcanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Proje No: 1994H032370 Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER								
NUMARASI	1994H032370								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2011								
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT (11.000+5.000M2) .+ DONATIM.								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2009	28000	19351		3870				3870,00	100
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									
1-İLGİLİ DAİRE	:Niğde Üniversitesi				Niğde Üniversitesi				
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Niğde Üniversitesi Rektörü b) Müteahhit: Kemal İnş.Tic. Ltd.Şti				a) Niğde Üniversitesi Rektörü b) Müteahhit Özyay İnş.Tic. Ltd.Şti.				
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Kütüphane Binası İnşaatı				Yabancı Diller Yüksekokulu İnşaatı				
4-KEŞİF BEDELİ	: 4.536.136,40 TL				3.959.769,55 TL				
5-İHALE TENZİLATI	-				-				
6-İHALE BEDELİ	: 2.899.000,00 TL				3.283.000,00 TL				
7-İHALE TARİHİ	: 01.07.2009				05.05.2008				
8-MUKAVELE TARİHİ	: 04.09.2009				22.12.2008				
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol 02.09.2009				Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol 16.12.2008				
10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ	-				-				
11-YER TESLİM TARİHİ	: 09.09.2009				23.12.2008				
12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	: 09.09.2009				-				
13-İŞİN BİTİM TARİHİ	: 17.11.2011				-				
14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	-				-				
15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	-				-				
16-KEŞİF ARTIŞI	-				-				
17-TOPLAM KEŞİF	-				-				
18-)TOPLAM KAPALI ALANI	: 5562 m2				(+5.235 m ²				
19-) FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 20				% 100				
20-) İNŞAATIN DURUMU	-				-				

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNŞAATI:



Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatı A-B-C bloklardan oluşmakta olup, toplam proje alanı 5235 m² dir. Yatırım programında devam eden inşaatın tüm blokları tamamlanarak 2009-2010 öğretim yılı 2. yarıyılında hizmete alınacaktır. Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatının 2009 yılı toplam ödeneği 3.370.000,00 TL dir. Gerçekleşen harcamaya göre ayrılan ödeneğin tamamı harcanmıştır.

2009 yılı inşaat sezonunun başlaması ile temeli atılıp, drenaj ve yalıtımları yapılan Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun betonarme karkası 2009 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır.

İnşaat imalatlarından; binanın dış duvarlarına XPS köpük ısı yalıtım levhaları ile kaplama yapılmış, çatısı trapez alüminyum çatı örtüsü ile kaplanmış yağmur olukları ile yağmur

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



indirme borularının montajı yapılmıştır. Blokların tüm pencereleri PVC profilden imal edilip yerlerine takılmış, idarece onanmış projesine göre ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile giydirme cephe yapılmıştır. Bina iç duvarları yerden 1 m yüksekliğe kadar cam mozaik ile diğer kısımları ise saten alçı ile kaplanıp boyanmıştır. Tüm WC ve lavaboların duvar ve yer döşemesi seramikleri tamamlanmıştır. Koridorlar parlak granit-seramik, diğer alanlar mat granit-seramik ile kaplanmıştır. Merdivenler renkli mermer plaklarla kaplanıp paslanmaz çelik korkuluklar takılmıştır. Binanın zemin katında 60*60 ebadında delikli alüminyum asma tavan imalatı yapılmış, asansör kapı girişleri renkli mermer ile kaplanmıştır. Tüm derslik ve büroların kapı kasaları bükme sacdan yapılmış arkaları beton harcı ile doldurulmuş, antipasla paslanmaya karşı boyanıp yağlı boya ile de boyanmıştır.

C blokta projesinde belirtilen yerlerde PVC kaplı yükseltilmiş döşeme yapılmış olup, 114 kişilik sinema salonunun çelik konstrüksiyonu yapılmıştır. Sinema salonunun alt döşeme kaplaması yapıp üzeri PVC ile döşenmiştir. Duvarları lambri ile kaplanıp tavanı ise ses yalıtımlı asma tavan ile kaplanmıştır. Teknik şartnamesindeki tanıma uygun 114 adet sinema koltuğu monte edilmiştir. Binanın dış kısmına tretuvar yapıp wash beton ile döşeme kaplaması yapılmıştır. Çevre düzenlemesi yapılmış olup binanın arka cephesine 62 araçlık otopark tanzim edilip kilitli parke döşenmiştir. Binanın bütün elektrik ve makine tesisat işleri de tamamlanarak bina hizmete hazır hale getirilmiştir.



KÜTÜPHANE BİNASI İNŞAATI:



2009 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 04.09.2009 tarihinde Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşmesi imzalanmıştır. 09.09.2009 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Binanın temel kazısı yapılmış ve temeli atılmıştır. İki bloktan oluşan inşaatımızın ilk tabliyesi yapılmıştır. İnşaatımız % 20 seviyesindedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Proje No: 1993H031970 Proje Adı: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN ADI			FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI						
NUMARASI			1993H031970						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			1993-2010						
KARAKTERİSTİĞİ			İNŞAAT 9200m ²						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	TOPLAM	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2009	25.000	18.326		1.500		400		1.900	100
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE	:Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	: a) Niğde Üniversitesi Rektörü b) Müteahhit: Süer OKMAN
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Fen- Edebiyat Fakültesi İnşaatı
4-KEŞİF BEDELİ	: 58.000.-TL
5-İHALE TENZİLATI	: %10.50
6-İHALE BEDELİ	: 51.910.-TL
7-İHALE TARİHİ	: 28.12.1993
8-MUKAVELE TARİHİ	: 04.02.1994
9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ	: 03.06.1993
10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ	: 23.06.1994
11-YER TESLİM TARİHİ	: 25.07.1994
12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 25.07.1994
13-İŞİN BİTİM TARİHİ	: 15.11.1997
14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: 15,57-TL
15-SÜRE UZATMI İŞ BİTİM TARİHİ	: 15.12.2009
16- KEŞİF ARTIŞI	: % 30+%33(Bakan onayı)
17- TOPLAM KEŞİF	: 95.540-TL
18-)TOPLAM KAPALI ALAN	: 23.000 m ²
19-) FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: Genel : % 90 C3 Blok % 65
20-) İNŞAATIN DURUMU	:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



2009 yılı içerisinde C3 bloğunun B kısmı, C kısmı ve D kısımlarının zemin kat, birinci , ikinci, üçüncü ve dördüncü kat kalıpları yapılmış ve betonu atılmıştır. Tüm binaya ait iç ve dış duvarlar bitirilmiştir. Kapı kasaları ve pencere kör kasaları yerlerine takılmıştır. Tavan, iç ve dış sıvalar yapılmıştır.

Binanın oturtma çatısı yapılarak, atika duvar, sıva eteği, kalkan duvar etek ve üst kaplama imalatları bitirilmiştir.



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Proje No: 1994H032350 Proje Adı: KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI								
NUMARASI	1994H032350								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2010								
KARAKTERİSTİĞİ	YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇE KLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAM A GİRİŞ YILI									
2009	25000	19780		1700		1200 96 168,00		3164,00	100

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE

:Niğde Üniversitesi

2-SÖZLEŞME TARAFLARI

: a) Niğde Üniversitesi Rektörü

b) Müteahhit: Özbek İnş. Tic. Ltd. Şti.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

: Niğde Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı

4-KEŞİF BEDELİ

: 4.000.000.-TL

5-İHALE TENZİLATI

: %22.87

6-İHALE BEDELİ

: 3.085.200.-TL

7-İHALE TARİHİ

: 10.10.2001

8-MUKAVELE TARİHİ

: 11.12.2001

9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ

: 14.12.2001

10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ

: .../.../....

11-YER TESLİM TARİHİ

: 01.04.2002

12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ

: 01.04.2002

13-İŞİN BİTİM TARİHİ

: 15.12.2009

14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI

: 462,78.-TL

15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ

: 02.07.2008

16-KEŞİF ARTIŞI

: % 30

17-TOPLAM KEŞİF

: 5.200.000.-TL.

18-)TOPLAM KAMPÜS ALANI

: 2.335.655 m2

19-) FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 85

20-) İNŞAATIN DURUMU

:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



- ✿ Üniversitemiz merkez kampüs, Niğde-Bor karayolu cephesine betonarme 1900 m uzunluğunda çevre duvarı yapılarak duvar yüzeyine belirli aralıklarla üniversite logosu yerleştirilmiştir.
- ✿ Üniversite kampüs giriş kapısı çevre düzenlemesi ve peyzajı yapıldı. Peyzaj kapsamında 3.161 m² beton parke ile yol kaldırım çalışması ile 17.176 m² çim alan oluşturuldu. Ayrıca iki adet havuz ve çim alanın bitkilendirme ve ağaçlandırması yapılmıştır.



- ✿ Kampüs alanına Milli Savunma Bakanlığı standartlarında 20x20 m ebadında bir adet Heliport yapılmıştır.
- ✿ Anıtın, arka ve ön kısmına beton parke ile ring yolu ve kaldırım, ayrıca Milli Piyango Yurt yoluna da iki taraflı beton parke kaldırım yapılmıştır. Bu imalatlara ait toplam beton parke alanı 6.426,8 m² toplam bordür ise 4.414,5 m dir.
- ✿ Üniversitemiz kampüs alanına 110 adet çöp kovası, 12 adet otobüs durağı ve 100 adet oturma bangı yapılarak muhtelif yerlere yerleştirilmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



- ✿ Kampüs içine yağmur suyu toplama kanalları ve üzerine özel döküm ızgaralar yapılmıştır.
- ✿ Anıt sahasına mermer Atatürk heykeli ve duvar rölyefleri yapılmıştır.
- ✿ Rektörlük Binası A Blok zemin katına süs havuzları yapılmıştır.
- ✿ Arıtma tesisi etrafına çevre düzenlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda 534,70 m² beton parke ve 227,30 m beton bordür ile yol yapılmıştır. Ayrıca Arıtma Tesisine ek olarak Jeneratör Binası yapılmıştır.
- ✿ Isı Merkezinde Hidroforların bulunduğu odaya ısı yalıtımı yapılmıştır.



2009 YILI ELEKTRİK ALTYAPI İMALATLARI

- ✱ Kampüs için OG havai hatlarının yeraltına alınarak Ring tesisatı yapılması,
- ✱ Yabancı Diller Yüksekokulu, Kütüphane Binası, Eğitim Fakültesini beslemek amacıyla 1000 KVA gücünde modüler trafo merkezi kurulması,
- ✱ Kampüs OG Ring dağıtımı için KÖK kurulması,
- ✱ Mevcut tüm havai hat ve direklerin demontajlarının yapılması,
- ✱ Milli Piyango yurduna giden yol ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünün aydınlatılmasının yapılması,
- ✱ Kampüs giriş kapısı , güvenlik duvarları ile şenlik alanının aydınlatılmasının yapılması,
- ✱ Fen- Edebiyat Fakültesi Anfisine UPS hattı tesis edilmesi,
- ✱ Arıtma Tesisine telefon ve fiber optik hat tesisi edilmesi işleri tamamlanmıştır.



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



2009 YILI MEKANİK TESİSAT İMALATLARI

- ✿ Nizamiye kapısı, orta refüjler, Anıt kapısı yol kenarı çim alanlarına sulama tesisatı çekilmesi,
- ✿ Kampüs içme suyu hatlarının galeri içerisine alınması,
- ✿ YADEM binasına içme suyu hattı çekilmesi,
- ✿ YADEM binası mekanik tesisat imalatlarının yaptırılması,
- ✿ B istasyonu doğalgaz hattına küçük debi tüketim sayacı takılması işleri tamamlanmıştır.



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Proje No: 1994H032380 Proje Adı: MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ								
NUMARASI	1994H032380								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2010								
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT (7300 m ²) + DONANIM								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2009	16000	10514		2700		-1600		1100	100
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

- 1- İLGİLİ DAİRE : Niğde Üniversitesi
- 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Niğde Üniversitesi Rektörü
b) Beyazıt Mühendislik İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti.
- 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : N.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1, E1,E3,E4.1 (Tekkol) Bloklar İnşaatı
- 4- SÖZLEŞME BEDELİ : 3.448.000,00-TL
- 5- İHALE TARİHİ : 20.05.2009
- 6- SÖZLEŞME TARİHİ : 27.08.2009
- 7- ÖN MALİ KONTROL TARİHİ : 24.08.2009
- 8- YER TESLİM TARİHİ : 31.08.2009
- 9- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR. : 31.08.2009
- 10- İŞİN BİTİM TARİHİ : 28.12.2011
- 11- GÜNLÜK GECİKME CEZASI : Sözleşme Bedelinin % 0.03 (1034,40 TL)
- 12- SÖZLEŞME BEDEL ARTIŞI : --
- 13-TOPLAM KAPALI ALANI : 7296,13 m2
- 14- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 27
- 20-) İNŞAATIN DURUMU :

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1, E1, E3, E4,1 (Tekkol) Bloklar İnşaatının 2009 yılı içerisinde yapım işi ihalesi yapılmış olup, 27.08.2009 tarihinde Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmesi imzalanmıştır.

A1, E1, E3, E4,1 (Tekkol) bloklar projesine göre kazı çalışmaları, temelleri, su basman perdeleri, temel iç dolguları, su basman perdesindeki düşey su yalıtımı için tecritli şap, elastomer su yalıtımı yüzey ve koruyucu duvar imalatları tamamlanmıştır.

Bloklar arasında kalan bahçe içerisinde yağmur suyu drenaj hatları ve rögarları yerleştirilerek bahçe iç dolguları tamamlanmıştır.

E3 Blok zemin + 1+2. kat tabliyeleri yapıp karkası tamamlandı.

E1 blok zemin + 1+2. kat tabliyeleri yapıp karkası tamamlandı.

E4,1(Tekkol) blok zemin +1+2. kat tabliyeleri karkası tamamlandı.

A1 bloğun su basman seviyesindeki imalatları tamamlanmıştır.

2009 Yılı Yatırım ödeneği 2.700.000. TL olup, bu ödeneğin 1.200.000. TL si Kampüs Altyapı İkmal İnşaatına, 400.000.TL si Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatına olmak üzere 1.600.000. TL si bu projelere aktarılmıştır.

Kullanılabilir ödeneği 1.100.000. TL olup yıl sonu itibariyle bu ödeneğin tamamen harcanmıştır.



2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Proje No: 2001H050040 Proje Adı: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	SPOR								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İNŞAATI								
NUMARASI	2001H050040								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2001-2009								
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT (Spor Salonu)								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2009	10500	8500		2000				2000	100

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE

:Niğde Üniversitesi

2-SÖZLEŞME TARAFLARI

: a) Niğde Üniversitesi Rektörü

b) Müteahhit: Kemal İnş. Tic. Ltd. Şti.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

: Niğde/Bor Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı

4-KEŞİF BEDELİ

: 5.422.376,00-TL

5-İHALE TENZİLATI

: %10,13

6-İHALE BEDELİ

: 4.873.089,31-TL

7-İHALE TARİHİ

: 26.08.2002

8-MUKAVELE TARİHİ

: 26.09.2002 / 09804

9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ

: 30.09.2002 / 1782-25940

10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ

: 02.10.2002

11-YER TESLİM TARİHİ

: 04.10.2002

12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ

: 04.10.2002

13-İŞİN BİTİM TARİHİ

: 31.12.2005

14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI

: 730,96TL

15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ

: 24.07.2010

16-KEŞİF ARTIŞI

:---

17-TOPLAM KEŞİF

: 5.422.376,00-TL

18-)TOPLAM KAPALI ALANI

: 4550 m²


19-) FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 70

20-) İNŞAATIN DURUMU

:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

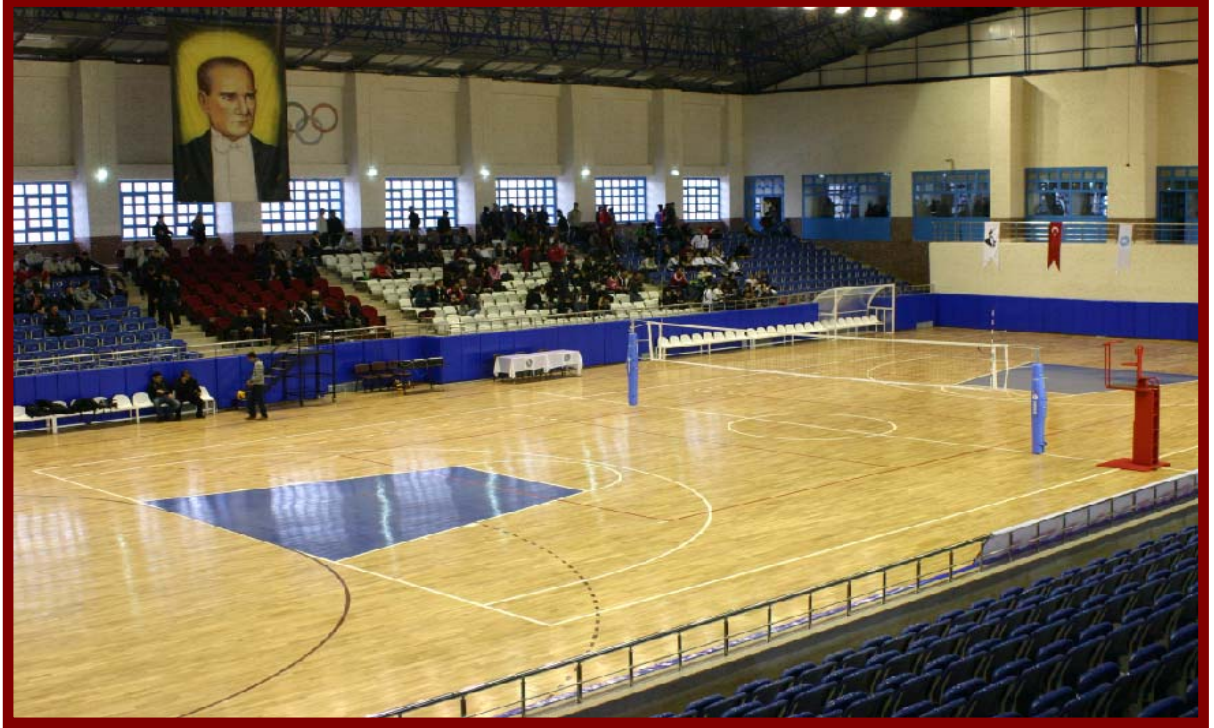

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası kampüsünde bulunan Kapalı Spor Salonunun çevre düzenlemesi, güvenlik kulübesi, çevre ihata duvarı imalatları yapılmıştır. Salon kısmında makine ve elektrik tesisatı imalatları tamamlanmış olup güneş enerjisi düş sistemleri kurularak Kapalı Spor Salonu hizmete açılmıştır. Yine aynı kampüste (23x40) 920 m2 açık tenis kortu yapımına başlanarak tesisin altyapısı,kafes ihata çevresi ve saha aydınlatma imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca Fitness salonu tadilatları yaptırılmıştır.

Merkez yerleşkede $130 \times 76 = 10.000$ m2 inşaat alanı içerisinde (26x48) 1248 m2'lik 4 adet çok amaçlı spor sahalarına başlanmıştır. Tesislerin altyapı çalışmaları, kapalı müştemilatlar (soyunma, duş, wc ler) kısmının kabası tamamlanmıştır. Açık Spor Kompleksinin otopark alanı $(130 \times 15) = 1950$ m2 tamamlandı. $50 \times 4,5 = 225$ m2 kapalı alana sahip toplam 450 m2 iki blok Sosyal Tesislerin kabası tamamlandı. Salonların altyapısı,

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



çevre ihata kafes, saha aydınlatma direkleri montajı yapılarak aydınlatma projektörleri montajı tamamlanmıştır. Ayrıca makine ve elektrik tesisatı alt yapı çalışmaları bitirilmiştir.



Aynı proje kapsamında Ulukışla Meslek Yüksekokulu Kampüs alanı içerisinde (26x48) = 1248 m² açık alanlı 21x4 = 84 m² soyunma, duş ve wc odası müştemilatlı çok amaçlı spor sahasının saha kazısı yapılarak temelleri atılmıştır.

2009 Yılı Yatırım ödeneği 2.000.000.- TL olup, yıl sonu itibarı ile ayrılan ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



4- ÖNERİLER

- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların, dikkate alınarak talebin aynen karşılanması gerekir.
- Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracaktır.
- Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır.
- Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		107.532			76.471			14.500						15.592
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	8		107.532			76.471			14.500						15.592

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



2009 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM=4

Kuruluş Adı : NİĞDE ÜNİVERSİTESİ																
Sektör Adı : Eğitim																
Bim No(1)	YSK (2)	PROJE NO (3)	PROJENİN ADI (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2008 Kümülatif (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
5796	464	2009H032030	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2009	Niğde	0	200	0	0	0	200	-96			104
5797	464	1994H032370	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2011	Niğde	0	28.000	19.351	0	0	3.870				3.870
5798	464	1993H031970	Fen Edebiyat Fakültesi (25700m2)	ÖZEL BÜTÇE	2010	Niğde	0	25.000	18.326	0	0	1.500	+400			1.900
5799	464	1994H032350	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2010	Niğde	0	25.000	19780	0	0	1.700	+1464			3.164
5800	464	1194H032380	Müh. Ve Mim. Fakültesi (24.000m2)	ÖZEL BÜTÇE	2010	Niğde	0	16.000	10514	0	0	2.700	-1600			1.100
5801	464	2009H032040	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2009	Niğde	0	2.832	-	0	0	2.530	+702			3.197
5802	464		Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2009	Niğde	0	-	0	0	0	302				257
5253	464	2001H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2009	Niğde	0	10.500	8.500	0	0	2.000				2.000
TOPLAM								107.532	76.471	0	0	14.500	870			15.592
