



**NİĞDE ÖMER
HALİSDEMİR
ÜNİVERSİTESİ**

**2021
YILI**

**YATIRIM
PROGRAMI
İZLEME ve
DEĞERLENDİRME
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

NİĞDE, Mart 2022

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME	KALAN ÖDENEK
HAZİNE	20.502.000	25.501.999	15.356.989	10.145.010
ÖZGELİR	0	0	0	0
NET FİNANSMAN	0	5.400.000	4.145.181	1.254.819
ŞARTLI BAĞIŞ	0	128.633		128.633
GENEL TOPLAM	20.502.000	31.030.632	19.502.170	11.528.461

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2021 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- ✕ Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- ✕ Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 80 seviyesine getirilmesi,
- ✕ Kampüs Alt Yapı Tesislerinin 6.kısım ihalesinin yapılması,
- ✕ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesinin yapılması,
- ✕ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,
- ✕ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımların alınması,
- ✕ Kütüphane Daire Başkanlığınca basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması,

Gerçekleşen;

- ✕ Merkezi Araştırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıştır.

- ✖ Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 85 seviyesine getirilmiştir.
- ✖ Kampüs Altyapı Tesisleri 6. Kısım ihalesine iki kere çıkılmış ancak iki ihalede iptal edilmiştir.
- ✖ Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerin tadilat ve onarım işleri tamamlanmıştır.
- ✖ Dış Hekimliği Fakültesinin, eğitim-öğretim faaliyetleri ile klinik çalışmaları için gerekli olan tıbbi cihaz ve ekipmanlar alınmıştır.
- ✖ Bor Sağlık Bilimleri Fakültesine yeni açılan Beslenme ve Diyetetik bölümü için ders pratiğinde gerekli olan laboratuvar cihazları ve mutfak ekipmanları alınmıştır.
- ✖ Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon bölümüne eğitim ve öğretim faaliyetlerinde gerekli olan laboratuvar cihazları alınmıştır.
- ✖ İletişim Fakültesine eğitim-öğretim alanında kullanılmak üzere fotoğrafçılık malzemeleri ve ekipmanları alımı ile tüm birimlerin büro mefruşatları ve donatım malzemeleri alınmıştır.
- ✖ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımlar alınmıştır.
- ✖ Basılı ve elektronik yayınlar satın alınmıştır. Elektronik yayın veri tabanlarına abone olunarak Üniversitemizin bilgiye erişim kapasitesi artırılmıştır.


1.4 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2021 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 20.502.000.TL iken, 5018 sayılı kanunun 40. maddesi uyarınca sağlık merkezi yapılmak üzere 2019 yılında ödenek kaydedilen 449.597.TL şartlı bağıştan kalan 128.632.TL, 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 2.500.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 5.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu sermaye ödeneği toplamı 31.030.632.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 19.502.170. TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.252.000,00	9.752.000,00	9.030.067,77	92,60
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	200.000,00	500.000,00	404.530,91	80,91
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	17.050.000,00	17.278.632,59	6.904.990,19	39,96

6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.000.000,00	3.500.000,00	3.162.581,92	90,36
	GENEL TOPLAM	20.502.000,00	31.030.632,59	19.502.170,79	62,85

HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) *

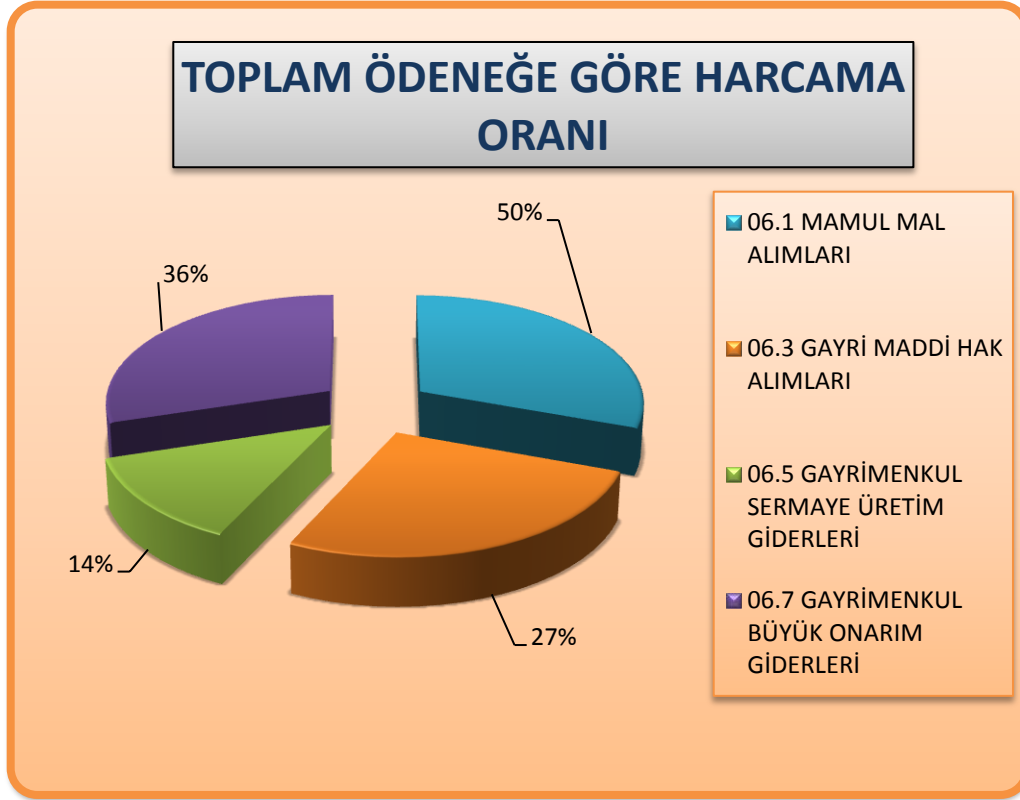

2- 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2021H03-168395 Proje Adı: Muhtelif İşler

2021 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 1.450.000.TL'dir. 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/5 maddesi uyarınca 10.300.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 5.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu ödeneği 11.750.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 10.992.658.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Makine-Teçhizat Alımları

2021 yılında makine-teçhizat alımları için 250.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 2.500.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı,5/3 maddesi uyarınca 5.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu ödeneği 7.750.000. TL olmuştur. Ödeneğin 7.425.547,15 TL'si harcanmış, 324.452,85.TL ödenek harcanamamıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Tablet Bilgisayar Alımı	15 Adet	16.496,40
	İnteraktif Yüzey Dönüştürücü Ekipman Alımı	80 Adet	34.668,40
	Ağ Erişim Sistemi Ekipman Alımı	25 Adet	46.669,00
	Büro Mefruşatı Alımı	6 Adet	47.200,00
	Tablet Bilgisayar Alımı	25 Adet	26.815,50
	Dezenfektan İlaçlama Cihazı Alımı	8 Adet	9.072,00
	SSD Kart Alımı	79 Adet	43.845,00
	Büro Mefruşatı Alımı	20 Adet	18.036,00
	E-Sertifika ve Mini Kart Okuyucu Alımı	340 adet	36.209,48
	Kurumsal Şifreleme Sertifikası ve Mini Kart Okuyucu Alımı	4 adet	9.581,60
	Binicili Yer Yıkama Makinesi Alımı	1 Adet	71.011,36
	Klima Alımı	1 Adet	15.045,00
	Güvenlik Devriye Kalem Alımı	1 Adet	2.511,46
	Büro İşyeri Makine Teçhizat Alımı	6 Adet	979,4
	Bilgisayar Alımı	51 Adet	474.948,46
Tıp Fakültesi			
	Duvar Tipi Otostop ve Oftalmoskop Seti Alımı	3 Adet	27.540,00
	Dijital Kürsü Alımı	6 Adet	87.359,13
	Büro Mefruşatı Alımı	275 Adet	79.350,94
Diş Hekimliği Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	8 Adet	25.650,00
	Diş Üniteleri Enstrüman Seti ve Lateral Sefalometri Ataçmanı	11 Adet	730.538,00
	Bilgisayar Ekipman Alımı	18 Adet	15.579,54
	Hasta Simülasyon Sistemi Alımı	21 Adet	909.877,74
	Hasta Simülasyon Sistemi Alımı	4 Adet	178.697,93
	Hasta Simülasyon Sistemi Alımı	21 Adet	907.518,19
	Hasta Simülasyon Sistemi Alımı	21 Adet	907.518,19

	Röntgen Cihazı ve Otoklav Cihazı Alımı	5 Adet	486.972,00
	Bilgisayar Alımı	7 Adet	52.286,46
	Büro Mefruşatı Alımı	133 Adet	119.067,98
	Buhar Sterilizatörü ve Yıkama Dezenfeksiyon Kurutma Makinesi	2 Adet	419.880,42
	Binicili Yer Yıkama Makinesi Alımı	2 Adet	134.365,21
Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi			
	Makine Teçhizat ve Laboratuvar Malzemesi Alımı	6 Adet	73.927,00
	Makine Teçhizat ve Laboratuvar Malzemesi Alımı	86 Adet	322.175,40
	Makine Teçhizat ve Laboratuvar Malzemesi Alımı	4 Adet	73.868,00
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi			
	Bilgisayar Alımı	1 Adet	9.498,36
Fen Edebiyat Fakültesi			
	Bilgisayar Alımı	5 Adet	35.656,75
Eğitim Fakültesi			
	Bilgisayar Alımı	3 Adet	21.394,05
İletişim Fakültesi			
	İş İstasyonu, Bilgisayar ve Monitör Alımı	10 Adet	57.895,49
	Fotoğraf Makinesi ve Ekipmanları Alımı	50 Adet	336.300,00
	Bilgisayar Alımı	2 Adet	14.262,70
	Büro Mefruşatı Alımı	8 Adet	9.259,93
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			
	Amfi Sıra Alımı	44 Adet	97.734,00
	Bilgisayar Alımı	4 Adet	28.525,40
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu			
	Fotoğraf Makinesi ve Ekipman Alımı	6 Adet	21.300,18
Spor Bilimleri Fakültesi			
	Bilgisayar Alımı	2 Adet	14.262,70
Mimarlık Fakültesi			
	Bilgisayar Alımı	3 Adet	21.394,05
Güzel Sanatlar Fakültesi			
	Şövale Alımı	30 Adet	11.859,00
	Büro Mefruşatı Alımı	70 Adet	18.007,16
	Bilgisayar Alımı	2 Adet	14.262,70
Mühendislik Fakültesi			
	Bilgisayar Alımı	3 Adet	21.394,05
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Bilgisayar Alımı	1 Adet	9.498,36
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Bilgisayar Alımı	2 Adet	14.262,70

Yabancı Diller Yüksekokulu			
	Bilgisayar Alımı	1 Adet	7.131,35
Sağlık Bilimleri Enstitüsü			
	Bilgisayar Alımı	1 Adet	7.131,35
	Büro Mefruşatı Alımı	16 Adet	12.880,82
Sosyal Bilimler Enstitüsü			
	Bilgisayar Alımı	4 Adet	28.525,40
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı			
	Bilgisayar Alımı	2 Adet	14.262,70
Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu			
	Platform Yapımı	1 adet	7.670,00
	Makine Teçhizat ve Laboratuvar Malzemesi Alımı	13 Adet	98.382,60
	Makine Teçhizat ve Laboratuvar Malzemesi Alımı	2 Adet	87.534,00
GENEL TOPLAM			7.425.547,15

Yazılım Alımları

2021 yılında yazılım alımları için 200.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 300.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 500.000.TL olmuştur. Ödeneğin 404.530,91.TL'si harcanmış, 95.469,09.TL ödenek harcanamamıştır.

Alımın Yapıldığı Birim	Alınan Yazılımlar	Tutarı (KDV dahil)
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	Logsign Lisansı Alımı	18.290,00
	Sanallaştırma Yönetimi Lisansı Alımı	5.192,00
	Çevrimiçi Toplantı Lisansı Alımı	12.810,32
	SSL Sertifikası Alımı	10.078,38
	DXperience Programı Alımı	30.585,60
	Web Sayfası Şablon Programı Alımı	12.484,40
	Sanallaştırma Lisans Alımı	23.600,00
	Microsoft Lisans Alımı (Açık İhale Usulü)	244.290,21
	Antivirüs Lisans Alımı	47.200,00
Genel Toplam		404.530,91

Büyük Onarım

2021 yılında büyük onarımlar için 1.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 2.500.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 3.500.000.TL olmuştur. Ödeneğin 3.162.581,92.TL'si harcanmış, 337.418,08.TL ödenek harcanamamıştır.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir;

NIĞDE İLİ CULLAZ SOK 24 PARSELDE BULUNAN TARİHİ EVİN RESTORASYON YAPIM İŞİ: 06.07.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan 413.440,91,00 TL bedelli işimize, 2021 yılında 174.810.TL ödeme yapılarak 23.02.2021 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



NIĞDE İLİ CULLAZ SOK. 9 VE 25 PARSELLERDE BULUNAN TARİHİ EVLERİN RESTORASYON YAPIM İŞİ : 04.09.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan 1.716.907,00 TL bedelli işimize, 2021 yılında 1.341.952.TL ödeme yapılarak 20.12.2021 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) YAPIM İŞİ: 30.11.2021 tarihinde ihalesi yapılarak 16.12.2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış ve aynı tarihte yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 165.000,00 TL olup, yapımı devam etmektedir.

Büyük Onarım Kapsamında Yapılan İşler

HARCAMANIN ADI	TUTARI
1-Dış Hekimliği Fakültesi yangın tesisatı onarım ve tadilat işi	19.447
2-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi	10.017
3-UNİKOP Enerji Evi Binası içerisinde PVC doğrama yapım işi	3.223
4-Enerji Evi Çevre Düzenlemesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna ait Uygulama Oteline mutfak doğalgaz hattı çekilmesi ve Türk Musikisi Konservatuvar Binası pencere onarımları	38.374
5-Rektörlük ve Bağlı Birimler asansör bakım onarım işi.	23.099
6-Rektörlük ve Bağlı Birimler elektrik bakım onarım işi.	9.093
7-Dalgıç pompa ve sistemlerinin bakım onarım işi	21.948
8-Mimarlık Fakültesi asansör periyodik bakımı ve onarım işi	5.213
9-Sabiha Şahenk Kütüphanesi asansör periyodik bakım işi	2.761
10- Rektörlük Hizmet Binası asansör periyodik bakım işi.	3.682
11-Rektörlük ve Bağlı Birimler kazan bakım onarım işi	45.725
12-Mühendislik Fakültesi asansör periyodik bakım ücreti	4.673
13-Dış Hekimliği Fakültesi asansör periyodik bakım işi	920
14- Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarındaki seramiklerin bakım ve onarım işi	4.721
15-Rektörlük Hizmet Binası güvenlik kamera sistemi ve enerji evi fiber hattı yapım işi.	45.021
16-Rektörlük ve Bağlı Birimlerde kullanılan jeneratör gruplarının bakım ve onarım işi.	46.846
17-Mobese sistemi panolarına ulaşım amaçlı yol yapımı, Dış Hekimliği Fakültesi demir ve boya işleri, Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu engelli rampası korkuluk yapım işleri	30.951
18-Üniversitemiz Yerleşkelerinde mekanik tesisat bakım ve onarım işi.	14.213
19-Kesintisiz güç kaynakları bakım ve onarım işi.	17.700
20-Eğitim Fakültesi hizmet binaları asansör periyodik bakım ücreti	4.248
21-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yangın algılama sistemleri periyodik bakım işi	2.360
22- İletişim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi tadilat ve onarım işi	36.817
23-Üniversitemiz yerleşkelerinin pompa, hidrofor, su deposu, motor tamiri ve sulama sistemleri bakım onarım işi	44.457
24- Tıp Fakültesi ve Spor Salonu trafo çevresi tel çit ve yol yapım işi	46.058
25-Rektörlük ve Bağlı Birimler elektrik bakım onarım işi	46.879
26-Dış Hekimliği Fakültesi binasına ve kapalı yüzme havuzu binasına ait kırılan camların yenisi ile değiştirilmesi işi	4.643
27-Merkez Kampüs alanında 2 adet sondaj yapım işi	46.610
28- Trafo ve kesici ölçü kabinleri bakım işi	15.364
29-Üniversitemiz Merkezi Yerleşkelerinde klima, klima gazı ve bitki büyütme kabinlerine bakım onarım işi	32.804

30-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi	7.505
31-Eğitim Fakültesi 1. Etap inşaatındaki dersliklerin boya ve tadilatı	46.020
32-Rektörlük ve Bağlı Birimler mekanik tesisat bakım ve onarım işi	4.721
33-İş makinası kiralama işi	4.425
34-Cullaz Sokak 9 ve 25 parsellerde bulunan üniversitemize ait tarihi evlerin restorasyon yapım işi ikmal inşaatı	1.341.952
35- Kongre Binası, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi andezit döşeme tadilatı ve Mimarlık Fakültesi seramik onarım işi	14.372
36- Kampüs teli giriş yollarının çelik dubalarla kapatılması işi	5.310
37-Rektörlük ve Bağlı Birimler elektrik bakım onarım işi	46.575
38-Dalgıç pompa ve sistemlerinin bakım onarım işi	10.119
39-Güzel Sanatlar Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Mimarlık Fakültesi ve Sabiha Şahenk Kütüphanesi binalarının çatı tadilatı işi	33.550
40-Dış Hekimliği Fakültesi ve İletişim Fakültesi Binalarının tadilat işleri	39.432
41-Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında yapılan yapım işleri	46.372
42-15 Temmuz Milli İrade meydanında bulunan mazgalların tadilat ve onarımı ile çevre düzenlenmesi işi	46.071
43-Sabiha Şahenk Kütüphanesi asansör periyodik bakım işi	2.761
44-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi	7.505
45-Mimarlık Fakültesi asansör periyodik bakımı ve onarımı işi	3.109
46-Dış Hekimliği Fakültesi asansör periyodik bakım işi	850
47-Dış Hekimliği Fakültesi asansör periyodik bakım işi	920
48-Merkez Yerleşke sulama sitemleri bakım ve onarım işi	31.093
49- Rektörlük hizmet binası asansör periyodik bakım işi	3.682
50- Çarşı Binası ve Güzel Sanatlar Fakültesi tadilat işleri	46.909
51- Cullaz Sok 24 parselde bulunan üniversitemize ait tarihi evin restorasyon yapım işi	174.810
52- Nanoteknoloji (Fotovoltaik) Araştırma ve Uygulama Merkezi	205.902
53- Sosyal Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi Binalarının dış cephe boya ve mantolama, Dış Hekimliği Fakültesi kilitli parke ile çevre düzenleme işlerinin yapılması	46.350
54-Ağaç nakliyesi için tır kiralama işi	3.544
55-İş makinası kiralama işi	4.295
56- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi zayıf akım tesisatı bakım onarım işi	46.490
57- Tıp Fakültesi çatı oluk buz engelleme sistemi yapım işi	46.964
58-Merkez Yerleşke Fakülte binalarının kazan, hidrofor, sirkülasyon pompaları arıza bakım onarım işi	13.576
59-Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım işi	7.505
60-Merkez yerleşke çevre aydınlatma direkleri (150w-250w armatürleri) bakım onarım işi	27.028
61- Rektörlük ve Bağlı Birimlerin muhtelif bakım onarım işleri yapılması	47.103

62-Mühendislik Fakültesi ve Sabiha Şahenk Kütüphanesi TSE eksikleri kapsamında asansör mavi etiket alımı ve onarım işi	15.859
63-Rektörlük giriş kat ve muhtelif birimlerin alüminyum pencere kapı vb. işlerin yapılması	22.243
64- Rektörlük ve Bağlı Birimlerin muhtelif çatı tadilat ve onarım işleri	27.538
65- Rektörlük ve Bağlı Birimlerin güvenlik kamera sistemleri bakım onarım işi	12.925
66- Rektörlük Binası doğalgaz regülatör değişimi	2.065
67-Dış Hekimliği Fakültesi bodrum kat boya işlerinin yapılması	46.820
68- İş makinası kiralama işi	2.313
69- Dış Hekimliği Fakültesi asansörü TSE periyodik muayenesi	371
70- Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yangın algılama sistemleri periyodik bakım işi	2.242
71- Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi yangın algılama sistemleri periyodik bakım işi	2.242
72- Merkez yerleşkede ki fakülteler ve rektörlük binası kombi, kalorifer bakım ve onarım işi	10.785
73- Dış Hekimliği Fakültesi kombi bakım onarım işi	1.475
74- Rektörlük ve Bağlı Birimler elektrik bakım onarım işi	21.017
GENEL TOPLAM	3.162.582

Proje No: 2021H03-168397 Proje Adı: Yayın Alımı

2021 yılında yayın alımları için 2.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 1.602.520,62.TL'si harcanmış 397.479,38.TL ödenek harcanamamıştır. 2021 yılı içerisinde aboneliği yenilenenler ve Ulakbim EKUAL projesi kapsamında serbest olarak sağlanan veri tabanları ile birlikte toplam 57 adet veri tabanına aboneliğimiz devam etmektedir. Yine 2021 yılı içerisinde kütüphanemize 946 adet Türkçe ve Yabancı basılı kitap satın alınmış, bağış olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar tarafından gönderilen 1098 kitap ile birlikte toplam 2.044 adet yayının veri girişi yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 2021 yılı içerisinde 297.553 e-kitaba, 31.352 e-dergiye ve 2.700.000 e-teze erişimimiz bulunmaktadır.

Yayın alımı kapsamında yapılan harcamalar aşağıda listelenmiştir.

S.NO	Harcamanın Adı	Tarih	Tutar (TL) KDV Dahil
1	E Dergi -Yaklaşım Yayıncılık	22.02.2021	600,00
2	İdeal Online	24.02.2021	38.318,02
3	E Dergi - Maliye Hesap Uzmanları	24.02.2021	600,00
4	E Dergi - Gelirler Kont. Der.Vergi Sor.	24.02.2021	500,00
5	Clinicalkey	25.02.2021	135.912,74
6	Hukuk Türk	08.03.2021	3.304,00
7	Oxford Journals	16.04.2021	75.832,02
8	ACS	16.04.2021	114.937,59
9	UpToDate	26.05.2021	72.617,72
10	Pnas	26.05.2021	12.127,97
11	EDS	26.05.2021	53.535,18
12	Basılı Kitap	01.06.2021	38.318,00
13	AYEUM	14.06.2021	38.500,00
14	Sobiad	14.06.2021	11.484,00
15	Turcademy	23.06.2021	30.354,15
16	RSC	07.07.2021	134.393,59
17	IOP	07.07.2021	95.929,02
18	Basılı Kitap	18.08.2021	40.063,04
19	SAGE	20.08.2021	128.317,13
20	ProQuest E-Book Central	20.08.2021	44.662,85
21	Vetis Yordam	06.10.2021	49.560,00
22	Psychotherapy	07.10.2021	10.412,32
23	ProQuest Cetral	07.10.2021	175.800,88
24	Basılı Kitap	15.11.2021	38.991,88
25	ECS Digital Library	19.11.2021	29.658,00

26	Education Source	02.12.2021	122.854,83
27	Turcademy	13.12.2021	104.935,69
GENEL TOPLAM			1.602.520,62

Proje No:2010K12-1315-39036 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2021 yılı bütçe ödeneği 2.000.TL olup, Ödeneğin tamamı “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” gereğince özel hesaba aktarılmıştır.

2021 yılından yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Harcamanın Adı	Tutarı
Kristal Külçe Üretme Sistemi	5.411.480,00
TOPLAM	5.411.480,00

Proje No: 2021H03-168393-168394 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN ADI			Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
NUMARASI			2021H03-168393-168394						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2021-2021						
KARAKTERİSTİĞİ			Etüt-Proje ve Müşavirlik						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2020 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2021				200		300		259	86
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

2021 yılı ödeneği 200.000.TL olup, 7258 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi uyarınca 100.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 300.000.TL olmuştur. Ödeneğin 258.951.TL. 'si harcanmış olup 41.049.TL ödenek harcanmamıştır.

Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri ile Kapalı Tenis Kortu (2 Adet) uygulama projelerinin hazırlanması için 82.541,00. TL harcanmıştır.

Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu uygulama projeleri revize edilmiştir. Söz konusu iş için 116.820,00. TL dahil harcanmıştır.

Spor Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Spor Salonu Zemin Etüt İş i için 4.720,00.TL harcanmıştır.

Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Kanalizasyon Hattı Proje Hazırlama İş i için 7.434,00.TL harcanmıştır.

Çok Amaçlı Spor Salonu Uygulama Projesi Hazırlanması iş i için 47.436,00.TL harcanmıştır.

Proje No: 1994H03-450 Proje Adı: Derslik ve Merkezi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ										
SEKTÖR			EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN;										
ADI			DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI							
NUMARASI			1994H032370							
YERİ			NİĞDE							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			1994-2023							
KARAKTERİSTİĞİ			Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası 6.500 m2+Zübeyde Hanım Sağlık YO ve Sağlık Hizmetleri MYO 14.481 m2							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)										
YILLAR		PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
		DIŞ	2020 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI		Revize								
1994		66.900	7.550		12.850		-		6.563	51
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.										

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası inşaatı devam etmekte olup Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu projesi ihalesi iptal edilmiştir. 2021 yılında 12.850.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 6.562.626. TL.si harcanmış olup, 6.287.374. TL ödenek harcanmamıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Konservatuvar Binası b) Müteahhit: Erdiñ YANIK - NG Ulaş İnşaat Müh. Hiz.San. ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	13.922.436,12 TL
5-İHALE BEDELİ	10.440.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	13.05.2021
7- MUKAVELE TARİHİ	07.07.2021
8-YER TESLİM TARİHİ	10.07.2021
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.07.2021
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	09.06.2022
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	6.264,00 TL
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	
15-SÖZLEŞME BEDELİ	10.440.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	6.500 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 85
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.

Proje No: 1994H03-450-14455 Proje Adı: KONSERVATUVAR İNŞAATI

2021 yılı ödeneği 7.350.000,00 TL olup, bu ödeneğin 6.562.626.TL.'si yıl içerisinde harcanmıştır. Dış cephe kaplama imalatları %70 seviyesinde, dış cephe alüminyum giydirme cephe imalatları ve 6+16+6 temperli reflekte ısıcam, iç mekanlarda ses yalıtımlı alçıpan duvar kaplamaları, alçı sıva imalatları, ıslak mekan seramik duvar kaplama imalatları, alçıpan asma tavan imalatları, granit seramik yer döşeme kaplamaları, ıslak mekanlardaki seramik duvar ve döşeme kaplamaları, lavabo tezgahları, asansör kapılarının mermer söve imalatları, yangın merdiveni ve ulaşım merdivenindeki paslanmaz çelik korkuluk imalatları tamamlanmıştır. Laminant kapı kanadı imalatı, cam mozaik imalatları, ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatları, iç cephe su bazlı boya imalatları devam etmektedir. Havalandırma tesisatı imalatlarının %95'i, kalorifer ve sıhhi tesisat imalatlarının %60'ı tamamlanmıştır. Elektrik tesisatı imalatlarının %20'si tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Binanın fiziki gerçekleşmesi %85 seviyelerindedir. Nakdi gerçekleşme seviyesi %54'tür.



ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU ve SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU: Yatırım ödeneği 44.500.000 TL'dir. Uygulama Projeleri ve yaklaşık maliyet hazırlanmış olup, söz konusu proje için ihaleye çıkılması ve harcama yapılması için Strateji Bütçe Başkanlığından izin istenmiştir. Yatırım onayı henüz verilmediğinden yapım ihalesine çıkılmamıştır.

Proje No: 2021H03-152567-152568 Proje Adı: Kampüs Altyapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			KAMPÜS ALTYAPI 5. KISIM İNŞAATI						
NUMARASI			2020H03-152567-152568						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			1994-2023						
KARAKTERİSTİĞİ			Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, telefon hattı.						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2020 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
1994	11.500	3.500		3.000				83	0
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.

ALTYAPI TESİSLERİ 5. KISIM İŞLERİ

2021 yılı ödeneği 3.000.000.TL olup, 83.413.TL ödenek harcanmış olup 2.916.587. TL ödenek harcanmamıştır.

7161 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 4 üncü madde gereğince yüklenici idaremize işin tasfiyesi talebinde bulunmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile tasfiye çalışmaları 2020 yılında tamamlanmıştır. 2021 yılında hesap kesme hakedişi yükleniciye ödenmiştir.

ALTYAPI TESİSLERİ 6. KISIM İŞLERİ

08.07.2021 ve 04.10.2021 tarihinde iki kez ihaleye çıkılmış ancak isteklilerin teklif tutarı yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle her iki ihale de iptal edilmiştir.

Proje No: 2021H03-152567-152568 Proje Adı: Kampüs Altyapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	<u>Açık ve Kapalı Spor Tesisler (KOP)</u>								
NUMARASI	2021H05-168601								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2023								
KARAKTERİSTİĞİ	Kapalı Tenis Kortu (2 Adet), Spor Kompleksi, (2.650 m2)								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2020 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2021	8.000	-		1.000		3.500		-	-
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

2021 yılı ödeneği 1.000.000. TL. olup ödenek harcanamamıştır.

Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri 2.650 m2: Uygulama projeleri hazırlanmış olup, yapım ihalesine henüz çıkılmamıştır.

Kapalı Tenis Kortu (2 Adet): Uygulama projeleri hazırlanmış olup, yapım ihalesine henüz çıkılmamıştır.

Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu 1.810 m2: Uygulama projeleri hazırlanmış olup, yapım ihalesine henüz çıkılmamıştır.

1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1 Proje Tamamlama Raporu

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK

- ✕ Ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,
- ✕ Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- ✕ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzamakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.
- ✕ Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması, yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2021

PROJE BAZINDA HARCAMALAR							
Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama - Bitiş Yılı	Program Toplam	Revize Toplam	Harcama Toplam
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ					20.502.000	30.902.000	19.502.170
DKH-SOSYAL					2.000	2.000	2.000
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA					2.000	2.000	2.000
2010K12-1315	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Niğde	İnşaat (3.100 m²), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2010-2021	2.000	2.000	2.000
2010K12-1315-39032	İnşaat	Niğde	İnşaat (3.100 m²)	2010-2014	0	0	-
2010K12-1315-39036	Diğer	Niğde	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2010-2021	2.000	2.000	2.000
EĞİTİM					20.500.000	30.900.000	19.500.170
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR					1.000.000	1.000.000	0
2021H05-168601	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Niğde	Kapalı Tenis Kortu (2 adet), Spor Kompleksi (2.650 m²), Spor Salonu (1.810 m²)	2021-2023	1.000.000	1.000.000	-
2021H05-168601-168602	Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri	Niğde	Spor Kompleksi (2.650 m²)	2021-2023	500.000	500.000	-
2021H05-168601-168603	Kapalı Tenis Kortu	Niğde	Kapalı Tenis Kortu (2 adet)	2021-2023	500.000	500.000	-
2021H05-168601-175420	Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu	Niğde	Spor Salonu (1.810 m²)	2021-2022	-	0	-
YÜKSEKÖĞRETİM					19.500.000	29.900.000	19.500.170
1994H03-450	Derslik ve Merkezi Birimler	Niğde	Eğitim (20.981 m²)	1994-2023	12.850.000	12.850.000	6.562.626
1994H03-450-14455	Konservatuvar	Niğde	Eğitim (6.500 m²)	2017-2022	7.350.000	7.350.000	6.562.626
1994H03-450-168399	Zübeyde Hanım Sağlık YO ve Sağlık Hizmetleri MYO	Niğde	Eğitim (14.481 m²)	2021-2023	5.500.000	5.500.000	-
2020H03-152567	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2023	3.000.000	3.000.000	83.413
2020H03-152567-152568	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2023	3.000.000	3.000.000	83.413
2021H03-168393	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2021-2021	200.000	300.000	258.951
2021H03-168393-168394	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2021-2021	200.000	300.000	258.951
2021H03-168395	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	1.450.000	11.750.000	10.992.658
2021H03-168395-168396	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	1.450.000	11.750.000	10.992.658
2021H03-168397	Yayın Alımı	Niğde	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	2.000.000	2.000.000	1.602.522
