ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

NİĞDE, Mart 2017

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME
HAZİNE	29.000.000	29.000.000	26.340.797
ÖZGELİR	0,00	0,00	0,00
NET FİNANSMAN		17.770.041	11.423.755
TOPLAM	**29.000.000**	**46.770.041**	**37.764.552**

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2016 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- Çarşı binası inşaatının tamamlanarak hizmete açılması,
- İİBF ek amfi bloğu inşaatının tamamlanarak hizmete açılması,
- Enstitü Binası inşaatının tamamlanarak hizmete açılması,
- Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.kısım inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,
- Eğitim Fakültesi 2.etap inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi,
- Mühendislik Fakültesi 4. etap ek bloklar inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi,

- Açık ve kapalı spor tesisleri projesi kapsamında merkez yerleşke içerisinde Kapalı Spor Salonu inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 50 seviyesine getirilmesi,
- Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,

Gerçekleşen;

- Merkezi Araştırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıştır.
- Çarşı binası inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- İİBF ek amfi bloğu inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- Enstitü Binası inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.kısım inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- Eğitim Fakültesi 2.etap inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- Mühendislik Fakültesi 4. etap ek bloklar inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- Açık ve kapalı spor tesisleri projesi kapsamında merkez yerleşke içerisinde Kapalı Spor Salonu inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 61 seviyesine getirilmiştir.
- Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerin tadilat ve onarım işleri tamamlanmıştır.
- Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır.

1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2016 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 29.000.000.TL iken, 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 17.770.041.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak, yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 46.770.041.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 37.764.552. TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.220.000	10.220.000	9.849.123	96%
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	180.000	380.250	298.099	78%
6.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	500.000	500.000	50.000	10%
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	22.300.000	29.159.791	24.523.990	84%
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.300.000	6.510.000	3.043.340	46%
	GENEL TOPLAM	29.500.000	46.770.041	37.764.552	81%

*** HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) ***

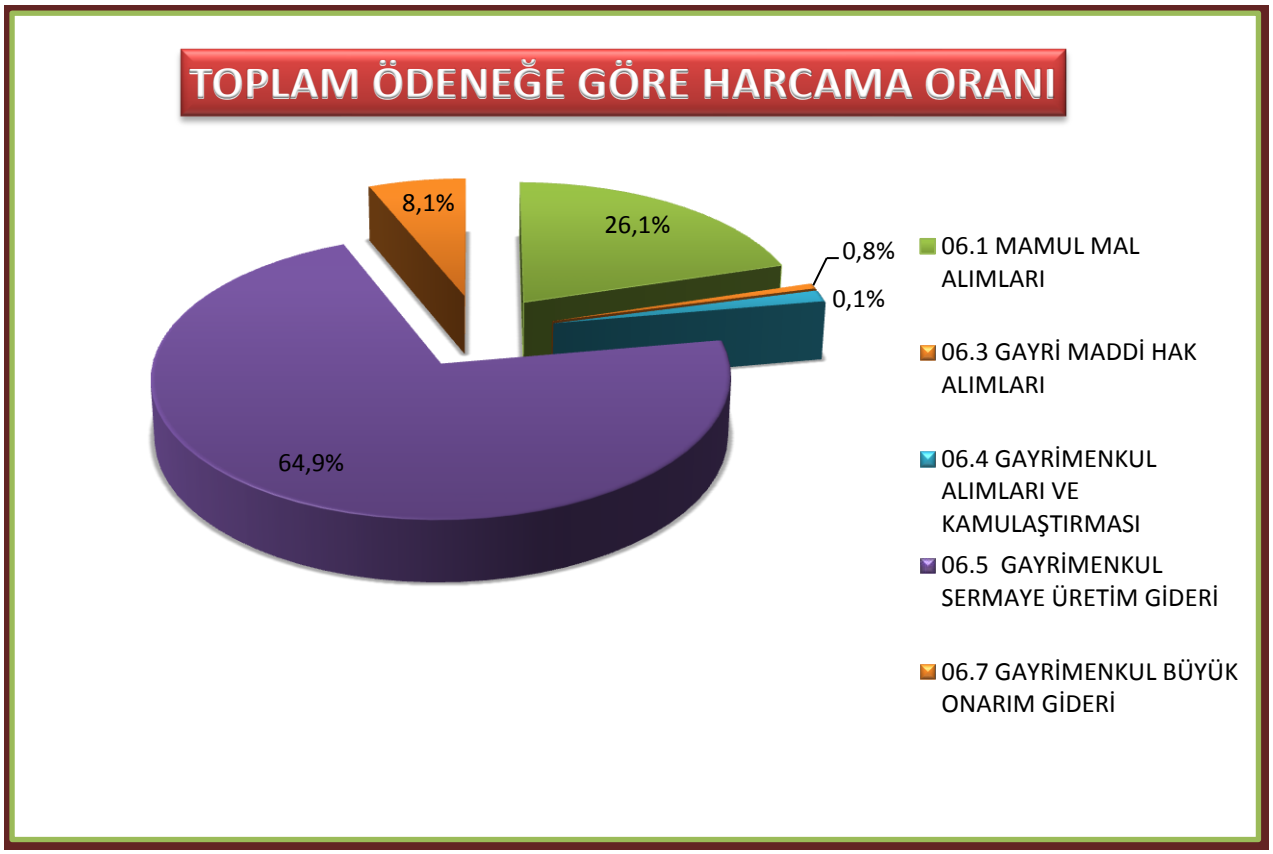

2- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2014H030270 Muhtelif İşler

2016 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 5.200.000.TL'dir. 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/8 maddesi uyarınca 10.410.250.TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği 15.610.250.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 11.690.569.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Makine-Teçhizat Alımları

2016 yılında makine-teçhizat alımları için 2.720.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 6.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 8.720.000.TL olmuştur. Ödeneğin 8.349.130.TL'si harcanmış, 370.869.TL ödenek harcanamamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	22.166,30
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	11.363,40
	Projeksiyon Cihazı	28 adet	141.397,04
	Tarayıcı	1 adet	7.257,00
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	20.513,49
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	45.482,34
	Bilgisayar	103 adet	345.349,41
	Fotokopi Makinesi	1 adet	7.847,00
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	47.232,62
Fen-Edebiyat Fakültesi			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	18.661,70
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	328.521,20
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	3 adet	25.853,80
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	77.328,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	16.655,70
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	20.215,05
	Bilgisayar	2 adet	6.425,69
Mühendislik Fakültesi			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	50.551,20
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	26.550,00

	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	56.463,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	84.606,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	279.660,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	17.928,92
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	20.886,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	14.750,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	18.880,00
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	7.080,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	20.331,40
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	11.800,02
	Bilgisayar	26 adet	83.533,97
Mimarlık Fakültesi			
	Bilgisayar	3 adet	8.731,23
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	18.917,05
	Bilgisayar	6 adet	19.277,07
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	187.336,53
	Baskı Makinesi	1 adet	9.735,00
	Bilgisayar	50 adet	145.520,55
	Fotokopi Makinesi	1 adet	7.847,00
Merkezi Araştırma Laboratuvarı			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	1.176.200,40
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	149.087,10
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	3 adet	524.715,32
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	1.339.300,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	140.420,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	467.280,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	287.684,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	119.298,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	132.750,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	324.500,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	71.095,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	10.755,66
İletişim Fakültesi			
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	396.435,69
	Bilgisayar	2 adet	6.425,69
	Fotokopi Makinesi	1 adet	7.847,00
Tıp Fakültesi			

	Bilgisayar	4 adet	12.851,38
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	347.999,59
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu			
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	15.458,00
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	3.776,00
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	39.468,29
İslami İlimler Fakültesi			
	Baskı Makinesi	1 adet	9.735,00
	Bilgisayar	11 adet	32.316,96
	Fotokopi Makinesi	1 adet	7.847,00
Eğitim Fakültesi			
	Baskı Makinesi	1 adet	9.735,00
	Piyano	1 adet	2.684,50
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	203.262,43
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	19.198,60
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	13.298,60
	Bilgisayar	4 adet	12.851,38
	Fotokopi Makinesi	1 adet	7.847,00
Konservatuvar			
	Piyano	4 adet	18.115,36
Yabancı Diller Yüksekokulu			
	Fotokopi Makinesi	1 adet	7.847,00
Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	13.030,74
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	6.103,19
BOR Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu			
	Makine-Teçhizat Alımı	2 adet	3.197,80
	Bilgisayar	1 adet	2.910,41
Ulukışla Meslek Yüksekokulu			
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	15.977,48
BOR Meslek Yüksekokulu			
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	1.404,20
	Bilgisayar	3 adet	9.638,54
Sosyal Bilimleri Enstitüsü			
	Bilgisayar	2 adet	5.820,82
Fen Bilimleri Enstitüsü			
	Bilgisayar	1 adet	3.212,85

Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu			
	Bilgisayar	4 adet	12.851,38
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	32.922,00
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	2.349,00
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	11.092,00
GENEL TOPLAM			8.271.251,04

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM	ALINAN ARAÇLAR	MİKTARI	TUTARI
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	T02 Binek Araç	1 adet	77.880,00

Yazılım Alımları

2016 yılında yazılım alımları için hazineden 180.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/8 maddesi uyarınca 200.250.TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği 380.250.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 298.098.TL'si harcanmış, 82.150.TL ödenek harcanamamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM	ALINAN MALZEMELER	TUTARI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	dbForge Studio for SQL Server Upgrade to Professional from Standard (1 adet), dbForge Studio for SQL Server Standard Edition (4 adet-Yeni Abonelik), DevExpress ASP.NET Subscription (4 adet-Abonelik Yenileme), DevExpress ASP.NET Subscription (1 adet-Yeni Abonelik) Yazılım Lisansları Alımı.	11.634,80
	Taşınmaz Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı.	17.000,00
	Veri Analizi (SPSS) Yazılımı Alımı (100 kullanıcılı)	146.320,00
	Microsoft Yazılım Lisansı Alımı (600 Kullanıcılı)	118.590,00
	dbForge Studio for SQL Server Yazılımı Alımı.	554,60
	Zaman Damgası Hizmeti Alımı (EBYS için 1.000.000 adet)	4.000,00
GENEL TOPLAM		*298.099,40*

Kamulaştırma

6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 500.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Songur Mahallesi 32 Pafta 357 Ada 26 parselde bulunan 212.38 m2 özel şahsa ait taşınmazın tamamı 50.000.TL bedel karşılığında eğitim öğretim ve kültür amaçlı kullanılmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri uyarınca üniversitemiz adına kamulaştırılmıştır. Ödeneğin 450.000.TL'si harcanamamıştır.

Büyük Onarım

2016 yılında büyük onarımlar için 2.300.000.TL hazineden ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 4.210.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 6.510.000.TL olmuştur. Ödeneğin 3.043.339.TL'si harcanmıştır.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir;

- BESYO yerleşkesi Kantin ve Yemekhane inşaatına 2015 yılında başlanılmış olup 2016 yılında 1.038.430,51.TL harcama yapılarak hizmete açılmıştır.

- Merkezi Laboratuvar Jeneratör ve UPS sistemi kurulması işine 2015 yılında başlanılmış olup 2016 yılında 225.406,08.TL harcama yapılarak hizmete alınmıştır.

- Rektörlük ve Merkezi Birimler dış cephe ve mantolama ve çatı onarım işi devam etmekte olup 2017 yılında tamamlanacaktır. 2016 yılsonu itibariyle 1.293.423,97.TL harcama yapılmıştır.

- 2016 yılı içeresinde 17-18-21 nolu parsellerde Restorasyon İşleri ihalesi yapılmış olup, 2017 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Büyük Onarım Kapsamında Yapılan İşler

HARCAMANIN ADI	TUTARI
Ayhan Şahenk Kütüphanesi Asansör Arızası Yapım İşi	9.971,00
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yangın Alarm Sistemi Bakım ve Onarım İşi	1.770,00
Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Elektrik Motorları ve Pompalarının Bakım ve Onarım Yapım İşi	10.788,74
Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Yapım İşi	13.628,59
Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarım Yapım İşi	9.912,00
Bağlı Birimlerde Yapılan Tadilat ve Onarım Yapım İşi	13.804,82
Bor Yerleşkesi Bor Meslek Yüksekokulu Tarım Uygulama Sahası Sondaj Yapım İşi	11.682,00
Halil Zöhre Ataman MYO ve Tarım Uygulama Sahası Elektrik Hattı Çekim İşi	20.061,18
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Orta Gerilim Hattı ve Sentetik Saha Aydınlatma Arızası Yapım işi	2.838,49
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Yangın Santralleri Arıza ve Bakım Onarım İşi	3.540,00
Rektörlük Binası ve Sabiha Şahenk Kütüphanesi Güvenlik Kamerası Takım ve Bakım Giderleri	2.708,10
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarım Uygulama Sahası Sondaj Kuyusu Yapım İşi	17.936,00
Eğitim Fakültesi Derslik ve Dekanlık Binası 56 Adet Güvenlik Kamerası Bakım-Onarımı ve 4 Adet Gece Görüş Kamerası Montaj İşi	2.478,00
Tıp Fakültesi Yerleşkesi İmar Planlama Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşlemlerinin Yapım İşi	20.060,00
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Bakım Onarım İşi	14.313,05
Bağlı Birimlerde Yapılan Tadilat ve Bakım Onarım İşleri	9.248,84
Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Elektrik Ana Pano Bakım Onarım İşi	16.976,81
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yangın Santralleri Bakım ve Onarım işi	1.770,00
Ulukışla MYO kompanzasyon arızası, Merkezi araştırma laboratuvarı ana pano işletme topraklaması, Park ve Bahçeler Biriminin yeni yerleşim yerine kablo çekimi ve pano montajı yapımı ve Fen Edebiyat Fakültesi trafosu ilave reaktör takım işleri	18.947,26
Rektörlük ve Bağlı Birimler Elektrik Motorları Bakım ve Onarım İşi	19.379,14
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarım İşi	9.628,80
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Tesisatı Bakım Onarım İşi	14.273,46
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Motorlarının Bakım Onarım İşi	9.307,84
Tıp Fakültesi 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planlarının Yaptırılması işi	20.060,00

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi İlave Güvenlik Kamerası Takım İşi	7.219,24
Merkez Yerleşkesi Sondaj Kuyusu Yapım İşi	7.670,00
Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Asansörü TSE Eksiklikleri Yapım İşi	8.260,00
Rektörlüğe Bağlı Birimlerde Yapılan Tadilat ve Onarım İşleri	11.525,65
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının C Blok Öğrenci Girişi Fotoselli Otomatik Kayar Kapısına Ait Mekanik Aksamın Değiştirilmesi işi	3.835,00
Sabiha Şahenk Kütüphanesi Kesintisiz Güç Kaynakları Akü Alımı İşi	9.685,44
Rektörlük ve Bağlı Birimlerinde Bulunan Jeneratörlerin Bakım ve Onarım İşi	12.999,23
Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının Bakım ve Onarım İşi	5.321,80
Sıhhi Tesisat Bakım Onarım İşi	10.898,95
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Soğutma Cihazları Bakım Onarım İşi	10.030,00
Fen Edebiyat Fakültesi C Blok Asansörü TSE Eksikleri Yapım İşi	18.290,00
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için Kesintisiz Güç Kaynakları Akü Alım İşi	14.868,00
Ulaştırma Hizmet Birimine Bağlı Kapalı Garaj Olarak Kullanılan Binanın Zemin Katında Bulunan Demir Kapının Yerine Otomatik Sarmalı Kepenk Kapı Yapım İşi	3.982,50
Bor MYO İlave Güvenlik Kamerası Takımı İşi	19.980,63
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Bakım Onarım İşi	20.683,04
Rektörlük ve Bağlı Birimler Isıtma Sistemleri Bakım Onarım İşi	4.897,00
Bor Halil Zöhre Ataman MYO' na paslanmaz Çelik Su Deposu Alım İşi	5.400,86
Yabancı Diller Yüksekokulu Asansörü TSE Eksiklikleri Yapım İşi	11.658,40
Park ve Bahçeler Birimi Hizmet Binası için Doğalgaz Dış Tesisat Çekilmesi İşi	17.003,80
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Binasının Çatı Tadilat ve Onarım Yapım İşi	4.130,35
Çarşı Binası Davlumbaz ve Baca Bağlantılarının Yapım İşi	2.655,00
GENEL TOPLAM	***486.079,01***

Proje No: 2016H034370, Proje Adı: Yayın Alımı

2016 yılında yayın alımları için 1.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 999.993.TL'si harcanmıştır.

HARCAMANIN ADI	*TUTAR (TL)*
Turnitin	21.465,64
BioOne	6.993,30
Wiley Journals Online	68.932,44
Annual Reviews	20.337,19
American Chemical Society (ACS)	30.291,89
EBSCOHOST: Ebsco Discovery Service (EDS)	13.046,85
ArtStor	6.913,97
MathSciNet	8.025,30
Euclid Prime	7.428,63
RSC	15.112,24
Spie E-Books	5.283,23
American Institution of Physiscs (AIP)	16.548,87
ASTM Standarts and Digital Library	28.612,69
APS	9.264,20
CEJD China	8.995,49
World E-Book Library	16.812,32
Emerald Management 120	37.690,34
Oxford Journals Online	19.290,43
Cambridge Journals Online	15.494,49
SAGE Premier	32.951,20
SciFinder	35.581,00
PNAS	3.513,89
IOP Science Xtra	21.569,28
Ebsco Seçme E-Kitaplar	26.771,44
ASME	24.318,59
Ebsco Academic E-Books	18.966,65
Ebrary	12.070,80
Proquest Agricultural Science	8.294,00
Proquest Digital Dissertation and Thessis	59.364,06
Proquest Central	48.313,60
Jstor	15.630,59
ProQuest Ebrary Titles 12	2.832,95
Taylor & Francis Seçme Kitaplar	13.755,11
Hiperkitap / Education Source	56.885,43
ECS Digital Library Online	6.176,54
IEEE Wiley E-Books	11.232,94
Project Muse E-Books	15.801,77

IOS Press E-Books	40.332,60
Springer Engineering E-Books	41.065,92
Emerald E-Books	63.226,23
Cumhuriyet Gazetesi Arşivi	1.350,00
Türkçe Kitap Alımı (İdeal Kültür)	3.100,59
E-Kitap ve E-Dergi alımı (İdeal Online)	12.430,00
HukukLink	1.969,50
Türkçe Kitap Alımı (Palme)	18.591,98
Yabancı Kitap Alımı (Palme)	18.484,42
Yabancı Kitap Alımı (Akademisyen)	11.591,75
Yabancı Kitap Alımı (Çağlayan)	16.995,36
DVD Alımı (Bilkar)	285,56
GENEL TOPLAM	***999.993,26***

Proje No: 2010 K121260, Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2016 yılı bütçe ödeneği 500.000.TL olup harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

HARCAMANIN ADI	TUTAR (TL)
Sunkingdom 40W 18V Katlanabilir Güneş Enerji Ünitesine esnek Güneş paneli 21 W	3.197,80
Delikle Tabla Elektropolisajlı	15.770,70
Dek İmaged Screen Busbors 266 5 mm Flame SDP282 67/25 Tranless Steel	4.402,58
Derin Dondurucu (DP 490)deep Frezer 86 Derece, 2597 CNIYA +++ Buzdolabı	24.925,00
Ultra Saf Su Cihazı Su Dağıtım Kolu	1.740,50
Paslanmaz Çelik boru hattı döşemesi (15m)	4.720,00
Ossila Malzemeleri	12.073,95
RESS-00001 repair of PNCL Plus + 5 k 400 PF after power of (tamir), Flooat-Zone Silicon Wafer changing of number of pcs	13.870,06
GA 18 API467776 6000 Saat Bakım Hizmeti, NGP30 6000 Saat Bakım, DD50+2901200303, PD50+2901200403, QD50+2901200503, GA 18 3000 Saaat Bakım Seti, DD50 Filtre Bakım Seti, PD50 Filtre Bakım Seti, QD50 Filtre Bakım Seti	18.654,62
Yangına 90 Dk Dayanıklı Kimyasal Saklama Dolabı	25.606,00
AZO PDV Hedef, IZO PDV Hedef	5.947,20
Midas Freon Filtre, MIDAS model gaz Dedektörü için PH3 Kartuşu, MIDAS model gaz Dedektörü için NF3 Kartuşu, MIDAS model gaz Dedektörü için SİH4 Kartuşu, MIDAS model gaz Dedektörü için H2 Kartuşu,	9.081,28
Kimyasal Malzeme, Ultrasonic Banyo 10 lt, Isıtıcılı Manyetik karıştırıcı 340 C, Santrifüj Mini 7000 Rpm	7.189,74
Laboratuvar Malzemesi ve Diğer Sarf Malzemeler	13.604,02
TOPLAM	**160.783,45**

Proje No: 2016H034370, Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
NUMARASI	2016H034370
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2016-2016
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt–Proje ve Müşavirlik

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2014 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2016	500			500		500		331	66

2016 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 500.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 331.050.TL'si harcanmıştır.

Çeşitli Üniteler Etüt Proje kapsamında;

Tıp Fakültesi Morfoloji binası projesi için 221.250.TL, Konservatuvar Binası proje işleri için 52.510.TL, diğer çeşitli projeler için ise 57.290.TL harcama yapılmıştır.

Proje No: 1994H032370Proje, Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI
NUMARASI	1994H032370
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2017
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT+DON. (9.750 +7.500+2.592+1.330+11.350 m2).

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2014 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI	Revize								
1994	150.000	135.679		10.300		12.617		11.017	97

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Eğitim Fakültesi 2.Etap İnşaatı, Enstitü Binası İnşaatı, Çarşı Binası Yapım İşi, İİBF Amfi Bloğu İnşaatı ve Mühendislik Fakültesi 4. Etap Ek Bloklar İnşaatı devam etmektedir. 2016 yılında 10.300.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 2.316.791.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği 12.616.791.TL olmuştur.

1-İLGİLİ DAİRE	**: Ömer Halisdemir Üniversitesi**	**: Ömer Halisdemir Üniversitesi**
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Eğitim Fak.2.Etap İnş. b) Müteahhit: AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.	a) Enstitü Binası İnş. b) Ersel İnş. Müh. Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Eğitim Fak.2.Etap İnş.	: Enstitü Binası İnş.
4-YAKLAŞIK MALİYET	: 9.800.000,00 TL	: 6.500.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	: 7.338.000,00TL	:4.961. 000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	: 24.02.2014	: 17.02.2014
7- MUKAVELE TARİHİ	: 17.04.2014	: 17.04.2014
8-YER TESLİM TARİHİ	: 21.04.2014	: 21.04.2014
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 21.04.2014	:21.04.2014
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 18.08.2016	: 03.09.2016
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0.06 (4.103,4)	: %0,06 (2.976,6)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	: ---	-
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	:---	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	:7.338.000,00TL	: 4.961.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	: 10.050 m2	: 7.500 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 100	% 100
18- İNŞAATIN DURUMU	**: Tamamlandı**	**Tamamlandı**

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2.ETAP İNŞAATI

2016 yılı ödeneği 3.300.000.TL olup, ödeneğin 2.161.344.TL'si harcanmıştır. Müzik ve Resim Bölümlerinin bulunduğu 10.050 m2 kapalı alana sahip 2 bloktan ve müştemilatından oluşmaktadır. 2016 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100 olup geçici kabulü yapılmıştır.

ENSTİTÜ BİNASI İNŞAATI

Adı geçen inşaatımız A ve B bloklardan olmak üzere 7.500 m2 kapalı alana sahiptir. 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 1.158.201.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak ödeneğin tamamı harcanmıştır Fiziki gerçekleşmesi % 100 olup geçici kabulü yapılmıştır.

ÇARŞI BİNASI YAPIM İŞİ :

6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 650.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ödeneğin 466.912.TL'si harcanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 100 olup geçici kabulü yapılmıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Çarşı Binası Yapım İşi b) Ali Nacı TOKER (Toker Ticaret)
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Çarşı Binası Yapım İşi
4-YAKLAŞIK MALİYET	3.431.402,63 TL
5-İHALE BEDELİ	2.886.560,00TL
6- İHALE TARİHİ	18.09.2014
7- MUKAVELE TARİHİ	27.10.2014
8-YER TESLİM TARİHİ	31.10.2014
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	31.10.2014
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	26.08.2016
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06 (4.103,4)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	---
15-SÖZLEŞME BEDELİ	2.886.560,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	2.592 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
18- İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı

İİBF EK AMFİ BLOĞU İNŞAATI :

6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 508.590.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 1.330 m2 kapalı alana sahiptir. 2016 yılı fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiş olup geçici kabulü yapılmıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) İİBF Ek Amfi Bloğu İnşaatı b) Selim Tuğrul (Nokta Mim.Müh.)
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	İİBF Ek Amfi Bloğu
4-YAKLAŞIK MALİYET	2.101.355,56 TL
5-İHALE BEDELİ	1.999.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	17.09.2014
7- MUKAVELE TARİHİ	14.11.2014
8-YER TESLİM TARİHİ	19.11.2014
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.11.2014
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	14.09.2016
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06 (1.926,00)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	-
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	1.999.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	1.330 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
18- İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4. ETAP EK BLOKLAR İNŞAATI:

2016 yılı ödeneği 7.000.000.TL olup, ödeneğin 6.722.065.TL'si harcanmıştır. Mühendislik Fakültesi 4. Etap Ek Bloklar inşaatı F1, F2, F3 ve E Blokları olmak üzere toplam 4 Bloktan oluşmakta olup, 11.350 m2 kapalı alana sahiptir. 2016 yılı fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiş olup geçici kabulü yapılmıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit: AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	N.Ü. Mühendislik Fak. 4. Etap Ek Bloklar
4-YAKLAŞIK MALİYET	10.111.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	7.894.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	20.02.2016
7- SÖZLEŞME TARİHİ	25.03.2016
8-YER TESLİM TARİHİ	30.03.2016
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	30.03.2016
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	08.03.2017
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	%0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	----
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	----
15- TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	7.894.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	11.350 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
18- İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı

Proje No: 1994H032350, Proje Adı: Kampüs Alt Yapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	KAMPÜS ALTYAPI 4. KISIM İNŞAATI
NUMARASI	1994H032350
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2017
KARAKTERİSTİĞİ	Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2015 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAM A GİRİŞ YILI									
1994	75.000	60.649		8.000				6.926	90

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

İLGİLİ DAİRE	**Ömer Halisdemir Üniversitesi**
SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	b) Müteahhit:: Mehmet ORMAN & Temel Fen İş Ortaklığı
SÖZLEŞMENİN KONUSU	Niğde Kampus Altyapı 4. Kısım İnşaatı
YAKLAŞIK MALİYET	14.074.776,86- TL
İHALE BEDELİ	10.900.000,00-TL
İHALE TARİHİ	12.12.2013
MUKAVELE TARİHİ	03.02.2014
ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
YER TESLİM TARİHİ	03.02.2014
FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	03.02.2014
İŞİN BİTİM TARİHİ	12.04.2016
GÜNLÜK GECİKME CEZASI	%0,06
TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	10.900.000,00-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%100
İNŞAATIN DURUMU	Geçici kabül çalışmaları devam etmektedir.

KAMPÜS ALTYAPI TESİSİSLERİ 4. KISIM İŞLERİ; (Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon vb.)

2016 yılı ödeneği 8.000.000.TL olup, 6.926.343.TL'si harcanmıştır.

Proje Kapsamında; Mevcut yolların trafik işaretlemesi, merkez yerleşke güvenlik kamera sistemi, devriye ve bisiklet yolu, galeriler içinde güvenlik tesisatı, arıtma tesisinin kapasitesinin 1500 m3/gün çıkarılması, 50.000 m² alanda peyzaj ve çevre düzenlenmesi, ilave içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark, giriş güvenlik binası (Kuzey cephesi), çevre aydınlatma ve sulama tesisatı işleri tamamlanmıştır.

Ayrıca; Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin kullanımı için ayrılan Bor yerleşkesinde ve Pınarbaşı'nda yer alan Tarım Uygulama Sahaları altyapı işinde 25.07.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 1.055.789.TL harcanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 70'dir.

İLGİLİ DAİRE	**Ömer Halisdemir Üniversitesi**
SÖZLEŞME TARAFLARI	a)Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b)Mahmut ORMAN-İnşaat Mühendisi
SÖZLEŞMENİN KONUSU	Bor Yerleşkesi ve Pınarbaşı Tarım Uygulama Saha Altyapı
YAKLAŞIK MALİYET	1.335.901,48 TL
İHALE BEDELİ	1.319.000,00 TL
İHALE TARİHİ	10.06.2016
MUKAVELE TARİHİ	20.07.2016
ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
YER TESLİM TARİHİ	25.07.2016
FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	25.07.2016
İŞİN BİTİM TARİHİ	21.12.2016
GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	1.319.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%70
İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor

Proje No: 2014H050190, Proje Adı: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	SPOR
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (KOP)
NUMARASI	2014H050190
YERİ	NİĞDE Merkez
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2014-2018
KARAKTERİSTİĞİ	Spor Kompleksi (10.589 m2)

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2015 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2014	18.000	5.876		3.500		8.043		6.250	61

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE	**Ömer Halisdemir Üniversitesi**
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	b) Müteahhit AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.& Şenel DOĞAN İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi.
4-YAKLAŞIK MALİYET	14.750.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	13.325.000,00 TL
6-İHALE TARİHİ	12.08.2016
7-SÖZLEŞME TARİHİ	08.09.2016
8-YER TESLİM TARİHİ	14.09.2016
9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	14.09.2016
10-İŞİN BİTİM TARİHİ	12.09.2017
11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	--
13-SÖZLEŞME ARTIŞI	--
14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	13.325.000,00 TL
15-TOPLAM ALANI	10.589 m2
16-FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 61
17-İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.

2016 yılı ödeneği 3.500.000.TL olup, 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi uyarınca 4.543.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmasıyla yılsonu toplam ödeneği 8.043.000.TL olup ödeneğin 6.249.494.TL'si harcanmıştır.

Merkez Yerleşkemiz içerisine 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi yapım işinde çalışmalar devam etmekte olup fiziki gerçekleşmesi % 61 seviyesindedir.

2.1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

1. İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Üniversitemiz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı arasında 2014 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda inşaata başlanılmış olup toplam 11.450 m2 kapalı alana sahip inşaatın fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesindedir. 2016 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1 Proje Tamamlama Raporu

3. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak

- Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması,
- Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,
- Kurumlardan kaynaklanan hataların minimize edilebilmesi için hizmet içi eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi,
- Yapılan büyük onarım çalışmalarında "Anahtar Teslimi Götürü Bedel" sözleşmelerle yaşanan sıkıntıları azaltabilmek için büyük onarım ihalelerinde "Teklif Birim Fiyat Sözleşmesinin" hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzatmakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.
- Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,

SEKTÖR ADI EĞİTİM

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2015 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	+ / - (14)	Harcama Toplam
1994H032350	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Niğde	75.000	60.649	8.000		6.926
1994H032370	Derslik ve Merkezi Birimler(KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Niğde	150.000	134.679	10.300	+2.317	11.017
2014H030270	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Niğde	25.000	17.816	5.200	+10.410	11.691
2014H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Niğde	18.000	5.876	3.500	+4.543	6.249
2016H034370	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Niğde	500	0	500		331
2016H034380	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2016	Niğde	1.000	0	1.000		1.000
TOPLAM					**269.500**	**219.020**	**28.500**	**17.270**	**37.214**

tabloda 500.TL' lik kamulaştırma ödeneği ve harcaması yoktur.

SEKTÖR ADI DKH

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2015 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	+ / - (14)	Harcama Toplam
2010K121260	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Niğde	12.317	11.817	500		500
TOPLAM					**12.317**	**11.817**	**500**		**500**
