2012

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart, 2013

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YIL SONU ÖDENEK	YIL SONU GERÇEKLEŞME
HAZİNE	18.611.000	20.611.000	18.888.099
ÖZGELİR	500.000	500.000	499.289
NET FİNANSMAN		7.066.300	4.430.470
TOPLAM	19.111.000	28.177.300	23.817.858

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2012 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- Eğitim Fakültesi inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,
- Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,
- Merkez yerleşkeye Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi mevcut projelerinin revizyonu için projelerinin yaptırılması,
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- Merkez, Bor ve BESYO yerleşkeleri Açık Spor Tesisleri inşaatının % 40 seviyesine getirilmesi,
- Alt yapı 3. Kısım ihalesinin yapılarak % 100 seviyesine getirilmesi,

Gerçekleşen;

- Eğitim Fakültesi inşaatı % 100 seviyesine getirilmiş ve hizmete açılmış olup, geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.
- Alt yapı 3. Kısım ihalesi kapsamında planlanan işlerin tamamı yapılmış olup, fiziki gerçekleşme % 100' dür.
- Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının sözleşmesi fesih edilmiş ve fiziki gerçekleşme % 37 olarak gerçekleşmiştir. Yeniden ihale çalışmalarına başlanılmıştır.
- Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunun proje hizmet alımı ihalesi ile Mühendislik Fakültesi mevcut projelerinin revizyonu proje hizmet alım ihalesi yapılmıştır.
- Merkez, Bor ve BESYO yerleşkeleri Açık Spor Tesisleri inşaatı ihalesi kapsamında BESYO yerleşkesindeki atletizm pisti ve futbol sahası dışındaki tesisler geçici işgal yapılarak hizmete alınmıştır. Fiziki gerçekleşme % 72' dür.
- Merkeze Araştırma Laboratuvarı makine teçhizat ihalesi yapılmış olup cihazın gümrükten alınması beklenilmektedir.
- Mimarlık Fakültesi 1.etap inşaatı için likit ödenek kaydı yapılarak ihalesi yapılmış ve inşaat % 17 seviyesine getirilmiştir.
- Mühendisli Fakültesi ek derslik inşaatı için likit ödenek kaydı yapılarak ihalesi yapılmış ve inşaat % 16 seviyesine getirilmiştir.
- Fen-Edebiyat Fakültesi inşaatının kesin hesap farkı ödemesi yapılmıştır.
- Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır.

1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2012 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 19.111.000.TL iken, 6260 sayılı kanunun 7/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 2.000.000.TL, 8/6 maddesi uyarınca 7.066.000.TL likit ödenek kaydı yapılarak, üniversitemizin yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 28.177.300.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 23.817.858.TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
06.1	**MAMUL MAL ALIMLARI**	*4.461.000*	*5.393.880*	*5.288.642*	*98,05*
06.3	**GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI**	*100.000*	*110.000*	*98.771*	*89,79*
06.5	**GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERİ**	*14.050.000*	*20.393.420*	*17.499.125*	*85,81*
06.7	**GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERİ**	*500.000*	*2.280.000*	*931.200*	*40,85*
	GENEL TOPLAM	**19.111.000**	**28.177.300**	**23.817.858**	***83,47***

*Harcama oranı(Harcama/yılsonu toplam ödenek)

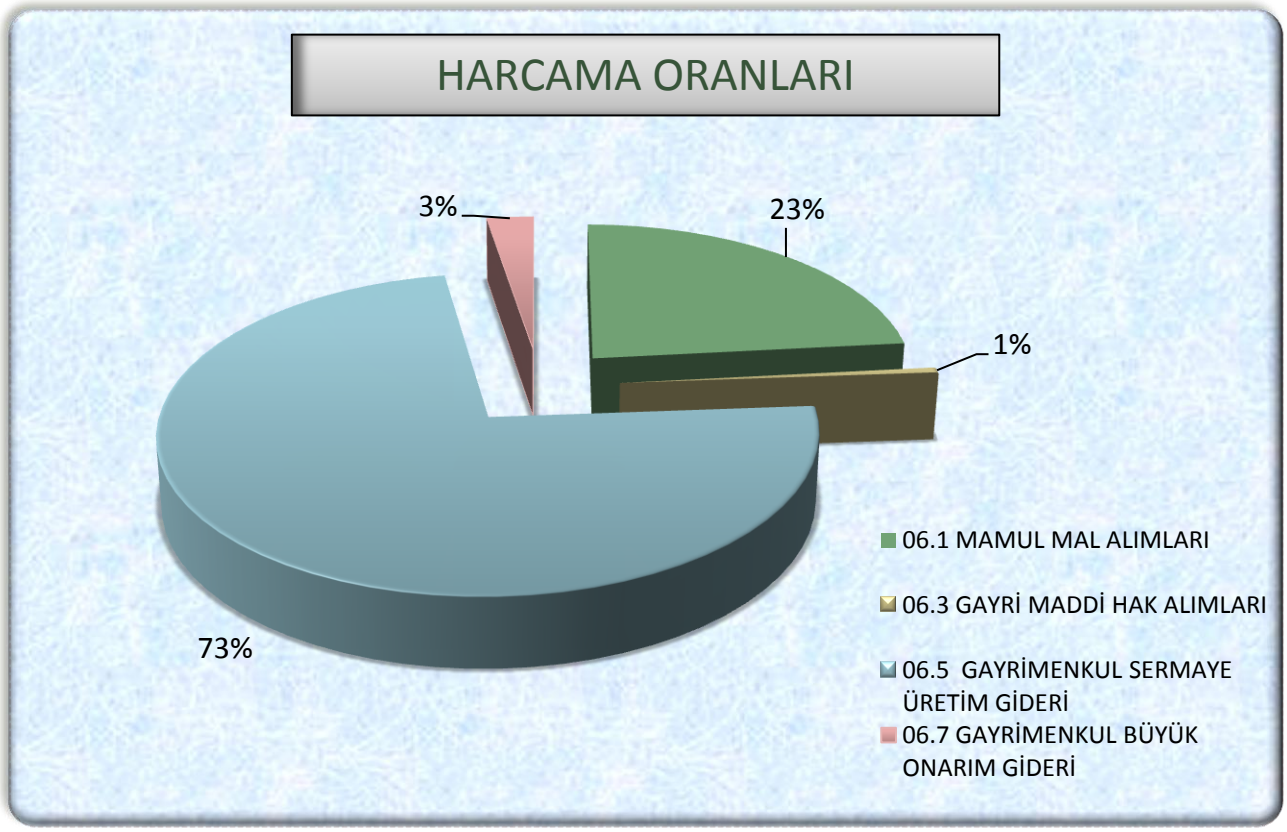

2- 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2012HO31440 Muhtelif İşler

2012 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 3.000.000.TL'dir. 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 2.722.880.TL likit ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği 5.722.880.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 3.958.709.TL' si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Yayın Alımı

2012 yılında yayın alımları için 650.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 649.720.TL'si harcanmıştır.

HARCAMANIN ADI	TARİHİ	TUTARI (TL)
Knovel	27.02.2012	16.648,66
RSC Journals	27.02.2012	8.803,44
Serials Solutions	13.03.2012	20.855,83
Jastor	13.03.2012	7.903,73
SIAM	21.03.2012	5.719,89
Institution of Physics (IOP)	10.04.2012	12.935,74
Wiley Blackwell	10.04.2012	37.345,12
Springer Ling	10.04.2012	48.662,04
ASTM Standards & Digital Library	11.04.2012	19.315,15
American Chemical Society (ACS)	11.04.2012	12.217,31
World EBook Library	11.04.2012	9.646,68
BioOne	10.05.2012	3.696,00
Oxford Journal Online	10.05.2012	5.665,77
MatSci Net	10.05.2012	5.130,36
Emerald Management Xtra	05.07.2012	29.200,30
SAGE	05.07.2012	16.914,81
American Institute Physics (AIP)	05.07.2012	10.244,48
RSC Ebook	25.09.2012	14.747,97
Springe Ling	25.09.2012	41.664,38
IEEE/Wiley EBooks	25.09.2012	5.574,10
EBSCOHOST	23.10.2012	38.179,06
Ebrary Academic Complete	01.11.2012	11.219,07
ProQuest Digital Dissertations	01.11.2012	41.162,40
ProQuest Central	01.11.2012	80.811,00
SAFARİ IT Books & Busuness Books	01.11.2012	29.421,76

Ebscho Journals Services (EJS)	22.11.2012	10.548,72
Annual Reviews	22.11.2012	12.888,90
ASME	22.11.2012	33.801,13
Hiper Kitap	06.12.2012	13.427,25
Palme Kitabevi (Türkçe kitap alımı)	10.12.2012	15.377,08
EDOKA (Türkçe kitap alımı)	26.07.2012	15.304,06
Çağlayan (Yabancı kitap alımı)	14.12.2012	14.688,42
TOPLAM		649.720,61

Makine-Teçhizat Alımları

2012 yılında makine teçhizat alımları için 1.250.000.TL hazineden, 500.000.TL'de öz gelirden karşılanmak üzere toplam 1.750.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 932.880.TL likit ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 2.682.880.TL olmuştur. Ödeneğin 2.577.930.TL'si harcanmış olup, 104.950.TL ödenek harcanmamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI (KDV Dahil)
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER			
	Bilgisayar	14 Adet	24.614,80
	Bilgisayar İş İstasyonu	1 Adet	6.851,08
	İPS Monitörü	1 Adet	1.830,18
	Dizüstü Bilgisayar	3 Adet	14.478,60
	Renkli yazıcı	1 Adet	1.095,04
	Projeksiyon cihazı	5 Adet	7.428,10
	Tarayıcı	5 Adet	4.531,20
	Portatif El Tarayıcısı	1 Adet	192,34
	Optik okuyucu	1 Adet	21.052,38
	Çim biçme makinesi	2 Adet	3.540,00
	İnşaat Makine ve Aletleri	1 Adet	14.042,00
	Büro Mobilyaları Alımı	Muhtelif	45.908,58
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI			
	Büro Mobilyaları Alımı	Muhtelif	77.868,86
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ			
	Projeksiyon cihazı	1 Adet	1.485,62
	Büro Mobilyaları Alımı	Muhtelif	4.402,17
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ			
	Tarayıcı	2 Adet	1.812,48
	Kesintisiz Güç Kaynağı(7 KVA)	1 Adet	9.077,74
	Kesintisiz Güç Kaynağı(600 VA)	3 Adet	336,30
	Büro Mobilyaları Alımı	Muhtelif	155.380,57
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ			
	Bilgisayar	20 Adet	35.164,00

Gıda Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	3.481,00
Çevre Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	2.950,00
İnşaat Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	11.210,00
Elektrik-Elektronik Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	Muhtelif	47.270,80
Jeoloji Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	17.192,60
Gıda Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	1.416,00
Elektrik-Elektronik Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	10 adet	3.776,00
Mekatronik Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	Muhtelif	40.356,00
Elektrik-Elektronik Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	Muhtelif	10.758,06
Makine Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	11.652,50
Gıda Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	Muhtelif	22.182,82
Gıda Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	1.864,40
Makine Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	Muhtelif	77.998,00
Elektrik-Elektronik Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	14.160,00
Gıda Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	Muhtelif	81.230,85
Gıda Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	Muhtelif	6.219,78
Gıda Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	20.508,40
Gıda Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	Muhtelif	13.197,94
Çevre Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	Muhtelif	11.021,20
İnşaat Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	8.496,00
Makine Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	7.691,24
Jeoloji Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	12.272,00
Maden Mühendisliği	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	16.756,00
MİMARLIK FAKÜLTESİ			
	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	14.160,00

	Büro Mobilyaları Alımı	Muhtelif	2.320,52
TARIM BİLİMLER VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ			
	Bilgisayar	11 Adet	19.340,20
	Büro Mobilyaları Alımı	Muhtelif	32.235,21
İLETİŞİM FAKÜLTESİ			
	Büro Mobilyaları Alımı	Muhtelif	11.155,63
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Büro Mobilyaları Alımı	Muhtelif	22.362,18
	Projeksiyon cihazı	5 Adet	7.428,10
	Bilgisayar	51 Adet	89.668,20
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU			
	Makine Teçhizat Malzemesi Alımı	Muhtelif	42.834,00
	Projeksiyon cihazı	5 Adet	7.428,10
EĞİTİM FAKÜLTESİ			
	Bilgisayar	50 Adet	87.910,00
	Büro Mobilyaları Alımı	Muhtelif	699.553,83
BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Makine Teçhizat Malzemesi Alımı	Muhtelif	10.457,64
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı	1 Adet	4.395,50
ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı		8.235,22
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Bilgisayar	4 Adet	7.032,80
	Projeksiyon cihazı	1 Adet	1.485,62
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	36.614,22
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	14.927,00
	Makine Teçhizat Alımı	10 adet	58.433,60
	Büro Mobilyaları Alımı	Muhtelif	10.086,16
	Laboratuvar malzemesi ve makine teçhizat alımı		13.155,82
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Çim biçme traktörü ve çapa makinesi		**12.790,00**
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANIĞI			
Konukevi	Muhtelif		**147.432,22**
Erkek Öğrenci Yurdu	Muhtelif		**163.969,45**
GENEL TOPLAM			**2.400.164,85**

Taşıt Alımları

2012 yılı Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere bir adet Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) izini verilmiş olup, alınan otobüs aşağıda gösterilmiştir.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN ARAÇ	MİKTARI	TUTARI (KDV Dahil)
Rektörlük	Otobüs(31+1 kişilik klimalı)(bütçe	1	177.697,00
Rektörlük	Binek Otomobil (hibe)	1	56.150,00
Rektörlük	Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) Arazi hizmetleri (hibe)	1	55.000,00

Yazılım Alımları

2012 yılında yazılım alımları için hazineden 100.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 10.000.TL likit ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 110.000.TL olmuştur. Ödeneğin 98.772.TL'si harcanmış, 11.228.TL ödenek harcanmamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV dahil)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Net Cad Harita Çizim Programı	13.000,00
	Zaman Damgası Kontrolü	1.180,00
	Elektronik İmza Yazılım Kütüphanesi Entegrasyon Bedeli	23.600,00
	Microsoft Yazılım Lisansı (600 kullanıcılı)	60.991,84
GENEL TOPLAM		**98.771,84**

Büyük Onarım

2012 yılında büyük onarımlar için 500.000.TL hazineden ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 780.000.TL likit ödenek kaydı, 7/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 1.000.000.TL, ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği 2.280.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 931.320.TL'si harcanmış olup, 1.348.679.TL ödenek harcanmamıştır. Isı merkezinin garaja dönüştürülmesi yapım işi ihalesi idare tarafından iptal edildiğinden bu iş için ayrılan ödenek harcanamamıştır. Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu'nun güçlendirilmesi yapım işi için temin edilen ödenek yıl sonu itibariyle ihalesi yapılamadığından harcanamamıştır.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir;

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İDARİ ODALARININ ARA DUVARLARININ KALDIRILMASI, ISLAK HACİMLERİN TADİLAT EDİLMESİ VE ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ CEPHE TADİLAT VE ONARIM İŞİ: 14.03.2012 tarihinde ihalesi yapılarak 16.04.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış ve 19.04.2012 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşme Bedeli 333.000,00 TL'dir. Fen Edebiyat Fakültesi Binası idari odalarının ara duvarları kaldırılarak, ıslak hacimler ve tuvaletlerin tadilatı yapılmıştır.

Ulukışla Meslek Yüksekokulu'nun dış cephelerinin boya, tadilat ve onarımı yapılmıştır.

KOYUNLU YERLEŞKESİNDE BULUNAN LOJMANLARIN ÖĞRENCİ YURT BİNASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TADİLAT VE ONARIM YAPIM İŞİ: 11.05.2012 tarihinde ihale yapılarak 18.06.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanarak, 20.06.2012 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşme bedeli 294.000. TL'dir. (Yüklenici firma sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğinden 18.09.2012 tarihinde iş % 82 seviyesinde iken idare tarafından sözleşme fesih edilmiştir.) Gerekli olan imalatlar doğrudan temin sınırları içerisinde ikmal edilmiştir. Ayrıca bazı işler teknik kadrodaki personellerimiz tarafından tamamlanarak hizmete açılmıştır.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI İDARİ ODALARIN ARA DUVARLARININ KALDIRILMASI, ISLAK HACİMLERİN TADİLAT EDİLMESİ VE ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU'NUN DIŞ CEPHE TADİLAT VE ONARIMI İŞİ		
TARİH	**AÇIKLAMA**	**HARCAMA**
26.07.2012	1 No'lu Hakedişi.	190.759,45
03.09.2012	2 No'lu Hakedişi.	195.840,37
	TOPLAM	**386.599,82**

KOYUNLU YERLEŞKESİNDE BULUNAN LOJMANLARIN ÖĞRENCİ YURT BİNASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TADİLAT VE ONARIM YAPIM İŞİ		
TARİH	**AÇIKLAMA**	**HARCAMA**
31.07.2012	Koyunlu Yerleşkesinde Bulunan Lojmanların Öğrenci Yurt Binasına Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım Yapım İşi 1 Nolu Hakedişi	96.763,33
08.11.2012	Koyunlu Yerleşkesinde Bulunan Lojmanların Öğrenci Yurt Binasına Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım Yapım İşi 2 Nolu Hakedişi	205.644,49
	TOPLAM	**302.407,82**

4734 Sayılı Kanunun, 22-d Maddesi Kapsamında Yapılan Doğrudan Temin İmalatları:

YAPILAN İŞ	TUTARI
Makine Mühendisliği Bölümündeki üç laboratuvara basınçlı hava tesisatı çekilmesi	2.111,60
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu binasının depreme dayanıklılık testi ölçümleri ve numune alımları hizmet alımının yapılması	15.340,00
Genel pompa arıza ve bakımı	10.425,01
Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi dekanlık binasının tadilat ve onarımı	6.785,01
Rektörlük bağlı birimlerin genel tamiratı	12.449,59
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının tadilat ve onarımı	15.340,00
Rektörlük galeri kapaklarının bakım ve onarımı	2.764,33
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu güvenlik kapısı ve çevre aydınlatmasının yapımı	13.853,20
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu çevre aydınlatmasının yapılması	16.291,08
Merkez yerleşke ana giriş kapısı önündeki totem yol levhası yer değişikliğinin yapımı	5.900,00
Rektörlük elektrik malzemesi ve kompanzasyon yapımı	2.589,51
Rektörlük ve bağlı birimlerin pompa arıza ve bakımı	9.498,64
Koyunlu yerleşkesinde bulunan lojmanların öğrenci yurt binasına dönüştürülmesi tadilat ve onarımının yapımı	16.624,07
Rektörlük binası çatısın tadilat ve onarımının yapımı	16.550,97
Rektörlüğe elektrik malzemesi alımı	4.652,20
Merkez yerleşke bahçe alanları için malzeme alımı	16.609,92

Bor Meslek Yüksekokulu bedensel engelli WC ve elektrik işleri ve onarım yapımı	12.036,00
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nun makine arıza yapımı	6.879,40
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu idari bina, A ve B kapalı spor salonları çatılarının bakım onarımın yapımı	3.540,00
Merkez yerleşkedeki mevcut yollara duba ve delinatör yapımı	11.859,00
Rektörlük ve bağlı birimlerin mekanik tesisatı bakım ve onarımı	9.322,00
Merkez yerleşke rektörlük binasının dışarı açılan merdiven kapılarının güvenlik özellikli ahşap ve demir kapılarla değişimi yapımı	4.029,70
Rektörlük katında bulunan makam kapılarının yapımı	15.576,00
Rektörlük repertitör kablo giriş yapımı	2.650,28
Rektörlük binasının 440 KVA jeneratör yıllık bakımı	1.036,36
Fen Edebiyat Fakültesi klima santralının bakımı	2.147,60
TOPLAM	**242.313,12**

Proje No: 2010K121260 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat Alımı

2012 yılı ödeneği 2.061.000.TL olup, ödeneğin tamamı harcanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulum Projesi kapsamında "Güneş Pili Üretim Sistemi" cihazının 10.02.2012 tarihinde ihalesi yapılmış ve 02.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Cihazın gümrükten alınması beklenilmektedir.

Proje No: 2011H034450 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
NUMARASI	2012H031430
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	20112011
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt –Proje ve Müş.

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2010 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2012	100			100		383,10		364,03	95

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

2012 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi için 100.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 283.120.TL likit ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği 383.120.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 364.030.TL'si harcanmış olup, 19.090.TL ödenek harcanmamıştır.

Üniversitemizin 2009/2013 Stratejik Planı Doğrultusunda Merkez Yerleşke İçerisine 3.110 m2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve 5.634 m2 Sağlık Yüksekokulu olmak üzere toplam 8.744 m2 Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binaları projesi işi 158.120.TL (KDV Dahil) harcama yapılarak tamamlanmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 21-f maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi mevcut projesinin revizyonu işi 12.03.2012 tarihinde sözleşme imzalanarak mevcut revizyonu ve zemin klas deney raporları yapılmıştır. Proje işi 159.890.TL (KDV Dahil) harcama yapılarak tamamlanmıştır.

Proje No: 1994H032370Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI
NUMARASI	1994H032370
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	19942012
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT (14.375 + 7.993 M2).

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		
	DIŞ	2010 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
PROGRAMA GİRİŞ YILI 2011	63.870	46.983	10.000		13.600		10.728		79

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE	**Niğde Üniversitesi**	**Niğde Üniversitesi**
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Eğitim Fakültesi Dekanlığı b) Müteahhit Aska İnş. A.Ş.	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Erk Yapı End.A.Ş.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Eğitim Fakültesi 1.Etap İnşaatı	Kültür Merkezi ve Kongre Binası
4-YAKLAŞIK MALİYET	11.852.945,54 TL	11.603.537,43 TL
5-İHALE BEDELİ	7.974.500,00 TL	8.299.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	09.08.2010	08.03.2011
7- MUKAVELE TARİHİ	20.04.2011	03.05.2011
8-YER TESLİM TARİHİ	21.04.2011	09.05.2011
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 18.04.2011	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 27.04.2011
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	21.04.2011	09.05.2011
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	31.03.2013	09.11.2012
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06	%0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	---	---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	%9,64 (768.685,62)	---
15- TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	8.743.185,62TL	---
16- TOPLAM KAPALI ALANI	14.375 m2	7.993 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100	% 37
18- İNŞAATIN DURUMU	**Tamamlandı.**	**Fesih edildi.**

1-İLGİLİ DAİRE	**Niğde Üniversitesi**	**Niğde Üniversitesi**
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı b) Müteahhit Uma Hafriyat Nakliyat	a) Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı b) Güner Mandacı İnşaat Mühendislik
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı	Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	9.700.000,00 TL	4.433.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	6.839.000,00 TL	3.210.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	04.06.2012	23.07.2012
7- MUKAVELE TARİHİ	13.08.2012	28.09.2012
8-YER TESLİM TARİHİ	14.08.2012	03.10.2012
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 07/08/2012	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 20/09/2012
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	14.08.2012	03.10.2012
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	06.04.2014	05.04.2014
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06 **(**4.103,4**)**	%0,06 (1.926,00)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	**---**	---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	**---**	---
15-SÖZLEŞME BEDELİ	6.839.000,00TL	3.210.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	9.990 m2	5.150 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 17	% 16
18- İNŞAATIN DURUMU	**Devam ediyor.**	**Devam ediyor.**

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Eğitim Fakültesi 1. Etap İnşaatı, Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı, Mimarlık Fakültesi 1. Etap İnşaatı, Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı devam etmektedir. 2012 yılında 10.000.000.TL. ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 3.600.000. TL. likit ödenek kaydı, 8/2 maddesi uyarınca Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı ödeneğinden 3.400.000.TL kurum içi aktarma yapılarak yılsonu toplam ödeneği 13.600.000.TL olmuştur.

Proje kapsamında yapılan işler aşağıda gösterilmiştir.

Eğitim Fakültesi 1. Etap İnşaatı: Eğitim Bilimleri, A ve B blok, Dekanlık Bloğu, Kafeterya Bloğu ve Çevre Altyapı'dan oluşmakta olup, toplam proje alanı 14.375 m2 dir. Sözleşme bedeli 7.974.500.TL'dir. 2012 yılı ödeneği 4.250.000. 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/2 maddesi uyarınca Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı ödeneğinden 3.400.000.TL kurum içi aktarma yapılarak yılsonu toplam ödeneği 7.650.000.TL olmuştur. Ödeneğin 7.580.805.TL.'si harcanmış olup bina hizmete açılmıştır. Geçici kabul çalışmaları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme % 100 olarak gerçekleşmiştir.

Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı: 2012 yılı ödeneğin 5.750.000,00 TL dir. 2012 yılı Kasım ayında işin bitirilmesi planlanmakta iken, yüklenicinin iş programına uygun çalışmaması sebebiyle ilgili sözleşmenin 25. Maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 47. maddesi, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 20/a maddesi gereğince 25.09.2012 tarihinde iş fesih edilmiştir. 2012 ödeneğinin fesih tarihine kadar 1.182.497,00 TL'si harcanmıştır. Kalan ödeneğin 3.400.000,00 TL'si Eğitim Fakültesi 1. Etap inşaatına aktarılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 37 olarak gerçekleşmiştir.

Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı: Derslik ve Merkezi Birimler Projemiz bünyesine yıl içerisinde alınmıştır. 2012 yılı içerisinde ihalesi yapılmış 14.08.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 2.000.000. TL. likit ödenek kaydı yapılmıştır. İnşaatımız; A, B, C, D, E bloklardan olmak üzere 9.990 m2 kapalı alana sahiptir. 2012 yılı içerisinde temel kazıları, temel imalatları ve betonarme karkas imalatlarına devam edilerek % 17 seviyesine getirilmiştir. Ödeneğin 1.356.836,56 TL'si harcanmış olup, 643.163,44 TL'si harcanamamıştır.

Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı: : Derslik ve Merkezi Birimler Projemiz bünyesine yıl içerisinde alınmıştır. 2012 yılı içerisinde ihalesi yapılmış 03.10.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 1.600.000.TL. likit ödenek kaydı yapılmıştır. İnşaatımız; B1, B2 bloklardan olmak üzere 5.150 m2 kapalı alana sahiptir. 2012 yılı içerisinde temel kazıları, temel imalatları su basman betonarme karkas imalatları tamamlanarak % 16 seviyesine getirilmiştir. Ödeneğin 607.334,00 TL'si harcanmış olup, 992.666,00 TL'si harcanamamıştır.

Proje No: 1994H032350 Proje Adı: Kampüs Alt Yapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	KAMPÜS ALTYAPI 3. KISIM İNŞAATI
NUMARASI	1994H032350
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	19942012
KARAKTERİSTİĞİ	YOL,SU,ELEKTRİK,KANALİZASYONÇEVRE,YAPAY GÖLET, ARITMA

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2010 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAM A GİRİŞ YILI									
2012	40.150	34.119		2.900		3.900		3.899	100

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE	**Niğde Üniversitesi**
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit ER-YA İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş.-Haluk Erdem İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Niğde Kampus Altyapı 3. Kısım İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	10.647.049,31- TL
5-İHALE BEDELİ	5.974.000,00-TL
6-İHALE TARİHİ	24.03.2011
7-MUKAVELE TARİHİ	18.05.2011
8-YER TESLİM TARİHİ	20.05.2011
9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	20.05.2011
10-İŞİN BİTİM TARİHİ	17.09.2013
11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	--
13-SÖZLEŞME ARTIŞI	%9,875 (589.935,07)
14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	6.563.935,07-TL
15-TOPLAM KAMPÜS ALANI	2.335.655 m2
16-FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
17-İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı.

2012 yılı ödeneği 2.900.000. TL olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7/3 maddesi uyarınca Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 1.000.0000. TL ödenek eklemesi ile yılsonu toplam ödenek 3.900.000.TL olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde çevre yollarının tamamının altyapısı tamamlanmıştır. 100.000 m2 asfaltlama, yol kenarında kaldırımlar, bölünmüş yollardaki refüjlerde çimlendirme, çevre refüj yol aydınlatmaları, yağmur suyu ve drenaj hatları, yapay gölet, peyzaj ve çevre düzenlenmesi, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi, küçük ölçekli doğal arıtma, 1 adet 630 KVA'lık trafo, galeri içerisindeki elektrik tesisat imalatları proje kapsamında tamamlanmıştır. Ayrıca 4.450 metre mevcut kaldırımlar da görme engelliler için hissedilebilir yüzey imalatı ve engelli rampaları yapılmıştır.

2012 yılında ayrılan ödeneğin tamamı harcanarak hizmete alınmıştır.

Proje No: 2001H050040 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	SPOR
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	MERKEZ, BOR VE BESYO AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI
NUMARASI	2001H050040
YERİ	NİĞDE Merkez, Bor ve BESYO Yerleşkesi
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	20012014
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT (Açık Spor Tesisleri)

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2010 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2011	17.925	15.570		1.050		2.475		2.473	100

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Haluk ERDEM
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Niğde/ Merkez Bor ve BESYO Yerleşkeleri Açık-Spor Tesisleri Yapımı
4-YAKLAŞIK MALİYET	4.750.575,82-TL
5-İHALE BEDELİ	3.854.000,00 -TL
6-İHALE TARİHİ	11.08.2011
7-MUKAVELE TARİHİ	15.09.2011
8-YER TESLİM TARİHİ	16.09.2011
9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	16.09.2011
10-İŞİN BİTİM TARİHİ	16.08.2013
11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	---
13-SÖZLEŞME ARTIŞI	%9,82 (378.465,40)
14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	4.232.465,40TL
15-TOPLAM KAPALI ALANI	
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 72
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor

2012 yılı ödeneği 1.050.000.TL olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca 1.425.000. TL. likit ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 2.425.000.TL olmuştur.

2012 yılında ihale kapsamında;

- Merkez Yerleşkesine; (32x50) m2 iki adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesis ile mevcut saha ve stadın modernizasyonu,
- Bor yerleşkesine; (32x50) m2 bir adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi,
- BESYO yerleşkesine (32x50) m2 bir adet sentetik futbol sahası yapılmıştır.(120x185) m2 bir adet atletizm pisti ve sentetik futbol sahasının altyapısı tamamlanmış sentetik çim serilmesi aşamasına getirilmiştir.

2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. ile Üniversitemiz tarafından 22.04.2011 tarihinde imzalanan Bağış Protokolü Kapsamında "Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası "ile "Yurt Binası "yapılmaktadır. Yüklenici ile Bağışlayanın 07.06.2012 tarihli yaptığı sözleşmeye göre tahmini tutarı 36.396.760,00 TL+KDV'dir. Bu tutar yapım işi bedeli olup, donanım bedeli dahil değildir.

Proje Adı	Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi
Proje Yeri	Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşke
Proje Kapasitesi	23.500 m2
Proje Amacı	Eğitim
Proje Maliyeti	
Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları	

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi inşaatı devam etmektedir. İnşaat 5 bloktan oluşmakta olup, toplam kapalı alan 23.500 m2 civarındadır. A, B, C, D Bloklar bodrum zemin+3 normal kat D, E Bloklar bodrum+zemin+ 2 normal kattan oluşmaktadır. İnşaatın kabası tamamlanmış olup, iç mekânlardaki kaba sıva işleri, çelik çatı ve cephe kaplama işleri, mekanik ve elektrik tesisat altyapı imalatları çalışmaları devam etmektedir. 2012 yılı sonu itibari ile inşaat seviyesi % 35'dir.

Proje Adı	Niğde Üniversitesi Yurt Binası
Proje Yeri	Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşke
Proje Kapasitesi	6.500 m2, 100 Kız, 100 Erkek Öğrenci Kapasiteli
Proje Amacı	Eğitim, Barınma
Proje Maliyeti	
Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları	

Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisleri inşaatı devam etmekte olup, kapalı inşaat alanı 6.500 m2 dir. 3 Bloktan oluşmakta olup, orta blok sosyal tesis, diğer 2 blok, kız ve erkek öğrenci yurdu olarak tasarlanmıştır. Sosyal Tesis Bloğu 3 Katlı(bodrum+zemin+1. Kat), Kız ve Erkek Yatakhane Blokları 5 Katlı (Bodrum zemin+3 normal kat)'dır.

İnşaatın kabası tamamlanmış olup, iç mekanlardaki kaba sıva işleri, çelik çatı ve cephe kaplama işleri, mekanik ve elektrik tesisat altyapı imalatları çalışmaları devam etmektedir. 2012 yılı sonu itibari ile inşaat % 40 seviyesindedir.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1 Proje Tamamlama Raporu

3 SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamalar dikkate alınarak taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,
- Kurumlardan kaynaklanan hataların minimize edilebilmesi için hizmet içi eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi,
- Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması,
- İnşaatların programlanan sürelerde bitirilebilmesi için Orta Vadeli Mali Planda daha esnek davranılması,
- Yapılan büyük onarım çalışmalarında "Anahtar Teslimi Götürü Bedel" sözleşmelerle yaşanan sıkıntıları azaltabilmek için büyük onarım ihalelerinde "Teklif Birim Fiyat Sözleşmesinin" hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması,
- Yayın alımları kapsamında ihale yöntemiyle satın alımlarında her kitabın ayrı ayrı özelliği olması sebebiyle EKAP'a tek tek giriş yapılması yerine yeni bir yöntem getirilmesi,
- Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması gereklidir.

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülâtif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	6								17.050						21.756
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri	1								2.061						2.061
İktisadi															
Sosyal															
TOPLAM	**7**								**19.111**						**23.817**

2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM=4

Kuruluş Adı : NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

Bim No (1)	YSK. (2)	PROJE NO (3)	PROJENİN ADI (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2011 Kümülatif (10)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Toplam (18)
35981	464	1994H032350	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2014	Niğde	0	40.150	34.119		2.900	+1000	3.899
35980	464	1994H032370	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Niğde	0	63.870	46.983		13.600		10.728
35978	464	2011HO34450	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2012	Niğde	0	100			383		364
			Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2012	Niğde		3.103			4.215	+1508	4.258
			Muhtelif İşler	ÖZEL GELİR	2012	Niğde	0	-	-		500		500
35982	464	2012HO32620	Muhtelif İşler	Taşıt Hibesi	2012	Niğde	0	-			103		111
35238	464	2001H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2013	Niğde		17.925	15.570	0	1.050	+1425	2.474
							TOPLAM	**125.148**	**96.672**	**0**	**22.148**	**3.933**	**21.723**

NOT: Fen-Edebiyat Fakültesi'nin kesin hesap farkından dolayı müteahhide 35.299,94 TL. ödeme yapılmış olup bu tabloda gösterilmemiştir.

Sektör Adı : DKH													
Bim	YSK.	PROJE NO (3)	PROJENİN ADI (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2010 Kümülatif (10)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Toplam (18)
No (1)	(2)												
37807	464	2010K121260	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2012	Niğde	0	8.541	6.480 TL	0	2.061		2.061
							TOPLAM	**8.541**	6.480 TL	0	**2.061**		**2.061**
