NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

NİĞDE, Mart 2018

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME
HAZİNE	32.000.000	34.2000.000	19.158.260
ÖZGELİR	0,00	0,00	0,00
NET FİNANSMAN		15.100.000	10.764.537
TOPLAM	**32.000.000**	**49.300.000**	**29.922.797**

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2017 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- İİBF Derslik ve A Blok Amfi Binası İnşaatının % 10 seviyesine getirilmesi,
- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında merkez yerleşke içerisinde Kapalı Spor Salonu inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi,
- Türk Musikisi ve Konservatuvar binası inşaatı ihalesi yapılarak %5 seviyesine getirilmesi,
- Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ihalesinin yapılarak % 5 seviyesine getirilmesi,
- Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.kısım inşaatı fiziki gerçekleşmesinin % 100 seviyesine getirilmesi,

- Merkez Yerleşke Alt Yapı Tesislerinin 5.kısım inşaatı ihalesinin yapılması,
- Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesinin yapılması,
- Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,
- Birimlerin ihtiyacı olan yazılımların alınması,
- Kütüphane Daire Başkanlığınca basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması,

Gerçekleşen;

- Merkezi Araştırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıştır.
- Türk Musikisi ve Konservatuvar binası inşaatı ihalesi yapılarak % 14 seviyesine getirilmiştir.
- İİBF Derslik ve A Blok Amfi Binası İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 7 seviyesine getirilmiştir.
- Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ihalesinin yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 8 seviyesine getirilmiştir.
- Merkez Yerleşke Alt Yapı Tesislerinin 4.kısım inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- Merkez Yerleşke Alt Yapı Tesislerinin 5.kısım inşaatı ihalesi yüksek fiyattan dolayı iki kere iptal edilmiştir.
- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında merkez yerleşke içerisinde Kapalı Spor Salonu inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiştir.
- Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerin tadilat ve onarım işleri tamamlanmıştır.
- Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır.
- Birimlerin ihtiyacı olan yazılımları alınmıştır.
- Basılı ve elektronik yayınlar satın alındı. Elektronik yayın veri tabanlarına abone olunarak Üniversitemizin bilgiye erişim kapasitesi arttırıldı.

1.4 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2017 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 32.000.000.TL iken, 6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 15.100.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 2.200.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu sermaye ödeneği toplamı 49.300.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 29.922.797. TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	5.970.000	14.470.000	11.953.100	83%
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	230.000	230.000	212.477	92%
6.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	50.000	50.000	0	0%
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	23.750.000	32.050.000	15.772.773	49%
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.000	2.500.000	1.984.447	79%
	GENEL TOPLAM	32.000.000	49.300.000	29.922.797	61%

* HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) *

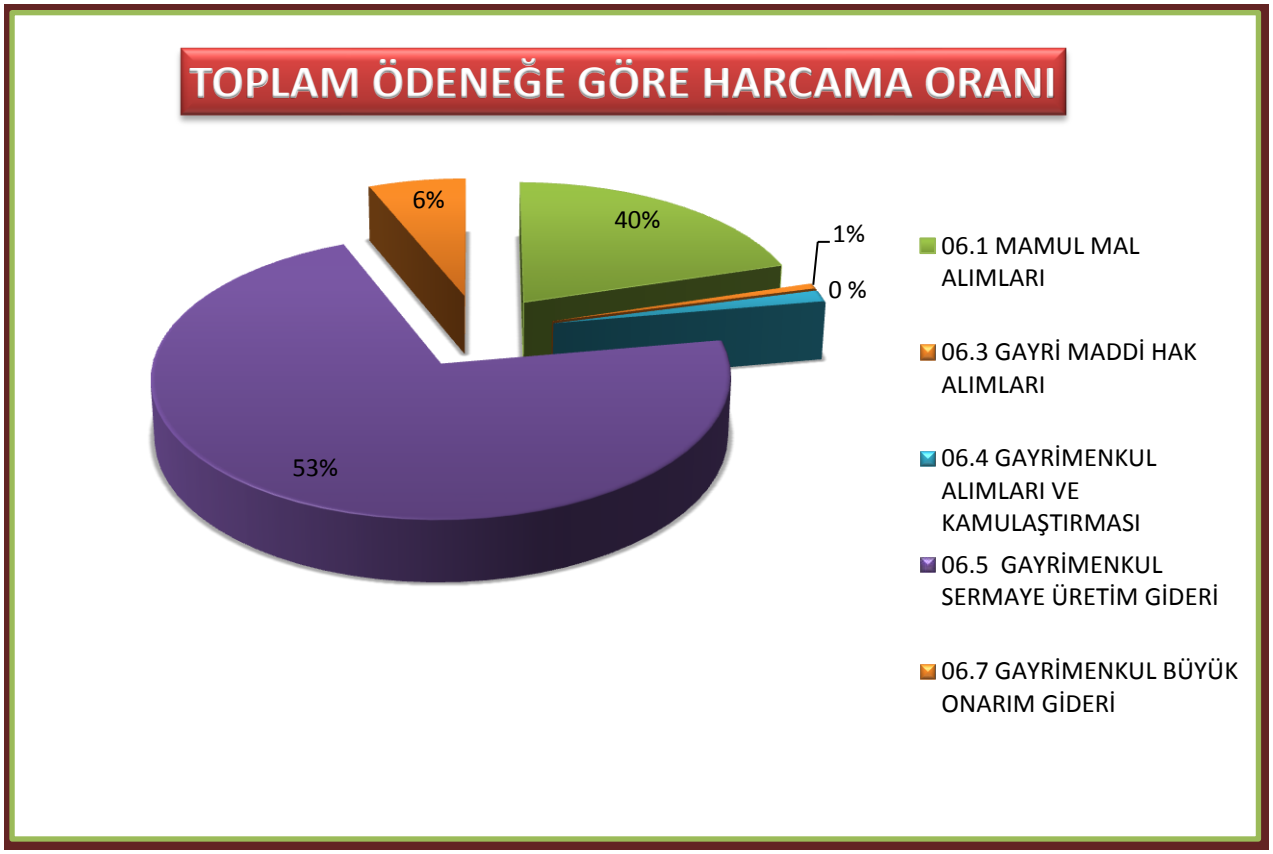

2- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2014H030270 Proje Adı: Muhtelif İşler

2017 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 5.500.000.TL'dir. 6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/6 maddesi uyarınca 8.500.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği 14.500.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 11.450.131.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Makine-Teçhizat Alımları

2017 yılında makine-teçhizat alımları için 3.270.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 8.500.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 11.770.000.TL olmuştur. Ödeneğin 9.253.207.TL'si harcanmış, 2.516.793.TL ödenek harcanamamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI (KDV Dahil)
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Projeksiyon Cihazı	20 adet	114.436,40
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	26.432,00
	Kablosuz Ağ Erişim Sistemi Cihazı	30 adet	115.050,00
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	23.010,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	22.365,42
	Dizüstü Bilgisayar	1 adet	9.599,30
	Kiosk Kitap Tarayıcı	1 adet	39.712,35
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	41.758,20
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	11.312,66
	Klima Alımı	1 adet	7.250,00
	Büro Mefruşatı Alımı	20 adet	6.605,28
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	9.499,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	20.556,28
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	12.005,89
	Bilgisayar	36 adet	112.658,62
	Büro Mefruşatı Alımı	1 adet	260,17
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	11.912,13
Tıp Fakültesi			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	100.300,00

	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	38.940,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	129.551,20
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	311.166,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	4.334,14
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	4 adet	12.980,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	112.455,64
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	247.266,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	140.184,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	13.064,22
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	296.084,16
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	141.622,60
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	67.411,04
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	7.316,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	104.371,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	27.996,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	679.644,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	2 adet	17.172,00
	Laboratuvar Tezgahı	Muhtelif	170.864,00
	Laboratuvar Cihazları ve Tezgahları	Muhtelif	48.171,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	82.620,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	20.319,60
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	174.516,56
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	1.077.841,50
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	81.774,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	8.259,99
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	6 adet	14.256,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	7.862,40
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	10.573,00
	Diğer Mefruşat Alım	Muhtelif	7.091,80
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	1.800,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	3 adet	20.736,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	9.930,88
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	17.405,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	33.889,60
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	5.541,28
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	49.899,58
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	17.399,20
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	92.685,40
Mühendislik Fakültesi			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	125.253,46
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	819.397,90
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	22.597,00

	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	273.760,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	46.256,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	15.139,40
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	70 adet	15.820,38
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	11.818,88
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	9.021,10
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	21.145,55
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	118.380,90
Fen-Edebiyat Fakültesi			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	251.640,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	30.090,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	43.022,80
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	171.430,78
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	31.594,50
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	41.984,40
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	384.680,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	48.380,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	165.058,40
	Baskı Makinesi Alımı	1 adet	10.499,99
	Fotokopi Makinesi Alımı	1 adet	14.999,99
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	3.304,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	4.873,40
	Bilgisayar	4 adet	12.517,64
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	3 adet	69.660,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	29.640,42
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	79.929,80
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	62.225,62
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	14.499,25
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	4.189,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	3.245,00
	Bilgisayar	10 adet	31.294,10
Merkezi Araştırma Laboratuvarı			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	796.500,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1 adet	75.520,00
İletişim Fakültesi			
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	9.404,60
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	22.844,80
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	5.174,30
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	2.560,60
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	2.145,23

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	3.894,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	5.015,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	49.746,31
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu			
	Fotokopi Makinası Alımı	1 adet	1.357,00
Mimarlık Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	11.027,10
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	13.065,58
Eğitim Fakültesi			
	Okul Mefruşatı Alımları	48 adet	20.736,00
	Makine-Teçhizat Alımı	Muhtelif	13.592,42
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	10.620,00
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	23.626,94
Güzel Sanatlar Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	8.295,51
Yabancı Diller Yüksekokulu			
	Makine-Teçhizat Alımı	1 adet	3.009,00
Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu			
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	21.004,46
GENEL TOPLAM			**9.076.207,00**

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM	ALINAN ARAÇLAR	MİKTARI	TUTARI
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	T02 Binek Araç	2 adet	177.000,00

Yazılım Alımları

2017 yılında yazılım alımları için 230.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 212.477.TL'si harcanmış, 17.523.TL ödenek harcanamamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV Dahil)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Logsign Focus Lisansı Alımı.	5.168,40
	KEYPS-N Kurumsal Eğitim Yönetim ve Planlama Sistemi Yazılımı Alımı.	45.000,00
	Güvenlik Duvarı Lisansı Alımı. (1 yıllık)	22.290,20
	Microsoft Yazılım Lisansı Alımı. (600 Kullanıcılı)	134.874,00
	500 Kredilik Yazılım Lisansı Alımı.	2.596,00
	dbForge Studio for SQL Server (Enterprise Edition)Yazılımı Alımı. (3 yıllık)	2.548,80
GENEL TOPLAM		**212.477,40**

Kamulaştırma

6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 50.000. TL ödenek tahsis edilmiş olup herhangi bir kamulaştırma yapılmadığından ödenek harcanamamıştır.

Büyük Onarım

2017 yılında büyük onarımlar için 2.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 500.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 2.500.000.TL olmuştur. Ödeneğin 1.984.447.TL'si harcanmış, 515.553.TL ödenek harcanamamıştır.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir;

TARİHİ BİNA RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ: 2016 yılı içerisinde 17-18-21 nolu parsellerde restorasyon işleri ihalesi yapılmış olup, 2017 yılı içerisinde restorasyon çalışmaları devam etmiştir.Toplam harcama 1.154.004,06 TL olup, fiziki gerçekleşmesi % 86 dır.

SOSYAL BİLİMLER MYO MERDİVEN TİPİ ENGELLİ ASANSÖR YAPIM İŞİ: Merdiven Tipi Engelli Asansör yapımı tamamlanarak 118.000,00 TL harcanmış ve Geçici Kabulü yapılmıştır.

.

MERKEZ YERLEŞKE: Rektörlük ve Merkezi Birimler dış cephe mantolama ve çatı onarım işi yapılmış olup, 42.006,77 TL harcanarak, Geçici Kabulü yapılmıştır.

Rektörlük binası

Büyük Onarım Kapsamında Yapılan Diğer İşler

HARCAMANIN ADI	TUTARI
Sabiha Şahenk Kütüphanesi ilave güvenlik kamerası takım işi ödemesi	11.810,62
Fen Edebiyat Fakültesi kombi bakım ve onarım işi ödemesi	5.546,00
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik bakım ve onarım işi ödemesi	12.799,76
Park ve Bahçeler Birimi binası için doğalgaz iç tesisat çekilmesi işi ödemesi	16.815,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok asansörü TSE eksiklikleri kapsamında mavi etiket alımı için asansör bakım ve onarım ödemesi	18.825,72
Zübeyde Hanım SMYO ve Teknik Bilimler MYO Yerleşkesi ilave güvenlik kamerası takım bakım ve onarım işi ödemesi	15.593,70
Fen Edebiyat Fakültesi C Blok Biyoteknoloji Laboratuvarı tadilat işi ödemesi	5.838,64
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik bakım ve onarım işi ödemesi	17.207,35
Sabiha Şahenk Kütüphanesi TSE Eksiklikleri kapsamında asansör bakım ve onarım ödemesi	20.305,44
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin fotoselli kapı arızaları yapım işi	1.315,70
İletişim Fakültesi ön tarafına bayrak ve flama direk yapım işi ödemesi	5.900,00
Kongre ve Kültür Merkezi Binası, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak. Binalarının Çatı Tadilat ve Onarım Yapım İşi Ödemesi.	12.968,20
Zübeyde Hanım Sağlık Yüksek Okulu Asansörü TSE eksiklikleri kapsamında mavi etiket alım işi ödemesi	20.655,90
Tıp Fakültesi Gözlem Laboratuvarı kamera takım işi ödemesi	6.903,00
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin ısıtma sistemleri bakım ve onarım ödemesi	19.340,20
Rektörlük Binası ve Bağlı Birimlerde kullanılan jeneratörlerin bakım ve onarımı	9.652,40
Kongre ve Kültür Merkezi asansör revizyonu ve mavi etiket yapım işi	19.116,00
Sabiha Şahenk Kütüphanesi ve Yabacı Diller Yüksekokulu yangın santralleri bakım ve onarım işi.	7.233,40
UPS bakım onarım işi	18.083,50
Rektörlük Konutu boya badana ve tadilat onarım işi	8.850,00
Mühendislik Fakültesi B Blok Bilgisayar Laboratuvarı elektrik tesisatı yapım işi	21.326,79
Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı Tıp Fakültesi Çözelti Hazırlama, Kimyasal Depo Multidisliner 1 ve Multidisliner 2 Laboratuvarı Elektrik data hatları yapım işi	19.060,54
Güzel Sanatlar Fakültesi Laboratuvarı yapım işi ve Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina derslikleri data hattı çekim işi	22.141,52
Tıp Fakültesi Dekanlığı odalarının laboratuvara dönüştürülmesi yapım işi	22.443,01
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin boya badana yapım işi	22.561,60

Rektörlük ve Bağlı Birimlerin tadilat ve onarım yapım işi	13.808,36
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik motorları bakım ve onarım işi	23.010,00
Sıhhi tesisat bakım onarım işi	13.844,35
Tıp Fakültesi Laboratuvarına doğalgaz tesisatı çekilmesi işi	16.520,00
Mühendislik Fakültesi B Blokta buluna 2 adet asansörün TSE eksiklikleri ve revizyonu yapım işi	9.322,00
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin ısıtma sistemleri bakım ve onarım ödemesi	21.634,12
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin klima sistemleri bakım ve onarım işi	16.845,68
Mühendislik Fakültesi E Blok asansörleri TSE eksiklikleri yapım işi	7.316,00
Rektörlük ve Bağlı Birimler elektrik tesisatı bakım onarım işi	16.004,34
Teknik Bilimler MYO TSE eksikleri kapsamında asansör revizyon ve mavi etiket alım işi	7.670,00
Sosyal Bilimler MYO Bariyer Alım İşi	4.720,00
BESYO Telefon Santrali Değişim İşi	4.967,80
Eğitim Fakültesi dekanlık binası önü alçıpen tavanların sökülerek PVC lambri kaplama yapım işi	8.850,00
Rektörlük Hizmet Binası TSE Eksiklikleri Kapsamında Asansör Revizyon ve Mavi Etiket Alım İşi	16.520,00
Mühendislik Fakültesi E1 Blok asansörü komple pano ve seri haberleşmeli revizyon seti değişim işi	9.440,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası Çatı Tadilat Yapım İşi	2.666,80
Ulukışla TSE Eksikleri Kapsamında Asansör Revizyon ve Mavi Etiket Alım İşi	1.357,00
Rektörlük Binası BAP Birimi odalarının duvar bölme onarım tadilat yapım işi ve Eğitim Fakültesi Kafeterya Bloğu teras çatı tek kat bütümlü izolasyon yapım işi	10.443,00
Merkez Yerleşke ana giriş kapısı bariyer yapım işi ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı turnike yapım işi	10.375,09
Rektörlük ve Bağlı Birimlere ilave güvenlik kamerası takımı ve görüntüleme ekipmanları bakım onarım işi	6.278,78
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin elektrik motorları bakım ve onarım işi	18.282,92
BESYO yerleşkesi kantin ve yemekhane binası yapım işi 8 (kesin) nolu hakediş ödemesi.	68.265,57
TOPLAM	**670.435,80**

Proje No: 2017H035470 Proje Adı: Yayın Alımı

2017 yılında yayın alımları için 1.200.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 1.199.893,21.TL'si harcanmıştır. 2017 yılı içerisinde 40 adet veri tabanının aboneliği yenilenmiştir. Ulakbim tarafından ücretsiz sağlanan veri tabanları ile birlikte 64 adet veri tabanına aboneliğimiz devam etmektedir. Yine 2017 yılı içerisinde kütüphanemize 1074 adet Türkçe ve Yabancı basılı kitap satın alınmış, bağış olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar tarafından gönderilen 813 kitap ile birlikte toplam 1887 adet yayının veri girişi yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 2017 yılı içerisinde 316.504 e-kitaba, 32.269 e-dergiye ve 2.100.000 e-teze erişimimiz bulunmaktadır.

HARCAMANIN ADI	TUTAR (TL)
MathSciNet	10.908,53
Annual Reviews	30.119,58
Masters of Architecture	1.975,58
BioOne	8.870,79
APS	15.702,12
AIP	21.710,81
Ebsco E-Books AC.	23.846,81
Turnitin	31.059,39
EDS	18.665,50
ASTM	38.715,98
Cambridge Journals	19.802,69
ACS Journals	39.846,57
RSC Journals	17.741,21
Oxford Journals	13.015,42
IOP	25.997,12
Brill	21.503,24
Pnas	4.306,92
CEJD	11.538,96
AlmanHal	28.712,80
SAGE Journals	37.371,53
Wiley Journals	90.787,10
Proquest Veri Tabanları	141.141,00
Jstor	23.003,27
ASME Journals	28.417,71
ASCE Journals	30.716,30
World E-Book Library	21.593,69
İdeal Online	13.548,00
ECS Digital Library	7.194,50
IEEE-Wiley E-Books	13.644,00

HiperKitap / Education Source	66.704,89
Ebsco GOBI E-Books	12.085,56
CABI E-Books	51.365,00
Springer E-Books	95.973,66
Ebsco GOBI E-Books	7.465,41
Springer Medicine E-Books	42.282,64
Mynet Vidobu	9.614,64
HukukLink	1.594,00
SOBİAD	8.585,00
Türkçe Tıp Kitapları	66.960,00
Türkçe Basılı Kitap Alımı	21.029,18
Yabancı Basılı Kitap Alımı	21.009,21
Yabancı Basılı Kitap Alımı	3.766,90
GENEL TOPLAM	***1.199.893,21***

Proje No:2010 K121260 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2017 yılı bütçe ödeneği 1.500.000.TL olup ödeneğin tamamı "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller" gereğince özel hesaba aktarılmıştır. Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

HARCAMANIN ADI	TUTARI
Namics Gümüş Pasta ürünleri	25.879,96
CD-2BE İstasyonlu Havya,SMF12P Flux Kalemi, C245-905 Uç, Elektronik Keski 2,05mm	1.679,35
Temiz Oda Gaz Hattı Çekim İşi (Malzeme+montaj)	33.040,00
NGP30 DKB000378 C Bakımı, NGP9 DKB 000673 C Bakımı,GA18 AP1467776 3000 Saat Bakım Hizmeti	40.651,00
Lazer kesim maske ve CNC işleme taşıyıcı seti komple çizime göre	2.065,000
Vakumlu Etüv	15.340,00
42 Parça Lazer kesim ve CNC İşleme Çizimlere göre	4.248,00
Freeon Filtre	885,00
Temiz Oda Malzemeleri	13.988,00
Fiziksel Buhar Kaplama PVD Sisteminin ITO Hedef Kapağının ve Mekanik Sisteminin Değiştirilmesi	48.279,70
Filter Kit DD50+ PD 50+QD50+DD10+ Kit	3.886,39
Laboratuvar Malzemesi	6.623,36
Yüksek Verimlilikte Güneş Hücresi Fotomaske Seti Tasarımı	52.628,00
Plasma Temizleyici	47.200,00
TOPLAM	**296.393,76**

Proje No: 2017H035460 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
NUMARASI	2017H035460
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2018-2018
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt–Proje ve Müşavirlik

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2014 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2017	250			250		250		237	95

2017 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 250.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 236.637.TL'si harcanmıştır.

Çeşitli Üniteler Etüt Proje kapsamında;

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Proje Revizyonu 59.000.TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Blokları ve Amfi Bloğu Binası Projesi için 143.712.TL, diğer projeler için 33.925.TL harcama yapılmıştır.

Proje No: 1994H032370 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI
NUMARASI	1994H032370
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2019
KARAKTERİSTİĞİ	Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası 6.500 m2+ İİBF Binası 9.000 m2 + Morfoloji Binası 17.500 m2

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2014 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI	Revize								
1994	220.550	166.971		15.000				4.326	29

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı, İİBF Amfi Bloğu İnşaatı ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası inşaatı devam etmektedir. 2017 yılında 15.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 4.326.090.TL.si harcanmış olup, 10.673.909.TL ödenek harcanamamıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Canber Müh.İnş.Tic.A.Ş.	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Seler Taah. Yapı İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Türk Musikisi ve Konservatuvar Binası İnşaatı	İİBF Amfi Bloğu İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	11.276.169,71 TL	11.869.362,40 TL
5-İHALE BEDELİ	8.833.000,00TL	11.452.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	06.04.2017	04.10.2017
7- MUKAVELE TARİHİ	15.05.2017	10.11.2017
8-YER TESLİM TARİHİ	17.05.2017	14.11.2017
9-ÖN MALİ KONTROL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	17.05.2017	14.11.2017
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	13.09.2019	14.10.2019
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06	% 0,06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	---	-
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	---	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	8.833.000,00TL	11.452.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	6.500 m2	9.000 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 14	%7
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.	Devam ediyor.

TÜRK MUSİKİSİ VE KONSERVATUVAR BİNASI İNŞAATI

2017 yılı ödeneği 1.500.000.TL olup, ödeneğin 1.498.003.TL'si harcanmıştır. 2017 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 15.05.2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 17.05.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 14 olarak gerçekleşmiştir.

Konservatuvar binası inşaatı

İİBF DERSLİK VE A BLOK AMFİ BİNASI İNŞAATI

2017 yılı ödeneği 2.500.000.TL olup, ödeneğin 1.012.40.TL'si harcanmıştır.2017 yılında ihalesi yapılarak 10.11.2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 14.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 7 olarak gerçekleşmiştir.

İİBF ek derslik inşaatı

TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI İNŞAATI

2017 yılı ödeneği 11.000.000.TL olup, ödeneğin 1.815.682.TL'si harcanmıştır. 2017 yılında ihalesi yapılarak 25.09.2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 27.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 8 olarak gerçekleşmiştir.

1-İLGİLİ DAİRE	**Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi**
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı b) Arıkan İnş. & Ak-Koç İnş. İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Tıp Fakültesi Morfoloji Derslik Binası 1. Etap İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	27.029.496,37 TL
5-İHALE BEDELİ	21.365.000,00TL
6- İHALE TARİHİ	28.07.2017
7- MUKAVELE TARİHİ	25.09.2017
8-YER TESLİM TARİHİ	27.09.2017
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	27.09.2017
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	05.11.2019
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	---
15-SÖZLEŞME BEDELİ	21.365.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	17.500 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 8
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.

Tıp Fakültesi inşaatı

Proje No: 1994H032350 Proje Adı: Kampüs Altyapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	KAMPÜS ALTYAPI 4. KISIM İNŞAATI
NUMARASI	1994H032350
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2019
KARAKTERİSTİĞİ	Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2015 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAM A GİRİŞ YILI									
1994	79.000	68.149		4.000				652,00	16

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

İLGİLİ DAİRE	**Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi**
SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	b) Müteahhit Mahmut ORMAN-İnş.Müh.
SÖZLEŞMENİN KONUSU	Niğde Kampüs Altyapı 4. Kısım İnşaatı
YAKLAŞIK MALİYET	1.335.901,48 TL
İHALE BEDELİ	1.319.000,00 TL
İHALE TARİHİ	10.06.2016
MUKAVELE TARİHİ	20.07.2016
ÖN MALİ KONTROL	25.07.2016
YER TESLİM TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	25.07.2016
İŞİN BİTİM TARİHİ	21.12.2016
GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	1.319.000,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
İNŞAATIN DURUMU	Tamamlanmıştır.

KAMPÜS ALTYAPI TESİSİSLERİ 4. KISIM İŞLERİ

(Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon vb.)

2017 yılı ödeneği 4.000.000.TL olup, 652.054.TL'si harcanmıştır.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kullanımı için ayrılan Bor yerleşkesi ve Pınarbaşında yer alan Tarım Uygulama Sahaları altyapı işi tamamlanarak geçici kabulü yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi %100'dür.

Ayrıca Beşinci kısım Altyapı İhalesi iki defa yüksek tekliften dolayı iptal edilmiştir.

Proje No: 2014H050190 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	SPOR
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (KOP)
NUMARASI	2014H050190
YERİ	NİĞDE Merkez
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2014-2018
KARAKTERİSTİĞİ	Spor Kompleksi (10.589 m2)

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2015 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2014	18.000	8.000		4.500		12.800		10.558	100

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE	**Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi**
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	b) Müteahhit AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.& Şenel DOĞAN İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi.
4-YAKLAŞIK MALİYET	14.750.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	13.325.000,00 TL
6-İHALE TARİHİ	12.08.2016
7-SÖZLEŞME TARİHİ	08.09.2016
8-YER TESLİM TARİHİ	14.09.2016
9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	14.09.2016
10-İŞİN BİTİM TARİHİ	12.09.2017
11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	--
13-SÖZLEŞME ARTIŞI	--
14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	13.325.000,00 TL
15-TOPLAM ALANI	10.589 m2
16-FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
17-İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı

2017 yılı ödeneği 4.500.000.TL olup, 6767 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 6.100.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 2.200.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden eklenmesiyle yılsonu ödenek toplamı 12.800.000.TL olup ödeneğin 10.557.990.TL'si harcanmıştır.

Merkez Yerleşkemiz içerisine 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi yapım işinde çalışmalar tamamlanmış olup fiziki gerçekleşmesi % 100 olarak gerçekleşmiştir.

Spor Salonu

2.1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1 Proje Tamamlama Raporu

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK

- Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,
- Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- Üniversitelerin eğitim-öğretim fiziki alanları kompleks bir yapıdadır. Büyük onarım çalışmalarında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde uygulamada sıkıntılar yaşanmakta olup, büyük onarım ihalelerinde "Teklif Birim Fiyat Sözleşmesinin" hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzatmakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.
- Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,

SEKTÖR ADI EĞİTİM

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2016 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	+ / - (14)	Harcama Toplam
1994H032350	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Niğde	79.000	68.149	4.000		652
1994H032370	Derslik ve Merkezi Birimler(KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Niğde	200.500	166.971	15.000		4.326
2014H030270	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Niğde	43.000	38.876	5.500	+9.000	11.450
2014H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Niğde	18.000	8.000	4.500	+8.300	10.558
2017H035460	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Niğde	250	0	250		237
2017H035470	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Niğde	1.200	0	1.200		1.200
TOPLAM					**269.500**	**219.020**	**30.450**	**17.300**	**28.423**

tabloda 50.TL' lik kamulaştırma ödeneği yoktur.

SEKTÖR ADI DKH

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2016 Kümülatif Harcama	Ödenek Toplam	+ / - (14)	Harcama Toplam
2010K121260	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2019	Niğde	17.920	15.920	1.500		1.500
TOPLAM					**17.920**	**15.920**	**1.500**		**1.500**
